

書名

天
壇
補
程

工程
做法
細冊

冊一百九十四

不分卷 清鈔本

卷 冊一百九十四

內容分類 史-政書-考工-營造

索書號 貴重-65

編號 B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

程
做
法
冊



重 貴
甲 65(18)

所究研京東院學化女方東 第
No. 4875 册





附彭字行文貳號

普度寺內粘修慈濟殿等工續估做法



慈濟殿一座七間前抱厦三間原估挑換露明槽朽

簷柱六根其餘大木有無糟朽拆卸後據實呈明

現查

大木拆卸內正座並抱厦估外多換簷柱六根墩接簷

柱十六根挑換八角簷枋墊桁各四根在替四塊內

裡天花帽兒梁十一根正座東西次間前廊抱頭梁

二根後金桁五根抱厦西山後步啞叭梁二根天

溝枋墊桁各三根滿換順望板上押縫引條大木

添錠鐵拉扯拆砌西山扇面墻五堵照舊抹飾

地面磚塊改換澄漿尺七方磚



天工殿一座三間原估揭瓦

今改

拆蓋比估多換簷柱二根金柱四根山柱二根桁條

十七根石料拆安柱頂埋頭土觀挑換土觀新石二

成其餘舊石截頭刷面占谷見新拆砌礫墩攔土

台幫埋頭磚塊添新三成頭停底瓦比估多換二

成計一千一百六十三件地脚削築大夯錮灰土三步

兩山原估拆砌有碍搗子墻二段湊長一丈二寸今

改下肩二面細停城磚照舊調脊寬瓦抹飾



天王殿兩邊門樓二座各台基面潤九尺四寸進深五尺二寸
至掛落下皮高七尺三寸厚一尺八寸安過木枋框門扇成

造原估粘修

今改

拆修滿換土櫨排椽板挑換枋框三成門扇五成滿換

過木石料拆換押面拆去前馬尾躡躑一座後獨踏

一塊前簷改安連面四級踏蹠一座台幫落矮四寸拆

砌門腿下肩長高四寸頭傳苦灰泥背各一層調大

脊垂脊安吻獸獅馬窠十號布筒板瓦內糙磚

筒瓦添新三成細磚勾滴板瓦五成拆換散水磚
塊地脚剝築灰土二步

門樓兩邊院牆二段各長四丈三尺五寸至板簷高五尺九寸

厚二尺原估粘修

今改


門腿兩邊拆砌二段各長五尺下泊岸落矮四寸墻身


長高四寸拆安柳面刷面占谷見新墻身拆砌下有

二面改換細城磚上身照舊抹飾頭修苦抹青灰背

一層調皮條脊安十號布筒板瓦磚塊筒瓦添新三

成勾滴板瓦五成

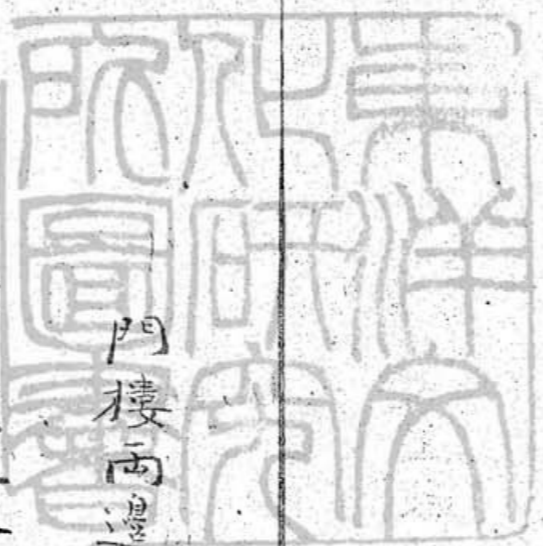

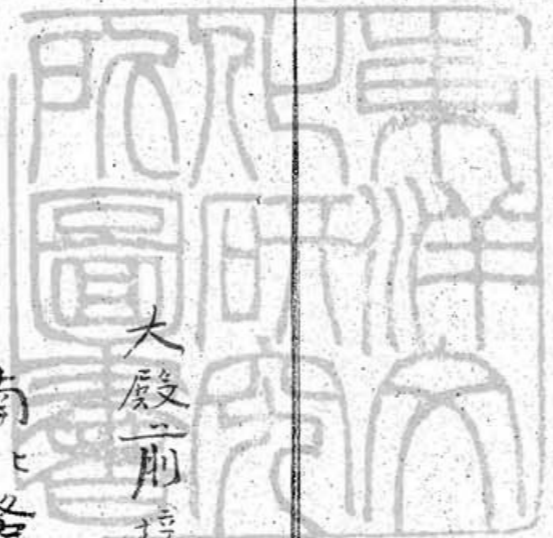

大殿前接原估拆漫海漫兩邊至大殿台帶齊海漫二塊
南北各長十九丈六尺寬三丈七尺

今擬

拆漫磚塊換新七成地腳剝棄大夯碼灰土二步



慈濟殿內成搭遮護罩棚四座內

罩經櫃棚一座面闊二丈四尺進深一丈八尺前高八尺後

高一丈四尺

罩五供棚一座面闊一丈八尺進深八尺中高八尺

罩百枝檯架罩棚二座各面闊一丈八尺進深一丈四尺中

高一丈四尺俱扎架木竹骨頂子維席三層牆身維

席二層



內務府郎 中兼佐領瑞 假

工部郎 中兆 瑞

內務府員外郎富 瑞

內務府員外郎存 瑞

工部員外郎毓差

內務府主 事存 瑞

總理工委署主 事廣 瑞



天
圖
書
藏
印

