冷凍資料

第四輯

農林省水産局

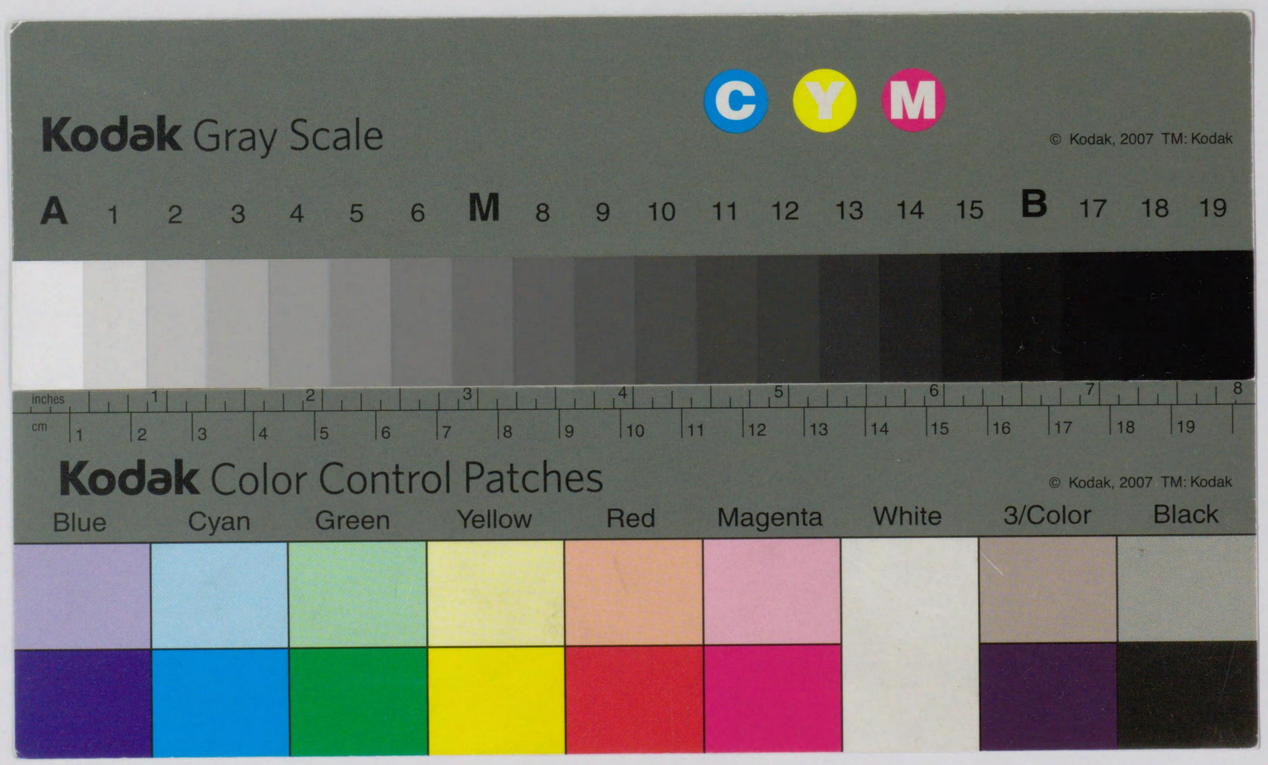

562
72

56
72

昭和五年三月刊行

冷凍資料

第四輯

奬勵冷藏庫要綱

發行所寄贈本

農林省水産局

562
72

562-72

凡　例

◇本書は大正十二年水産冷藏奬勵開始以來現在に至る迄の既設冷藏庫の要綱を蒐集したるものなり。

◇要綱の配列は奬勵年度別に據りたり。

◇增設、改築等に依り年度に重複するものは後年度に揭載せり

◇冷藏庫の所有者變更したるものは現在の所有者に依る。

◇冷室面積及容積は特記せざるものの外は夫々平方尺、立方尺を以て表す。

◇收容量凍結量噸數は英噸　冷却力噸は 288,000 英熱量

◇主要防熱材料の記號　　C.B.—コルク板　C.D.—コルク粒　S.D.—鋸屑

本館所蔵

目　次

奬勵冷藏庫要綱

大正十二年度奬勵冷藏庫

1. 東京府小笠原島所在冷藏庫
2. 長崎市旭町所在冷藏庫
3. 山口縣彦島町江ノ浦所在冷藏庫
4. 東京市品川町所在冷藏庫
5. 富山縣新湊町所在冷藏庫
6. 千葉縣銚子町所在冷藏庫
7. 東京市駒込林町所在冷藏庫
8. 岩手縣鍬ヶ崎町所在冷藏庫
9. 沼津市船倉所在冷藏庫
10. 大阪市港區鶴濱通所在冷藏庫
11. 清水市入江受新田所在冷藏庫
12. 神戸市磯上通所在冷藏庫
13. 靜岡縣燒津町所在冷藏庫
14. 高松市下横町所在冷藏庫
15. 靜岡縣中泉町所在冷藏庫
16. 山口縣彦島町彦島所在冷藏庫

大正十三年度奬勵冷藏庫

17. 北海道高島町所在冷藏庫
18. 金澤市白菊町所在冷藏庫
19. 小樽市廐町所在冷藏庫
20. 德島市堀裏町所在冷藏庫
21. 神奈川縣小田原町所在冷藏庫
22. 和歌山市元町所在冷藏庫
23. 名古屋市熱田所在冷藏庫
24. 三重縣桑名町所在冷藏庫
25. 大阪市臼屋町所在冷藏庫

26. 大阪市木津敷津町所在冷藏庫
27. 東京市築地所在冷藏庫
28. 石川縣輪島町所在冷藏庫
29. 東京市南飲田町所在冷藏庫
30. 函館市仲濱通所在冷藏庫
31. 横須賀市旭町所在冷藏庫
32. 高知縣須崎町所在冷藏庫
33. 豐橋市花田所在冷藏庫
34. 京都府伏見町所在冷藏庫
35. 島根縣濱田町所在冷藏庫
36. 宮城縣鹽釜町所在冷藏庫
37. 靜岡市東町所在冷藏庫

大正十四年度奬勵冷藏庫

38. 東京市明石町所在冷藏庫
39. 靜岡縣綱代町所在冷藏庫
40. 三重縣尾鷲町所在冷藏庫
41. 三重縣鳥羽町所在冷藏庫
42. 金澤市田丸町所在冷藏庫
43. 青森縣小中野町所在冷藏庫
44. 和歌山縣田邊町所在冷藏庫
45. 和歌山縣太地町所在冷藏庫
46. 岡山市上石井所在冷藏庫
47. 兵庫縣洲本町所在冷藏庫
48. 桐生市末廣町所在冷藏庫
49. 青森縣湊町所在冷藏庫
50. 京都市中央卸賣市場所在冷藏庫
51. 神奈川縣三崎町所在冷藏庫
52. 北海道色古丹島所在冷藏庫
53. 熊本縣高瀨町所在冷藏庫
54. 明石市東仲之町所在冷藏庫

大正十五年度奬勵冷藏庫

55. 宇都宮市大町所在冷藏庫
56. 北海道根室町所在冷藏庫
57. 別府市東濱所在冷藏庫
58. 千葉縣勝浦町所在冷藏庫
59. 長崎市丸尾町所在冷藏庫
60. 福島縣小名濱町所在冷藏庫
61. 高知縣清水町所在冷藏庫
62. 靜岡縣田子村所在冷藏庫
63. 香川縣多度津町所在冷藏庫
64. 靜岡縣御前崎村所在冷藏庫
65. 靜岡縣蒲原町所在冷藏庫
66. 大阪市中央卸賣市場所在冷藏庫
67. 東京市南小田原町所在冷藏庫

昭和二年度奬勵冷藏庫

68. 水戸市三ノ丸所在冷藏庫
69. 愛知縣三谷町所在冷藏庫
70. 福岡縣若松市所在冷藏庫
71. 青森縣田名部町所在冷藏庫
72. 岩手縣山田町所在冷藏庫
73. 青森市新濱町所在冷藏庫
74. 鳥取縣米子町所在冷藏庫
75. 札幌市北一條所在冷藏庫
76. 宮崎縣油津町所在冷藏庫
77. 靜岡縣下田町所在冷藏庫
78. 姫路市高尾町所在冷藏庫
79. 高知縣室戸町所在冷藏庫
80. 東京市深川古石場町所在冷藏庫
81. 福岡縣飲塚町所在冷藏庫
82. 三重縣富洲原町所在冷藏庫

昭和三年度奬勵冷藏庫

83. 青森市新安方町所在冷藏庫

84. 東京市南小田原町所在冷藏庫
85. 大阪市港區鶴濱通所在冷藏庫
86. 宮城縣女川町所在冷藏庫

昭和四年度奬勵冷藏庫

87. 廣島市福島町所在冷藏庫
88. 大分市勢家所在冷藏庫
89. 岩手縣普代村所在冷藏庫
90. 高知縣津呂町所在冷藏庫
91. 戸畑市汐井崎所在冷藏庫
92. 東京府羽田町所在冷藏庫
93. 愛知縣大濱町所在冷藏庫
94. 宮城縣氣仙沼町所在冷藏庫
95. 富山縣魚津町所在冷藏庫

昭和五年度奬勵冷藏庫

96. 愛媛縣八幡濱町所在冷藏庫
97. 茨城縣大津町所在冷藏庫
98. 函館市海岸町所在冷藏庫
99. 愛媛縣三津ヶ濱町所在冷藏庫
100. 横須賀市大瀧埋立地所在冷藏庫
101. 富山市神通町所在冷藏庫

奬勵冷藏庫一覽

1. 大正十二年度奬勵冷藏庫一覽
2. 大正十三年度奬勵冷藏庫一覽
3. 大正十四年度奬勵冷藏庫一覽
4. 大正十五年度奬勵冷藏庫一覽
5. 昭和二年度奬勵冷藏庫一覽
6. 昭和三年度奬勵冷藏庫一覽
7. 昭和四年度奬勵冷藏庫一覽
8. 昭和五年度奬勵冷藏庫一覽

大正十二年度
奨励冷蔵庫

冷藏庫 1

東京府小笠原島冷藏庫

總容積	8,758	凍結量	—
收容量	70.0	冷凍力	10.0

所在	東京府小笠原島父島大字扉風谷六番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄉業平町一七一番地
竣工年月	大正十二年六月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	仝　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	121	1,131	2″	232
	No. 2	〃	266	2,470	2″	396
	No. 3	〃	263	2,457	2″	442
小計		—	650	6,058	2″	1,071
凍結室						
小計						
準備室廊下 準備室		—	265	2,700		—
小計			265	2,700		—
總計		—	915	8,758	2″	1,071

冷藏庫略圖：——

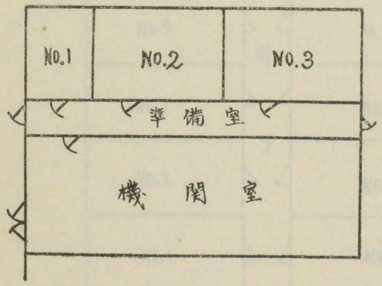

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		1,168.0
建物延坪	總延坪	24.0Ⓐ
	冷藏室	16.50
	凍結室	—
	準備室廊下	7.50
	機械室	30.00Ⓑ
	附屬室	—
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	70.0
	温度	15°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	15.0
	臺數	2Ⓑ
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	7.5
	氣筒 行程(吋)	7.5
	回轉數	180
主動機	種類	吸入瓦斯機關
	馬力	30×2
補機	冷却水喞筒	三聯成ポンプ
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	19呎12段4列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B.4″ 抗火石2寸	C.B 4″	C.B.2″ 抗火石2寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	抗火石2寸	C.B 4″	C.B.2″ 抗火石2寸

備考　Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
　　Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 2

長崎市旭町冷藏庫

總容積 39,007 | 凍結量 —
收容量 252.0 | 冷凍力 40.0

所在	長崎市旭町二丁目一番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄉業平町一七一番地
竣工年月	大正十二年十一月
設計者	日東製永株式會社
工事施行者	仝上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	350	2,800	2″	600
	No. 2	〃	350	2,800	2″	600
	No. 3	〃	350	2,800	2″	600
	No. 4	〃	350	2,800	2″	600
	No. 5	〃	350	2,800	2″	600
	No. 6	〃	350	2,800	2″	600
	No. 7	〃	350	2,800	2″	600
	No. 8	〃	350	2,800	2″	600
	No. 9	〃	350	2,800	2″	600
	No.10	〃	350	2,800	2″	600
小計		—	3,500	28,000	2″	6,000
凍結室						
小計						
準備室廊下	準備室	—	690	6,210		—
	廊下	—	533	4,797		—
小計		—	1,223	11,007		—
總計		—	4,723	39,007	2″	6,000

冷藏庫略圖：——

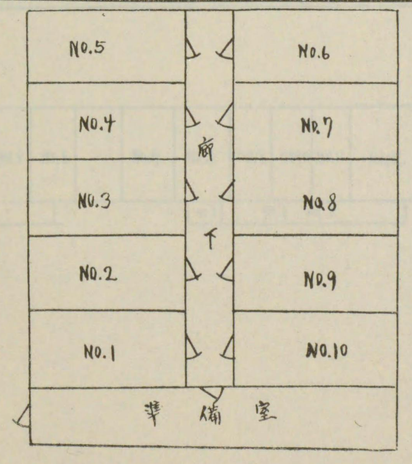

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		1,165.14
建物延坪	總延坪	166(壁内法)
	冷藏室	124.95
	凍結室	—
	準備室廊下	41.05
	機械室	Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	252.0
	温度	15°—20°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	80.0 Ⓐ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	13
	氣筒 行程(吋)	13
	回轉數	240
主動原機	種類	同期電動機
	馬力	150
補機	冷却水唧筒	三聯成ポンプ
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎18段9列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 5寸	C.D. 5寸	C.B. 2″ 抗火石2寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 床ニハシンダー8寸ヲシク
Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 3

山口縣彦島町冷藏庫

總容積 91,264 | 凍結量 —
收容量 350.0 | 冷凍力 48.00

所在	山口縣豊浦郡彦島町大字江ノ浦一一三〇番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十二年十一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	20°F	553	6,083	2″	1,152
	No. 2	〃	402	4,422	2″	768
	No. 3	〃	402	4,422	2″	768
	No. 4	〃	402	4,422	2″	768
	No. 5	〃	402	4,422	2″	768
	No. 6	〃	436	4,796	2″	896
	No. 7	〃	603	6,633	2″	1,536
	No. 8	〃	653	7,183	2″	1,536
	No. 9	〃	469	5,159	2″	1,152
	No.10	〃	469	5,159	2″	1,152
	No.11	〃	469	5,159	2″	1,152
	No.12	〃	804	8,844	2″	1,920
	No.13	〃	832	7,488	2″	1,905
小計		—	6,896	74,192	2″	15,473
準備室廊下	No. 1	—	768	8,448		—
	No. 2	—	72	792		—
	No. 3	—	712	7,832		—
小計		—	1,552	17,072		—
總計		—	8,448	91,264	2″	15,473

冷藏庫略圖：——

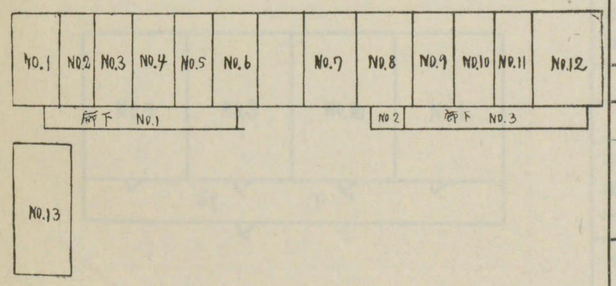

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		966.0(壁内法)
建物延坪	總延坪	330.00
	冷藏室	217.00
	凍結室	—
	準備室廊下	48.0
	機械室	34.00
	附屬室	
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	350.0
	温度	10°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	48.00
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	11
	氣筒 行程(吋)	22
	回轉數	80
主動原機	種類	蒸氣機關
	馬力	100
補機	冷却水喞筒	プランヂヤー式
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段5列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	S.D. 5寸	ジンダー 8寸	ジンダー 4寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考

冷藏庫 4

東京府品川町冷藏庫

總容積 13,680 | 凍結量 —
收容量 82.0 | 冷凍力 14.0

所在	東京府荏原郡品川町北品川宿五二番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十二年十二月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	292	2,480	2″ 640
	No. 2	〃	304	2,585	2″ 640
	No. 3	〃	304	2,585	2″ 640
	No. 4	〃	292	2,480	2″ 640
小計		—	1,192	10,130	2″ 2,560
凍結室					
小計					
準備室廊下	廊下	—	384	3,550	—
小計		—	384	3,550	—
總計		—	1,576	13,680	2″ 2,560

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料	煉瓦造
建物階數	階上製氷室
總敷坪數	252.9
建物延坪 總延坪	68.47Ⓐ
建物延坪 冷藏室	54.87
建物延坪 凍結室	—
建物延坪 準備室廊下	13.60
建物延坪 機械室	67.16Ⓑ
建物延坪 附屬室	Ⓑ
建物延坪 其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
冷藏	量(噸)	82.0
冷藏	温度	15°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
凍結	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3横置複働
冷凍機械	製作者	ヴイルター會社
冷凍機械	冷凍力(噸)	70.0Ⓑ
冷凍機械	臺數	1
冷凍機械 氣筒	數	1
冷凍機械 氣筒	直徑(吋)	13
冷凍機械 氣筒	行程(吋)	26
冷凍機械	回轉數	90
主動原機	種類	三交、誘、電動機
主動原機	馬力	100
補機	冷却水喞筒	三聯成喞筒
補機	ブライン喞筒	—
補機	ブラインクーラー	—
補機	コンデンサー	20呎12段9列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″ 抗火石2寸	C.B. 4″ 抗火石3寸	C.B. 2″ 抗火石3寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷兼用
床ハシンダ8寸ヲ敷ク

冷藏庫 5

富山縣新湊町冷藏庫

總容積 14,400 | 凍結量 —
收容量 89.0 | 冷凍力 9.5

所在	富山縣射水郡新湊町三箇新砂堀二二二番地
所在者氏名	伏木冷藏株式會社
所有者住所	富山縣射水郡新湊町三箇新二二二番地ノ一
竣工年月	大正十三年三月
設計者	矢野製氷冷藏工業所
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 2	15°F	544	5,184	2″	896
	No. 3	15°F	544	5,184	2″	896
小計		—	1,088	10,368	2″	1,792
凍結室						
小計						
準備室廊下	No. 1 準備室	15°F	247	2,304	2″	320
		30°F	198	1,728	2″	168
小計		—	445	4,032	2″	588
總計		—	1,533	14,400	2″	2,380

冷藏庫略圖：——

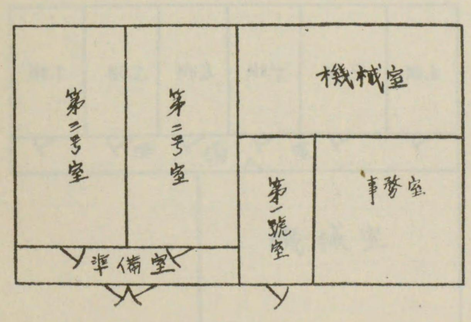

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		140.0
建物延坪	總延坪	84.00
	冷藏室	44.00
	凍結室	—
	準備室廊下	6.00
	機械室	18.00Ⓑ
	附屬室	8.00
	其ノ他	8.00

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	89.0
	温度	20—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	9.5
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$6^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$6^1/_2$
	回轉數	180
主動原機	種類	三交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水唧筒	ピストンポンプ
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.19尺12段
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	S.D. 7寸	S.D. 8寸	—
凍結室	—	—	—
準備室廊下	S.D. 7寸	S.D. 8寸	—

備考　Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 6

千葉縣本銚子町冷藏庫

總容積 115,800　凍結量 —
收容量 70.0　冷凍力 22.5

所在	千葉縣海上郡本銚子町一四三六番地
所有者氏名	日銚製氷冷藏株式會社
所有者住所	千葉縣海上郡本銚子町一四三六番地
竣工年月	大正十三年一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長
冷藏室	No. 1	20°F	185	1,480	2″ 270
	No. 2	〃	185	1,480	2″ 270
	No. 3	〃	185	1,480	2″ 270
	No. 4	〃	185	1,480	2″ 270
	No. 5	〃	185	1,480	2″ 270
	No. 6	〃	185	1,480	2″ 270
小計		—	1,110	8,880	2″ 1,620
凍結室					
小計					
準備室廊下	準備室	—	360	2,700	—
小計		—	360	2,700	—
總計		—	1,470	11,580	2″ 1,620

冷藏庫略圖：——

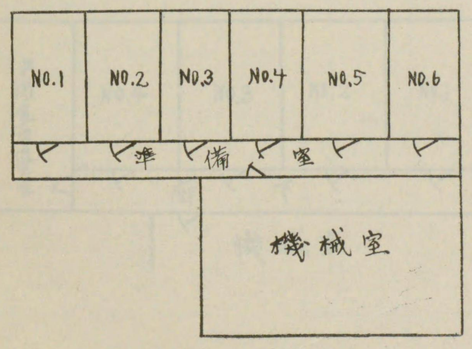

建物概要

外部建築材料		石造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		400.0
建物坪	總延坪	51.90Ⓐ
	冷藏室	39.74
	凍結室	—
	準備室廊下	12.16
	機械室	60.6Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	70.0
	温度	15°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	22.5
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	150
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	40
補機	冷却水唧筒	竪型三聯成
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段4列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 2″ 抗火石3寸	C.B.1.1尺	C.B. 2″ 抗火石2寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ機械室以下ヲ除ク
　　Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 7

東京市駒込林町冷藏庫

總容積 15,624 | 凍結量 —
收容量 78.0 | 冷凍力 14.0

所在	東京市本鄉區駒込林町一二六番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄉業平町一七一番地
竣工年月	大正十二年十一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最抵保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	300	2,190	2″	570
	No. 2	〃	300	2,190	2″	570
	No. 3	〃	300	2,190	2″	570
	No. 4	〃	300	2,190	2″	570
小計		—	1,200	8,760	2″	2,280
凍結室						
小計						
準備室廊下	準備室兼還元室	25°F	328	3,444	2″	430
	廊下	—	360	3,420		—
小計		—	688	6,864	2″	430
總計		—	1,888	15,624	2″	2,710

冷藏庫略圖：——

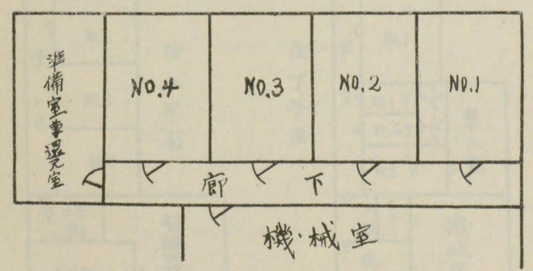

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		660.0
建物延坪	總延坪	69.93Ⓐ
	冷藏室	56.20
	凍結室	—
	準備室廊下	13.73
	機械室	74.32Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	78.0
	溫度	15°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3橫置複動
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	70.0Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	13
	氣筒 行程(吋)	26
	回轉數	90
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	100
補機	冷却水喞筒	三聯成ポンプ
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段9列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″ 抗火石3寸	C.D. 5寸	C.B. 2″ 抗火石3寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 2″ 抗火石3寸	C.D. 5寸	C.B. 2″ 抗火石3寸

備考 Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ 製氷兼用
床ニハシンダー8寸ヲ敷ク

冷藏庫 8

岩手縣鍬ケ崎町冷藏庫

総容積 41,570 | 凍結量 30.0
收容量 270.0 | 冷凍力 40.0

所在	岩手縣下閉伊郡鍬ケ崎町第一地割字上町一〇二
所有者氏名	三陸水產冷藏株式會社
所有者住所	盛岡市紺屋町二七番地
竣工年月	大正十三年四月
設計者	木下商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	616	4,280	2″	1,428
	No. 2	〃	486	4,620	2″	1,525
	No. 3	〃	446	4,390	2″	1,575
	No. 4	〃	462	4,400	2″	1,540
	No. 5C	〃	603	5,420	2″	1,600
小計		—	2,613	23,110	2″	7,668
凍結室	No. 1	—15°F	125	1,200	2′	1,510
	No. 2	〃	125	1,200	2″	1,510
	ブラインフリザー室	〃	344	3,270	1¼″	515
					2″	3,020
小計		—	594	5,670	1¼″	515
準備室	No. 1	25°F	428	4,280	2″	952
	No. 2	〃	428	4,280	1¼″	1,027
	グレージング室	〃	150	1,440	2″	166
	No. 3	〃	300	2,790		
小計		—	1,306	12,790	2″	1,118
					1¼″	1,027
總計		—	4,513	41,570	2″	11,806
					1¼″	1,542

冷藏庫略圖：——

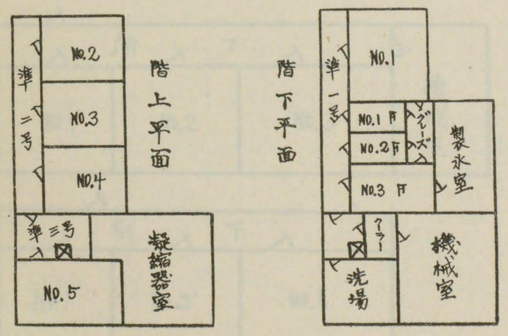

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		二階
敷地坪數		310.24
建物延坪	總延坪	155.84Ⓐ
	冷藏室	87.34
	凍結室	22.00
	準備室廊下	46.50
	機械室	Ⓑ82.68 (クーラー室ヲ含ム)
	附屬室	洗場14.00
	其ノ他	製氷室18.00 エレベーター室5.42

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚
	量(噸)	270.0
	温度	5°—10°F
凍結	凍結量(一日噸)	30.0
	温度	0°—10°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	フリック會社
	冷凍力(噸)	20
	臺數	2
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	50
補機	冷却水喞筒	井ノ口渦巻
	ブライン喞筒	5″×2 〃 〃 4″×1
	ブラインクーラー	34″×9′—0″×2箇
	コンデンサー	28″×6′—0″×1箇 D.P.20呎10段4列
冷却様式		NH_3ブライン式循環
凍結様式		同空氣凍結及ブラインフリーズ

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	スラヅグウール3寸	スラヅグウール3.5寸	木炭3.5寸
凍結室	スラヅグウール5寸C.B.2″	スラヅグウール3.5寸	C.B. 4″
準備室廊下	冷室	同様	—

備考 C：—增設、防熱ハC.D.4″
A：—機械室以下ヲ除ク
B：—製氷兼用

冷藏庫 9

沼津市船倉冷藏庫

總容積 18,865 | 凍結量 —
收容量 130 | 冷凍力 18

所在	靜岡縣沼津市本宇船倉一二二三番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十三年二月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室名細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	252	2,010	2″ 500
	No. 2	〃	252	2,010	2″ 500
	No. 3	〃	340	2,720	2″ 600
	No. 4	〃	252	1,890	2″ 450
	No. 5	〃	252	1,890	2″ 450
	No. 6	〃	340	2,550	2″ 550
小計			1,688	13,070	2″ 3,050
凍結室					
小計					
廊下	階下	—	374	2,990	—
	階上	—	374	2,805	—
小計			748	5,795	—
總計		—	2,436	18,865	2″ 3,050

冷藏庫略圖：——

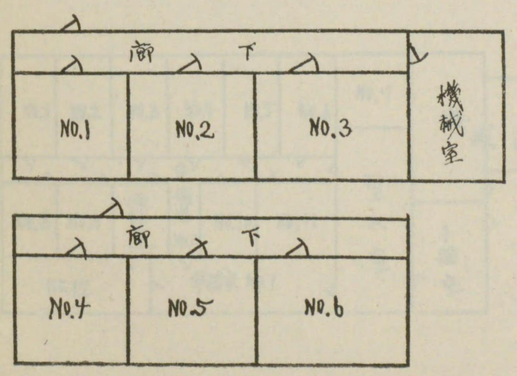

建物概要

外部建築材料		石造
建物階數		二階
敷地坪數		446.22
建物延坪	總延坪	94.64
	冷藏室	59.50
	凍結室	—
	準備室廊下	24.50
	機械室	10.64
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類鰹節
	量(噸)	130.0
	温度	15°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	18
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	8
	氣筒 行程(吋)	8
	回轉數	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	30
補機	冷却水喞筒	三聯成複働
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	11尺12段2列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 5寸	C.D. 5寸	C.B. 1″ 抗火石2寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 10

大阪市鶴濱通冷藏庫

總容積 104,520　凍結量 8.0
收容量 600.0　冷凍力 65.0

所在	大阪市港區鶴濱通一丁目
所有者氏名	中央冷藏株式會社
所有者住所	大阪市港區鶴濱通一丁目一番地
竣工年月	大正十三年二月
設計者	神戸製鋼所
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	496	6,940	2″	1,080
	No. 2	〃	496	6,940	2″	1,080
	No. 3	〃	496	6,940	2″	1,080
	No. 4	〃	496	6,940	2″	1,080
	No. 5	〃	496	6,940	2″	1,080
	No. 6	〃	496	6,940	2″	1,080
	No. 7	〃	484	6,780	2″	966
	No. 8	〃	352	4,930	2″	750
	No. 9	〃	352	4,930	2″	750
	No.10	〃	363	5,080	2″	798
	No.11	〃	550	7,200	2″	1,092
	No.12	〃	759	10,170	2″	1,120
小計		—	5,836	73,950	2″	11,956
凍結室	No. 1	−20°F	334	4,310	2″	620
					1¼″	4,320
小計		—	334	4,310	2″	620
					1¼″	4,320
準備室廊下	No. 1	—	920	12,870	—	—
	No. 2	—	957	13,390	2″	1,160
小計			1,877	26,260	2″	1,160
總計		—	8,047	104,520	2″	13,736
					1¼″	4,320

冷藏庫略圖：——

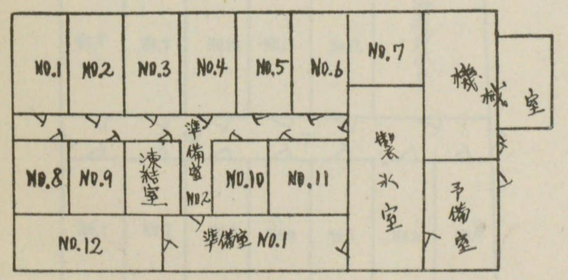

建物概要

外部建築材料		煉瓦及木造
建物階數		平家
敷地坪數		3,750.0
建物延坪	總延坪	379.00
	冷藏室	193.00
	凍結室	12.00
	準備室廊下	63.00
	機械室	47.00Ⓑ
	附屬室	製氷貯氷室 64.00
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	600.0
	温度	15°—40°F
凍結	凍結量(一日噸)	8.00
	温度	0°—10°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類		NH_3單働竪型
	製作者		神戸製鋼 フクツク
	冷凍力(噸)	25.0	40.0
	臺數	1	1
	氣筒 數	2	2
	氣筒 直徑(吋)	7	10
	氣筒 行程(吋)	7	10
	回轉數	250	200
主動原機	種類	三、交、誘、電動機	
	馬力	50	75
補機	冷却水喞筒	三聯成ピストンタービン	
	ブライン喞筒	—	
	ブラインクーラー	—	
	コンデンサー	D.P.20呎12段2列 シエル、チューブ	
冷却様式		NH_3直接膨脹	
凍結様式		同上空氣凍結	

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″	C.D. 3寸	C.D. 5寸
凍結室	C.B. 4″	C.D. 4″	C.B. 6″
準備室廊下	C.B. 3″	C.D. 3寸	C.D. 3寸

備考　Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 11

靜岡縣清水市冷藏庫

總容積	14,960	凍結量	—
收容量	130	冷凍力	40.0

所在	靜岡縣清水市入江受新田四二二番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄉業平町一七一番地
竣工年月	大正十三年三月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	180	1,080	2″	250
	No. 2	〃	〃	1,080	2″	250
	No. 3	〃	〃	1,080	2″	250
	No. 4	〃	〃	1,080	2″	250
	No. 5	〃	〃	1,080	2″	250
	No. 6	〃	〃	1,080	2″	250
	No. 7	〃	150	900	2″	200
	No. 8	〃	180	1,080	2″	250
	No. 9	〃	180	1,080	2″	250
	No.10	〃	180	1,080	2″	250
	No.11	〃	180	1,080	2″	250
	No.12	〃	180	1,080	2″	250
小計		—	2,130	12,780	2″	2,950
準備室廊下	廊下		363	2,180		—
小計		—	363	2,180		—
總計		—	2,493	14,960	2″	2,950

冷藏庫略圖：——

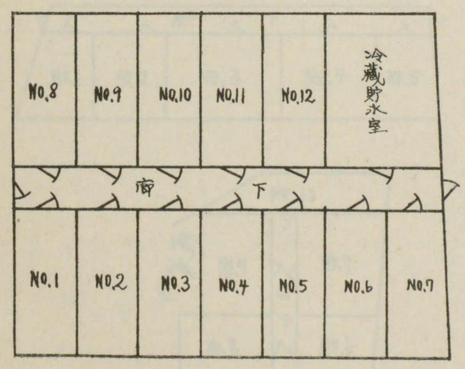

建物概要

外部建築材料		石造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		378.33
建物延坪	總延坪	91.48Ⓐ
	冷藏室	79.25
	凍結室	—
	準備室廊下	13.23
	機械室	66.56Ⓑ
	附屬室	貯氷庫 9.45
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	130
	温度	15°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	80Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	13
	氣筒 行程(吋)	26
	回轉數	94.0
主動原機	種類	三、交、誘、電働機
	馬力	100
補機	冷却水喞筒	三聯成堅型
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段9列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷凍室	C.D. 5寸	C.D. 8寸	C.D. 1″ 抗火石2寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
機械室ハ新設ノモノナリ
Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 12

神戸市磯上通冷藏庫

總容積 89,130 | 凍結量 —
收容量 560.0 | 冷凍力 25.0

所在	神戸市磯上通一丁目六番地
所有者氏名	三澤爲泰
所有者住所	神戸市磯上通一丁目十番地
竣工年月	大正十三年二月
設計者	——
工事施行者	——

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	482	5,680	2″	780
	No. 2	5°	499	5,770	2″	1,534
	No. 3	15°	1,022	12,380	2″	1,496
	No. 4	〃	796	9,800	2″	1,222
	No. 5	〃	428	5,270	2″	804
	No. 6	〃	321	4,210	2″	715
	No. 7	〃	684	9,040	2″	1,211
	No. 8	〃	475	6 260	2″	1,212
	No. 9	〃	641	8,450	2″	1,217
	No.10	〃	558	7,340	2″	1,183
小計			5,906	74,200	2″	11,374
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	793	9,530		—
	〃	—	450	5,400		—
小計		—	1,243	14,930		—
總計		—	7,149	89,130	2″	11,374

冷藏庫略圖：——

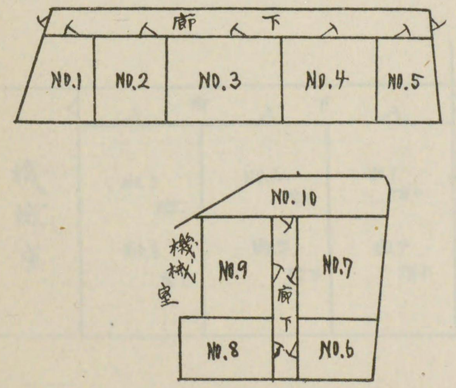

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		平家
敷地坪數		441.791
建物延坪	總延坪	197.97Ⓐ
	冷藏室	152.92
	凍結室	—
	準備室廊下	45.05
	機械室	Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	560.0
	温度	15°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	25
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	150
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	40
補機	冷却水喞筒	三聯成複筒
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	18呎16段2列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	籾殻5寸	籾殻5寸	籾殻3寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓐ製氷釜用

冷藏庫 13

靜岡縣燒津町冷藏庫

總容積 32,877 | 凍結量 —
收容量 152.0 | 冷凍力 27.0

所在	靜岡縣志太郡燒津町七五四番地ノ四
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十三年十二月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	560	4,480	2″	800
	No. 2	〃	567	4,536	2″	800
	No. 3	〃	565	4,520	2″	800
	No. 4	〃	536	4,288	2″	1,000
	No. 5	〃	540	4,320	2″	1,000
	No. 6	〃	536	4,288	2″	1,000
小計		—	3,304	26,432	2″	5,400
凍結室						
小計						
廊下	廊下、階上	—	348	2,880		—
	廊下、階下	—	348	3,565		—
小計		—	696	6,445		—
總計		—	4,000	32,877	2″	5,400

冷藏庫略圖；——

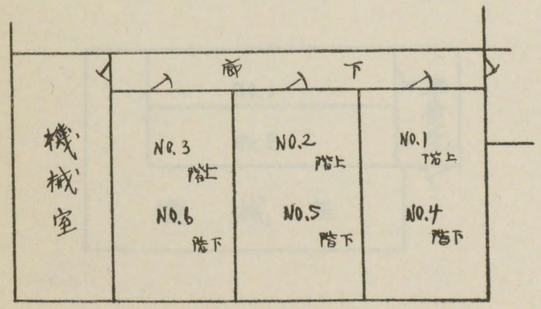

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		二階建
敷地坪數		560
建物延坪	總延坪	178.18Ⓐ
	冷藏室	115.32
	凍結室	—
	準備室廊下	25.20
	機械室	37.66
	附屬室	
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	魚類鰹節
	量(噸)	152.0
	温度	18°—36°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	27
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	180
主機原動	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	35
補機	冷却水喞筒	三聯成複働
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段3列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 5寸	C.D. 5寸	シンダー 8寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ他ニ製氷室冷藏庫アレド奬勵冷藏庫ノミヲ計上ス

冷藏庫 14

高松市下横町冷藏庫

總容積	6,385	凍結量	—
收容量	43.0	冷凍力	10.0

所在	高松市下横町六四番地
所有者氏名	高松製氷冷藏株式會社
所有者住所	高松市下横町六四番地
竣工年月	大正十三年五月
設計者	龍紋氷室
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	25°F	262	2,490	2″	680
	No. 2	〃	262	2,490	2″	680
小計		—	524	4,980	2″	1,360
凍結室						
小計						
準備室廊下	準備室	—	148	1,405		—
小計		—	148	1,405		—
總計		—	672	6,385	2″	1,360

冷藏庫略圖；——



建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		300.0
建物延坪	總延坪	26.38Ⓐ
	冷藏室	21.10
	凍結室	—
	準備室廊下	5.28
	機械室	75.28Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	43.0
	溫度	20°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	27.0Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	40
補機	冷却水唧筒	三聯式唧筒
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.19呎10段
冷却様式		NH_3 ブライン循還
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 4寸	コークス 4寸	ジンダー 1尺
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ冷藏庫ノミ
　　Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 15

靜岡縣中泉町冷藏庫

總容積 11,044 | 凍結量 —
收容量 39.0 | 冷凍力 4.0

所在	靜岡縣中泉町中泉六百番地
所有者氏名	遠江製氷冷藏株式會社
所有者住所	靜岡縣盤田郡中泉町中泉六百番地
竣工年月	大正十三年三月
設計者	チエルベルジス繼續合資會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	214.0	2,787	1 1/4″	420
	No. 2	〃	214.0	2,787	〃	420
	No. 3	〃	104.4	1,360	〃	196
	No. 4	0°F	104.4	1,360	〃	504
小計		—	636.8	8,294.0	1 1/4″	1,540
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	183.0	2,380		—
	準備室	—	28.5	370		—
小計		—	211.5	2,750		—
總計		—	848.3	11,044	1 1/4″	1,540

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		平家
敷地坪數		109.00
建物延坪	總延坪	32.00Ⓐ
	冷藏室	24.00
	凍結室	—
	準備室廊下	8.00
	機械室	7.00Ⓑ
	附屬室	製氷室其他 23.66Ⓑ
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	39.0
	温度	20°—36°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	炭酸瓦斯横型
	製作者	サブロー會社
	冷凍力(噸)	12 Ⓕ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	3 3/4
	氣筒 行程(吋)	17 1/2
	回轉數	130
主動原機	種類	三、交、誘、電働機
	馬力	25
補機	冷却水唧筒	三聯成ポンプ
	ブライン唧筒	
	ブラインクーラー	製氷槽
	コンデンサー	浸漬式
冷却様式		ブライン循環
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	S.D. 1尺	S.D. 1尺	シンダー 1尺5寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 16

山口縣彦島町冷藏庫

總容積 226,571 | 凍結量 60.0
收容量 500.0 | 冷凍力 240.0

所在	山口縣豊浦郡彦島町大字彦島
所有者氏名	株式會社林兼商店
所有者住所	下關市竹崎町六十六番地
竣工年月	大正十三年七月
設計者	所有者
工事施行者	

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	0°F	779	12,873	2″	1,320
	No. 2	〃	748	10,974		1,056
	No. 3	〃	759	11,127		1,056
	No. 4	〃	759	11,127		1,056
	No. 5	〃	759	11,127		1,056
	No. 6	〃	1,070	15,728		1,320
	No. 7	〃	755	10,400		1,188
	No. 8	〃	750	10,688		1,320
	No. 9	〃	759	11,127		990
	No.10	〃	759	11,127		990
	No.11	〃	1,070	15,728		1,320
	No.12	〃	755	10,400		1,188
	No.13	〃	1,708	25,034		1,802
	No.14	〃	1,708	25,034		1,802
小計			13,138	192,494	2″	16,408
凍結室	No.1 階下	面積	64.88坪			
廊下	廊下	50°F	1,187	17,400		
	豫備室	30°F	1,137	16,677	2″	1,500
小計			2,324	34,077	2″	1,500
總計		—	15,462	226,571	2″	17,908

冷藏庫略圖：——

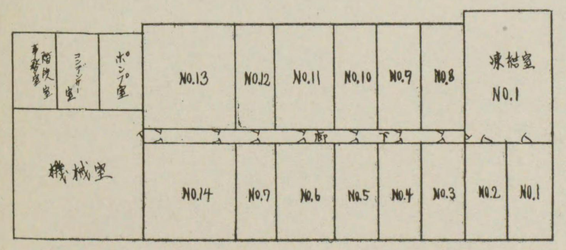

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土、木造
建物階數		二階製氷室
敷地坪數		700.00
建物延坪	總延坪	551.10Ⓐ
	冷藏室	426.58
	凍結室	64.68
	準備室廊下	59.84
	機械室	100.00Ⓑ
	附屬室	ポンプ 19.41 コンデンサー 19.41
	其ノ他	製氷室 206.12 冷却器室 19.41 ジム階段室 39.4 チャージ室 29.17

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	500.0
	温度	0°—15°F
凍結	凍結量(一日噸)	60.0
	温度	0—10°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ルードウイヒ・ベーグ 神戸製鋼所
	冷凍力(噸)	53 80
	臺數	3 1
	氣筒 數	1 1
	氣筒 直徑(粍)	300
	氣筒 行程(粍)	400
	回轉數	130
主動原機	種類	デイゼル、エンジン
	馬力	200×2
補機	冷却水喞筒	渦巻 3臺
	ブライン喞筒	〃 2臺
	ブラインクーラー	D.P.1,046呎
	コンデンサー	D P. 15.5呎22段6列 20呎30段8列
冷却様式		NH_3 ブライン循環
凍結様式		ブライン凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C B 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 3″	C.B. 3″	C.B. 3″

備考　凍結室ハ鹹水凍結槽ヲ有ス
Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷兼用

大正十三年度
奨勵冷藏庫

冷藏庫 17

北海道高島町冷藏庫

總容積	~~29,774~~ 32060	凍結量	18
收容量	250	冷凍力	40

所在	北海道高島町大字大島町四四七番地
所有者氏名	小樽漁港株式會社
所有者住所	東京市芝區源助町一
竣工年月	大正十三年十二月
設計者	神戸製鋼所
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	第一號室	10°F	270.7	3,248.4	2″	600
	第二號室	〃	270.7	3,248.4		600
	第三號室	〃	270.7	3,248.4		600
	第四號室	〃	270.7	3,248.4		600
	第五號室	〃	270.7	3,248.4		600
	第六號室	〃	270.7	3,248.4		600
	第七號室	〃	190.7	2,288.4		500
小計		—	1,814.9	21,778.8	2″	4,100
凍結室		—5°F	342.0	4,104.0	2″	2,180
小計		—	342.0	4,104.0	2″	2,180
準備室廊下		—	515.0	6,180.0		—
小計		—	515.0	6,180 0		—
總計		—	2,671.9	32,062.8		6,280

冷藏庫略圖：——

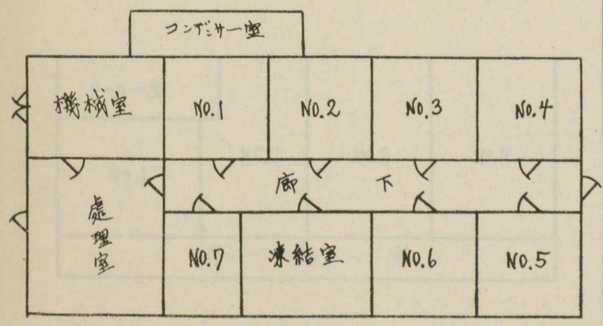

建物概要

外部建築材料		鐵筋コンクリート 鐵筋ブロック
建物階數		平家
敷地坪數		
建物延坪	總延坪	126.65
	冷藏室	60.7
	凍結室	11.3
	準備室廊下	18.0
	機械室	12.0
	附屬室	18.0
	其ノ他	6.65
	コンデンサー室	

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚
	量(噸)	250
	溫度	20°內外
凍結	凍結量(一日噸)	18
	溫度	10°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 壓縮竪型
	製作者	神戸製鋼所
	冷凍力(噸)	20+20=40
	臺數	2
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	8
	氣筒 行程(吋)	8
	回轉數	250
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	40×2
補機	冷却水唧筒	いのくち式 口徑3吋2臺
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	二重管式
冷却樣式		直接膨脹
凍結樣式		空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″	C.B. 5″	C.B. 4吋 抗火石3寸
凍結室	同上	同上	
準備室廊下			

備考

冷藏庫 18

金澤市白菊町冷藏庫

總容積 27,260 | 凍結量 —
收容量 127.0 | 冷凍力 11.8

所在	金澤市白菊町三八番地ノ一
所有者氏名	北陸冷藏株式會社
所有者住所	金澤市白菊町三八番地ノ一
竣工年月	大正十三年三月
設計者	葛原商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	405	4,250	2″	1,012
	No. 2	〃	420	4,410	2″	996
	No. 3	〃	480	5,040	2″	1,140
	No. 4	〃	457	4,800	2″	1,140
小計		—	1,762	18,500	2″	4,288
凍結室						
小計						
準備室廊下	No. 1	30°	499.0	5,240	2″	342
小計		—	499.0	5,240	2″	342
總計		—	2,261	23,740	2″	4,630

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		木造腰煉瓦
建物階數		平家、機室二階
敷地坪數		941.00
建物延坪	總延坪	72.75Ⓐ
	冷藏室	57.00
	凍結室	—
	準備室廊下	15.75
	機械室	63.125Ⓒ
	附屬室	クーラー室6.00
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	127.00
	温度	20°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	フリツク會社
	冷凍力(噸)	11.8
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	7
	氣筒 行程(吋)	7
	回轉數	210
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水唧筒	渦巻唧筒
	ブライン唧筒	同
	ブラインクーラー	26吋6呎
	コンデンサー	D.P.20呎10段
冷却様式		NH_3 ブライン循環
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″ S.D. 1尺	C.B. 3″ S.D. 5寸	C.B. 8″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	S.D.—5寸	S.D. 6寸	S.D. 4″

備考 Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷兼用
Ⓒ凝縮器室ヲ含ム

冷藏庫 19

北海道小樽市冷藏庫

總容積 112,781 | 凍結量 —
收容量 760 | 冷凍力 50

所在	小樽市廄町四番地
所有者氏名	北海製罐倉庫株式會社
所有者住所	小樽市北濱町三丁目六番地
竣工年月	大正十三年四月
設計者	神戶製鋼所
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	704	9,860	2″	1,380
	No. 2	5°F	704	9,860	2″	1,530
	No. 3	15°F	736	10,300	2″	3,000
	No. 4Ⓐ	10°F	830	11,536	2″	1,900
	No. 5Ⓐ	〃	830	11,536	2″	1,900
	No. 6Ⓐ	〃	830	11,536	2″	1,900
	No. 7Ⓐ	〃	830	11,536	2″	1,900
小計		—	5,464	76,164	2″	13,510
凍結室						
小計						
準備室廊下	準備室	—	1,305	18,550		
	豫備室No.1	—	464	6,500	2″	280
	〃 No.2	—	345	4,830	2″	250
	廊下	—	484	6,737	2″	280
小計		—	2,598	36,617	2″	810
總計		—	8,062	112,781	2″	14,320

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		433.0
建物延坪	總延坪	315.0
	冷藏室	168.0
	凍結室	—
	準備室廊下	82.0
	機械室	40.0
	附屬室	15.0
	其ノ他	10.0

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚、鹽魚
	量(噸)	560.0　200.0
	温度	15°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	神戶製鋼所
	冷凍力(噸)	25
	臺數	2
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	7.5
	氣筒 行程(吋)	7.5
	回轉數	250
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	50×2臺
補機	冷却水唧筒	三聯成複働
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	19呎14段4列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D.6.5寸	C.B. 2″ C.D. 5寸	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.D.6.5寸	C.B. 2″ C.D. 5寸	C.B. 6″

備考　Ⓐ後ニ增設セル部分

冷藏庫 20

德島市堀裏町冷藏庫

總容積 18,201 | 凍結量 —
收容量 140 | 冷凍力 10

所在	德島市堀裏町字中洲一三五番地
所有者氏名	株式會社德島魚市場
所有者住所	德島市新魚町字新魚町三番地
竣工年月	大正十三年十一月
設計者	矢野製氷冷藏工業所
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	379	3,412	2″ 560
	No. 2	〃	379	3.412	2″ 560
	No. 3	〃	379	4,360	2″ 720
	No. 4	〃	379	4,360	2″ 720
小計		—	1,516	15,544	2″ 2,560
凍結室					
小計					
準備室廊下	廊下、上	—	129	1,167	—
	〃 下	—	129	1,490	—
小計			258	2,657	—
總計		—	1,774	18,201	2″ 2,560

冷藏庫略圖：——

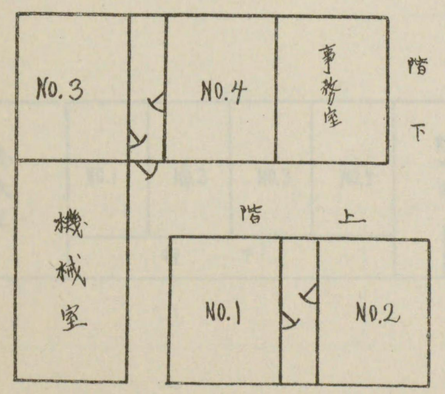

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		二階
敷地坪數		160.00
建物延坪	總延坪	56.00Ⓐ
	冷藏室	48.00
	凍結室	—
	準備室廊下	8.00
	機械室	24.00Ⓑ
	附屬室	24.00Ⓑ
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	140
	温度	20°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	10
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$6^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$6^1/_2$
	回轉數	160
主動原機	種類	三、交、誘、電働機
	馬力	20
補機	冷却水唧筒	ピストン唧筒
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.20呎12段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	S.D. 6寸	S.D. 1尺	シンダー 8寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ冷藏庫ノミ
Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 21

神奈川縣小田原町冷藏庫

總容積	4,004	凍結量	—
收容量	74	冷凍力	10

所在	神奈川縣足柄下郡小田原町幸一丁目二番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十三年七月
設計者	所有者
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	273	2,457	2″	640
	No. 2	〃	281	2,529	2″	640
	No. 3	〃	281	2,529	2″	640
	No. 4	〃	281	2,529	2″	640
小計		—	1,116	10,044	2″	2,560
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	360	3,960		—
小計		—	360	3,960		—
總計		—	1,476	14,004	2″	2,560

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		二階製氷室
敷地坪數		719.00
建物延坪	總延坪	112.01
	冷藏室	39.46
	凍結室	—
	準備室廊下	12.70
	機械室	43.34Ⓐ
	附屬室	16.51Ⓐ
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	74
	温度	15°—20°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	40Ⓐ
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	10
	氣筒 行程(吋)	10
	回轉數	150
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	50
補機	冷却水喞筒	ウオシントン複働
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段5列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″ 抗火石2寸	C.B. 2″ 抗火石2寸	C.B. 2″ 抗火石2寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ製氷兼用機械室ハ凝縮器室ヲ含ム
天井ハ製氷槽防熱兼用

冷藏庫 22

和歌山市元町冷藏庫

總容積	13,370	凍結量	—
收容量	78	冷凍力	16

所在	和歌山市元町奉行町二丁目二十一番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十三年十一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	305	2,440	2″	648
	No. 2	〃	305	2,440	2″	648
	No. 3	〃	305	2,440	2″	648
	No. 4	〃	305	2,440	2″	648
小計		—	1,220	9,760	2″	2,592
凍結室 小計						
準備室廊下 廊下		—	380	3,610		—
小計		—	380	3,610		—
總計		—	1,600	13,370	2″	2,592

冷藏庫略圖：——

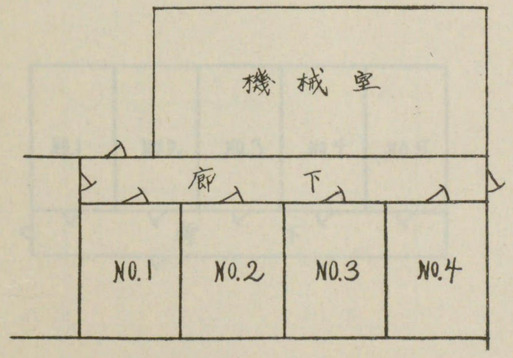

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		1,200.00
建物延坪	總延坪	55.00Ⓐ
	冷藏室	41.25
	凍結室	—
	準備室廊下	13.75
	機械室	72.00Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	78
	温度	18°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	60Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	12
	氣筒 行程(吋)	24
	回轉數	75
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	90
補機	冷却水喞筒	三聯成複働
	ブライン喞筒	一
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段7列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″	Ⓑ	C.B. 2″ 抗火石3寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
　　Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 23　名古屋市熱田大瀬古町冷藏庫

總容積 11,820　凍結量 —
收容量 74　冷凍力 20

所在	名古屋市南區熱田大瀬古町二七番地ノ三
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十三年七月
設計者	所有者
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	232	1,624	2″	480
	No. 2	〃	232	1,624	2″	480
	No. 3	〃	232	1,624	2″	480
	No. 4	〃	232	1,624	2″	480
	No. 5	〃	232	1,624	2″	480
小計		—	1,160	8,120	2″	2,400
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	390	3,700		—
小計		—	390	3,700		—
總計		—	1,550	11,820	2″	2,400

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料	煉瓦造
建物階數	階上製氷室
敷地坪數	323.43
建物延坪	
總延坪	95.67
冷藏室	44.70
凍結室	—
準備室廊下	13.12
機械室	37.85Ⓐ
附屬室	Ⓐ
其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	74
	温度	18°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	60Ⓐ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	12
	氣筒 行程(吋)	24
	回轉數	75
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	90
補機	冷却水喞筒	三聯成喞筒
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段7列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 5寸	製氷槽	C.B. 2″ 抗火石3寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 24

三重縣桑名町冷藏庫

總容積 5,010 | 凍結量 —
收容量 24 | 冷凍力 6.5

所在	三重縣桑名町大字三之丸一四一番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十四年二月
設計者	所有者
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	86.2	646.5	1″ 133
	No. 2	〃	88.6	664.5	1″ 133
	No. 3	〃	89.9	678.2	1″ 133
	No. 4	〃	123.3	924.7	1″ 178
小計		—	388	2,913.9	1″ 577
凍結室					
小計					
準備室廊下	廊下	—	196	2,097	—
小計		—	196	2,097	—
總計		—	584	5,010.9	1″ 577

冷藏庫略圖：——

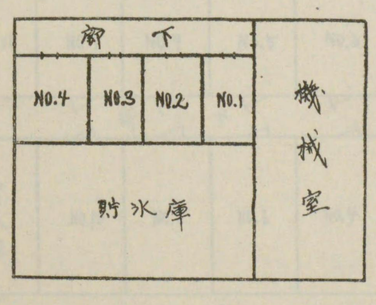

建物概要

外部建築材料		煉瓦及混凝土
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		323.00
建物延坪	總延坪	22.75Ⓐ
	冷藏室	16.25
	凍結室	—
	準備室廊下	6.50
	機械室	21.00Ⓑ
	附屬室	22.75Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	24
	温度	20°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	6.5
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	6
	氣筒 行程(吋)	6
	回轉數	160
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	10
補機	冷却水喞筒	横型複働
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.20呎12段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″ S.D. 4寸	S.D. 1尺	C.B. 4″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ冷藏庫ノミ
Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 25

大阪市臼屋町冷藏庫

總容積 38,375 | 凍結量 —
收容量 260 | 冷凍力 51.0

所在	大阪市北區臼屋町四二、四三番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄕業平町一一七—番地
竣工年月	大正十三年十一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	290	2,465	2″	612
	No. 2	〃	406	3,451	2″	864
	No. 3	〃	290	2,465	2″	612
	No. 4	〃	406	3,451	2″	864
	No. 5	〃	290	2,465	2″	612
	No. 6	〃	406	3,451	2″	864
	No. 7	〃	290	2,465	2″	612
	No. 8	〃	406	3,451	2″	864
	No. 9	〃	290	2,465	2″	612
	No.10	〃	406	3,451	2″	864
	N .11	〃	290	2,465	2″	612
小計		—	3,770	32,045	2″	7,992
準備室廊下	廊下	—	633	6,330		—
小計		—	633	6,330		—
總計		—	4,403	38,375	2″	7,992

冷藏庫略圖：——

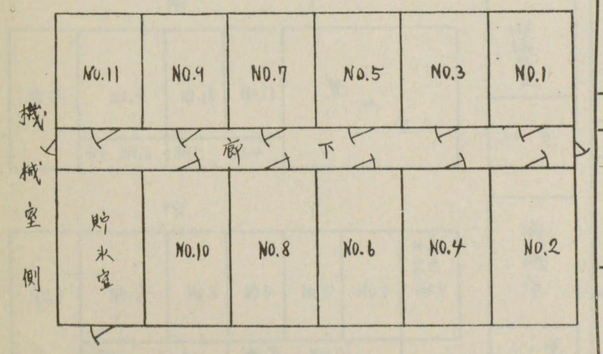

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		452 11
建物延坪	總延坪	151.25Ⓐ
	冷藏室	129.25
	凍結室	—
	準備室廊下	22.00
	機械室	104.00Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	260.0
	温度	18°—36°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ヴイルルター會社
	冷凍力(噸)	80.0Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	13
	氣筒 行程(吋)	13
	回轉數	240
主動原機	種類	同期電動機
	馬力	150
補機	冷却水喞筒	三聯成複働
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデサンー	20呎12段18列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″	C.D. 6寸	C.B. 2″ 抗火石 3寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷室兼用

冷藏庫 26

大阪市木津敷津町冷藏庫

總容積	123,550	凍結量	—
收容量	770	冷凍力	80

所在	大阪市木津敷津町壹丁目壹千拾四番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東市京本所區中ノ鄕業平町一七一番地
竣工年月	大正十三年十一月
設計者	長谷川鐵工所
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	20°F	1,367	14,600	2″	1,750
	No. 2	〃	995	10,330	2″	1,224
	No. 3	〃	654	6,920	2″	830
	No. 4	〃	646	6,890	2″	830
	No. 5	〃	646	6,890	2″	830
	No. 6	〃	654	6,975	2″	830
	No. 7	〃	639	6,780	2″	830
	No. 8	〃	1,367	14,600	2″	1,750
	No. 9	〃	1,096	13,80	2″	1,324
	No.10	〃	659	8,320	2″	830
	No.11	〃	648	8,165	2″	830
小計		—	9,371	104,270	2″	11,858
準備室廊下	No. 1	—	432	5,620	2″	370
	No. 2	—	513	6,150	2″	432
	No. 3	—	200	2 400	2″	144
	No .4	—	340	5,110	2″	324
小計		—	1,485	19,280	2″	1,270
總計		—	10,856	123,550	2″	13,128

冷藏庫略圖：——

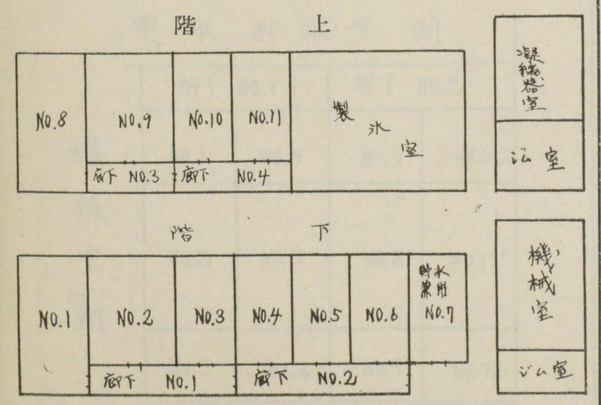

建物概要

外部建築材料		煉瓦及木造
建物階數		二階
敷地坪數		336.37
建物延坪	總延坪	304.03Ⓐ
	冷藏室	251.6
	凍結室	—
	準備室廊下	52.43
	機械室	67.50Ⓑ
	附屬室	製氷室 80.00
	其ノ他	貯氷室 20.8
	事務室	32.5

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	770
	温度	20°—30°
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類		NH_3 横置複働
	製作者		長谷川鐵工所
	冷凍力(噸)	35Ⓑ	60
	臺數	2	1
	氣筒 數	1	1
	氣筒 直徑(吋)	10	12½
	氣筒 行程(吋)	20	25
	回轉數	90	84
主動原機	種類	三、交、誘、電動機	
	馬力	75	120
補機	冷却水喞筒	堅型三聯成	
	ブライン喞筒	—	
	ブラインクーラー	—	
	コンデンサー	17呎10段12列Ⓑ	
冷却様式		NH_3 直接膨脹	
凍結様式		—	

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B.3.5″	C.B.3.5″	C.B.3.5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
　　Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 27

東京市築地四丁目冷藏庫

總容量 38,980 | 凍結量 —
收容量 240 | 冷凍力 40

所在	東東市京橋區築地四丁目一番地
所有者氏名	東京市
所有者住所	東京市
竣工年月	大正十三年九月
設計者	東京市
工事施行者	高田商會

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	20°F	139	2,065	2″	2,390
	No. 2	32°F	284	4,200	2″	2,800
	No. 3	45°F	139	2,065	2″	650
	No. 4	20°F	144	2,100	2″	2,260
	No. 5	32°F	299	4,370	2″	2,720
	No. 6	45°F	143	2,080	2″	650
	No. 7	20°F	144	2,240	2″	2,260
	No. 8	32°F	278	4,320	2″	2,720
	No. 9	45°F	134	2,080	2″	650
	No.10	20°F	140	2,045	2″	2,390
	No.11	32°F	190	4,235	2″	2,800
	No.12	45°F	140	2,045	2″	650
小計		—	2,274	33,845	2″	22,940
準備室廊下	廊下 No. 1	—	186	2,465	2″	480
	〃 No. 2	—	191	2,670	2″	480
小計		—	377	5,135	2″	960
總計		—	2,651	38,980	2″	23,900

冷藏庫略圖:——

製氷貯氷室側

廊下 NO.1		廊下 NO.2	
NO.1	NO.4	NO.7	NO.10
NO.2	NO.5	NO.8	NO.11
NO.3	NO.6	NO.9	NO.12

機械室側

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		—
建物延坪	總延坪	125.00Ⓐ
	冷藏室	90.00
	凍結室	—
	準備室廊下	35.00
	機械室	48.00Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	240
	温度	20°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類		NH_3 横置複働
	製作者		ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	40	20Ⓑ
	臺數	1	1
	氣筒 數	1	1
	氣筒 直徑(吋)	$10^1/_2$	8
	氣筒 行程(吋)	20	16
	回轉數	90	130
主動原機	種類	三、交、誘、電動機	
	馬力	75	40
補機	冷却水喞筒	ねのくちタービン	
	ブライン喞筒	—	
	ブラインクーラー	—	
	コンデンサー	D.P.20呎12段7列	
冷却様式		NH_3 直接膨脹	
凍結様式		—	

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 4″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 4″

備考 Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷缶用

冷藏庫 28

石川縣輪島町冷藏庫

總容積	7,706	凍結量	1.9
收容量	33	冷凍力	10

所在	石川縣輪島町字河井町六部七番地
所有者氏名	富山電氣株式會社
所有者住所	富山市星井町八四番地
竣工年月	大正十四年一月
設計者	鈴木商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	20°F	121	1,331	1¼″	444
	No. 2	〃	121	1,331	1¼″	444
	No. 3	〃	121	1,331	1¼″	444
小計		—	363	3,993	1¼″	1,332
凍結室	No. 1		113	1,243	1¼″	118
				鹽水槽内	1¼″	282
小計		—	113	1,243	1¼″	400
準備室廊下	廊下	—	225	2,470	1¼″	268
小計			225	2,470	1¼″	268
總計		—	701	7,706	1¼″	2,000

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		634.00
建物延坪	總延坪	24.00Ⓐ
	冷藏室	12.34
	凍結室	3.76
	準備室廊下	7.90
	機械室	21.0Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	33
	温度	20°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	1.9
	温度	5°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	バルカン會社
	冷凍力(噸)	20Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	8
	氣筒 行程(吋)	8
	回轉數	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	35
補機	冷却水唧筒	複働ピストン
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.20呎12段2列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		鹽水凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 3″ S.D. 5寸	C.B. 2″ S.D. 5″	C.D. 2″ S.D. 4寸
凍結室	C.B. 3″ S.D. 5″	C.B. 3″ S.D. 5″	C.B. 3″ S.D. 5″
準備室廊下	S.D. 8寸	S.D. 8寸	S.D. 8寸

備考 Ⓐ機械室其他ヲ含マズ
Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 29

東京市南飯田町冷藏庫

總容積 16,857 | 凍結量 —
收容量 85 | 冷凍力 10

所在	東京市京橋區南飯田町一二番地
所有者氏名	日本製氷株式會社
所有者住所	東京市京橋區南飯田町一二番地
竣工年月	大正十三年十一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	207	1,863	2″	440
	No. 2	〃	197	1,773	2″	440
	No. 3	〃	197	1,773	2″	440
	No. 4	〃	197	1,773	2″	440
	No. 5	〃	197	1,773	2″	440
	No. 6	〃	197	1,773	2″	440
	No. 7	〃	210	1,890	2″	440
小計		—	1,402	12,618	2″	3,080
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	471	4,239		—
小計		—	471	4,239		—
總計		—	1,873	16,857	2″	3,080

冷藏庫略圖：——

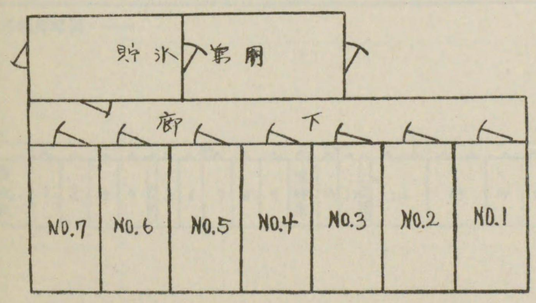

建物概要

外部建築材料		煉瓦及木造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		500.00
建物延坪	總延坪	70.15Ⓐ
	冷藏室	53.85
	凍結室	—
	準備室廊下	16.30
	機械室	89.60Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚
	量(噸)	85
	温度	15°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	90Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	14
	氣筒 行程(吋)	28
	回轉數	70
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	125
補機	冷却水喞筒	ウオシントンピストン
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎18段8列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″ 抗火石2寸	C.D. 8寸	C.B. 4″ 抗火石2寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ冷藏室、準備室ノミ
Ⓑ製氷釜用

冷藏庫 30

函館市仲濱通冷藏庫

總容積 107,640 | 凍結量 7.0
收容量 556 | 冷凍力 60.0

所在	函館市仲濱通三番地
所有者氏名	小熊倉庫株式會社
所有者住所	函館市仲濱通三番地
竣工年月	大年十四年五月
設計者	矢野製氷冷藏工業所
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	20°F	538	4,842	2″	720
	No. 2	〃	615	5,534	2″	720
	No. 3	〃	615	5,534	2″	720
	No. 4	〃	516	4,645	2″	720
	No. 5	〃	406	3,250	2″	490
	No. 6	5°F	450	3,601	2″	900
	No. 7	15°F	615	5,534	2″	900
	No. 8	〃	615	5,534	2″	900
	No. 9	〃	615	5,534	2″	900
	No.10	20°F	406	3,250	2″	900
	No.11	〃	373	2,987	2″	420
	No.12	〃	1,141	10,277	2″	1,140
	No.13	〃	1,163	10,475	2″	1,140
	No.14	25°F	736	6,621	2″	720
	No.15	〃	593	5,336	2″	615
小計		—	9,397	82,954	2″	11,905
凍結室	No. 1	-20°F	537	4,740	2″	450
					1¼″	7,095
小計		—	537	4,740	2″	450
					1¼″	7,095
準備室廊下	No. 1	30°F	484	4,354	2″	209
	No. 2	〃	956	8,606	2″	450
	No. 3	〃	776	6,986	2″	300
小計		—	2,216	19,946	2″	959
總計		—	12,150	107,640	1¼″	7,095
					2″	13,314

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料	鐵筋混凝土
建物階數	地下室
敷地坪數	499.00
建物延坪 總延坪	392.95Ⓐ
建物延坪 冷藏室	292.125
建物延坪 凍結室	17.875
建物延坪 準備室廊下	82.95
建物延坪 機械室	53.15Ⓑ
建物延坪 附屬室	31.20Ⓑ
建物延坪 其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
冷藏	量(噸)	556
冷藏	溫度	20°—35°B
凍結	凍結量(一日噸)	7.0
凍結	溫度	-10°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
冷凍機械	製作者	ヨーク會社
冷凍機械	冷凍力(噸)	40
冷凍機械	臺數	1+1Ⓑ
冷凍機械 氣筒	數	2
冷凍機械 氣筒	直徑(吋)	10
冷凍機械 氣筒	行程(吋)	10
冷凍機械	回轉數	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
主動原機	馬力	60
補機	冷却水唧筒	三聯成複働
補機	ブライン唧筒	—
補機	ブラインクーラー	—
補機	コンデンサー	D.P.17呎16段3列
冷却樣式		NH_3 直接膨脹
凍結樣式		同上空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″	C.B. 3″	C.B. 2″
凍結室	C.B. 8″	C.B. 5″	C.B. 5″
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ機械室附屬室ヲ含マズ
Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 31

横須賀市旭町冷藏庫

總容積	6,598
收容量	40.0
凍結量	—
冷凍力	7

所在	横須賀市旭町十五番地
所有者氏名	小林與兵衞
所有者住所	横須賀市樋ヶ浦町五十七番地
竣工年月	大正十四年三月
設計者	高田商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	13°F	219	2,402	1¼″	1,800
	No. 2	8°F	219	2,402	1¼″	750
小計		—	438	4,804	1¼″	2,550
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	50°F	162	1,794	1¼″	130
小計		—	162	1,794	1¼″	130
總計		—	600	6,598	1¼″	2 680

冷藏庫略圖：——

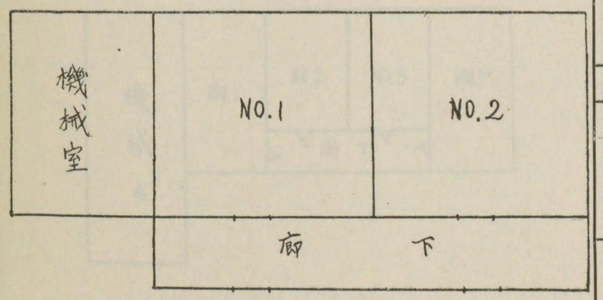

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土ブロック
建延階數		平家
敷地坪數		45.0
建物延坪	總延坪	22.87Ⓐ
	冷藏室	17.10
	凍結室	—
	準備室廊下	5.77
	機械室	5.73Ⓑ
	附屬室	鹹水槽其他11.25Ⓑ
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	40.0
	温度	15°—20°
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	9.0Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	5½
	氣筒 行程(吋)	5½
	回轉數	270
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	15
補機	冷却水唧筒	2″井ノ口唧筒
	ブライン唧筒	同上
	ブラインクーラー	製氷槽兼用
	コンデンサー	D.P.20呎12段
冷却様式		NH_3 ブライン循環
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4寸 C.B. 2″	C.D. 6寸 C.B. 2″	C.B. 2″ ブロック8寸
凍結室	—	— —	— —
準備室廊下	C.B. 1″	C.D. 6寸 C.B. 2″	ブロック8寸

備考 Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 32

高知縣須崎町冷藏庫

總容積	10,727	凍結量	—
收容量	63	冷凍力	9

所在	高知縣須崎町須崎字磯崎一五四九番地
所有者氏名	土佐製氷冷藏株式會社
所有者住所	高知市下知三ツ頭四三〇番地
竣工年月	大正十四年三月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	283.6	2,751	2″	528
	No. 2	〃	209.7	1,950	2″	384
	No. 3	〃	209.7	1,950	2″	384
	No. 4	〃	283.6	2,751	2″	528
小計		—	986.6	9,402	2″	1,824
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	142.5	1,325.4		—
小計		—	142.5	1,325.4		—
總計		—	1,129.1	10,727.4	2″	1,824

冷藏庫略圖：——

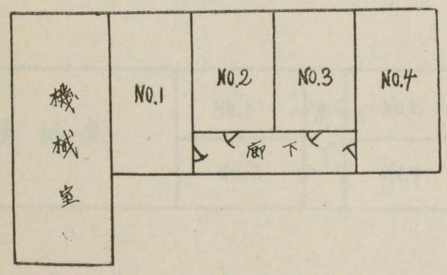

建物概要

外部建築材料		煉瓦造、機室木造
建延階數		階上製氷室
敷地坪數		398.457
建物延坪	總延坪	40.50Ⓐ
	冷藏室	40.50
	凍結室	—
	準備室廊下	—
	機械室	37.275Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚
	量(噸)	63
	温度	18°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	30Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	18
	回轉數	90
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	40
補機	冷却水唧筒	三聯成ピストン
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段3列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″	C.D. 8寸	C.B. 4″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ製氷籠用ヲ含マズ
Ⓑ製氷籠用
天井ハ製氷籠用

冷藏庫 33

豐橋市花田冷藏庫

總容積 6,323　凍結量 —
收容量 42.0　冷凍力 10.0

所在	愛知縣豊橋市大字花田字池田六番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十四年三月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No 1	15°F	193.5	1,451.5	2″	360
	No. 2	〃	147.0	1,102.5	2″	300
	No 3	〃	193.5	1,451.5	2″	360
	No. 4	〃	147.0	1,102.5	2″	300
小計		—	681.0	5,108.0	2″	1,320
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	135.0	1,215.0		—
小計		—	135.0	1,215.0		—
總計		—	816.0	6,323.0	2″	1,320

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		1,070.00
建物延坪	總延坪	32.31Ⓐ
	冷藏室	27.53
	凍結室	—
	準備室廊下	4.78
	機械室	56.28Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	42.0
	温度	18°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	22.5Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	150
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	35
補機	冷却水唧筒	三聯成ポンプ
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段3列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″ 抗火石4寸	C.D. 6寸	C.B. 8″ 抗火石3寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷兼用
床ニハシンダー8寸ヲ敷ク

冷藏庫 34

京都府伏見町冷藏庫

總容積	10,295	凍結量	—
收容量	62	冷凍力	10

所在	京都府紀伊郡伏見町字新大黒七〇八番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十四年三月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	266.2	2,875.0	2″	648
	No. 2	〃	280.7	3,031.6	2″	648
	No. 3	〃	227.1	2,452.7	2″	576
小計		—	774	8,359.3	2″	1,872
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	171.0	1,936.0		—
小計			171.0	1,936.0		—
總計		—	945	10,295.3	2″	1,872

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		煉瓦鐵筋混凝土
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		299.20
建物延坪	總延坪	36.50Ⓐ
	冷藏室	28.73
	凍結室	—
	準備室廊下	7.67
	機械室	45.00Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	62.0
	温度	18°—36°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	40Ⓑ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	10
	氣筒 行程(吋)	20
	回轉數	90
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	50
補機	冷却水唧筒	竪型ピストン
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段5列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″ 抗火石3寸	C.D 5寸	C.B. 2″ 抗火石3寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷彙用
機械室ニハ凝縮器室ヲ含ム

冷藏庫 35

島根縣濱田町冷藏庫

總容積	9,736	凍結量	—
收容量	52	冷凍力	15

所在	島根縣濱田町大字原井七九四番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一番地
竣工年月	大正十五年六月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	172	1,236	2″ 240
	No. 2	〃	291	2,130	2″ 420
	No. 3	〃	291	2,544	2″ 510
	No. 4	〃	143	950	2″ 196
小計		—	897	6,860	2″ 1,366
凍結室					
小計					
準備室廊下	廊下、階上	—	186	1,280	—
	階下	—	216	1,596	
小計		—	402	2,876	—
總計		—	1,299	9,736	2″ 1,366

冷藏庫略圖：——

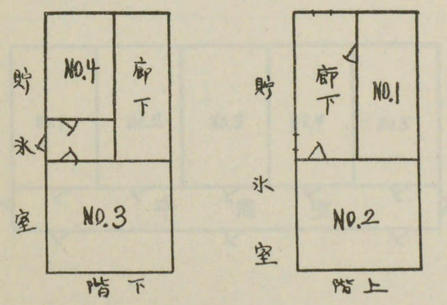

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		二階
總敷坪數		214
建物延坪	總延坪	70.73
	冷藏室	49.76
	凍結室	—
	準備室廊下	—
	機械室	20.97
	附屬室	—
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	52
	温度	20°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3横置複働
	製作者	バルカン會社
	冷凍力(噸)	15
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	8
	氣筒 行程(吋)	12
	回轉數	112
主動原機	種類	三交、誘、電動機
	馬力	30
補機	冷却水喞筒	渦巻喞筒
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎16段2列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″	C.B. 5寸	C.B. 4″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	S.D. 4寸	S.D. 5寸	C.B. 2″

備考

冷藏庫 36

宮城縣鹽釜町冷藏庫

總容積	15,815	凍結量	—
收容量	78.0	冷凍力	20

所在	宮城縣宮城郡鹽釜町字臺六七番地ノ一〇
所有者氏名	鹽釜港製氷株式會社
所有者住所	宮城縣宮城郡鹽釜町字臺六七番地ノ一〇
竣工年月	大正十四年五月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室名細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	245	2,360	2″	616
	No. 2	〃	250	2,400	2″	616
	No. 3	〃	247	2,380	2″	616
	No. 4	〃	248	2,372	2″	616
	No. 5	〃	247	2,362	2″	616
小計			1,237	11,874	2″	3,080
凍結室						
小計						
廊下	廊下	—	395	3,941		—
小計			395	3,941		—
總計		—	1,632	15,815	2″	3,080

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		石造
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		242.00
建物延坪	總延坪	57.40
	冷藏室	44.10
	凍結室	—
	準備室廊下	13.40
	機械室	Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	78.0
	温度	17°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	70Ⓐ
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	13
	氣筒 行程(吋)	26
	回轉數	76
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	120
補機	冷却水唧筒	複働ピストン
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段8列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″	C.B.0.8尺	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 37

靜岡市東町冷藏庫

總容積 121,165 | 凍結量 —
收容量 74 | 冷凍力 10

所在	靜岡市東町十五番地
所有者氏名	靜岡製氷冷藏株式會社
所有者住所	靜岡市東町十五番地
竣工年月	大正十四年六月
設計者	—
工事施行者	—

各室明細

室名稱		最抵保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	250	2,165	2″	525
	No. 2	〃	312	2,650	2″	442
	No. 3	〃	312	3,120	2″	540
	No. 4	〃	312	3,120	2″	540
小計		—	1,186	11,055	2″	2,047
凍結室						
小計		—	—	—		—
準備室廊下	廊下	一部階段	127.5	1,110		—
小計		—	127.5	1,110		—
總計		—	1,313.5	12,165	2″	2,047

冷藏庫略圖：——

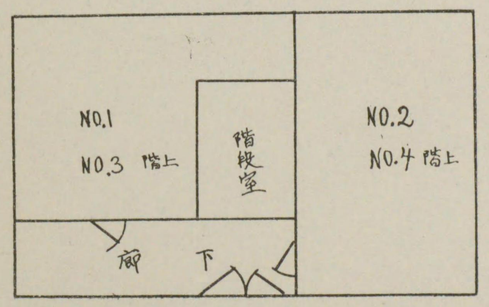

建物概要

外部建築材料		木骨外壁石造
建物階數		二階
敷地坪數		545.5
建物延坪	總延坪	57.42
	冷藏室	43.00
	凍結室	—
	準備室廊下	14.42
	機械室	Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	74
	溫度	18°—20°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	アークチツク會社
	冷凍力(噸)	10
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$6^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$6^1/_2$
	回轉數	190
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水唧筒	渦巻唧筒
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.10呎12段2列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 7寸	C.B. 6寸	C.B. 2″ C.D. 4寸
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ製氷兼用

56
72

大正十四年度
奨勵冷藏庫

冷藏庫 38

東京市明石町冷藏庫

總容積 140,795 | 凍結量 —
收容量 410 | 冷凍力 60

所在	東京市京橋區明石町一二番地
所有者氏名	帝國冷藏株式會社
所有者住所	東京市日本橋區本船町二番地
竣工年月	大正十五年二月
設計者	所有者
工事施行者	大倉商事會社

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	上階 No. 1	28°F	514	7,939	1¼″	918
	No. 2	23°F	994	15,345	2″	2,088
	No. 3	28°F	514	7,985	1¼″	555
	No. 4	23°F	994	15,434	2″	190
	No. 5	28°F	514	7,916	2′	2,088
	No. 6	23°F	994	15,202	1¼″	918
	No. 7	25°F	520	6,610	2″	2,088
	下階 No. 8	5°F	990	13,870	1¼″	1,224
	No. 9	23°F	520	6,610	2″	5,724
	No.10	5°F	990	13,870	1¼″	1,224
	No.11	23°F	520	6,610	2″	5,724
	No.12	15°F	990	13,870	1¼″	1,224
小計		—	9,054	131,261	2″	2,916
					1¼″	6,063
					2″	20,818
準備室廊下	廊下、階上	—	343	5,007		—
	廊下、階下	—	344	4,527		—
小計		—	687	9,534		—
總計		—	9,741	140,795	1¼″	6,063
					2″	20,818

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		二階
敷地坪數		865.3
建物延坪	總延坪	310.00
	冷藏室	310.0
	凍結室	—
	準備室廊下	—
	機械室	129.68Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	410
	温度	5°—28°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	60
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	12
	氣筒 行程(吋)	24
	氣筒 回轉數	90
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	100
補機	冷却水喞筒	ウオシントン三聯式
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.20呎12段6列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	S.B. 5″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 5″	C.B. 6″	C.B. 5″

備考 Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 39

靜岡縣綱代町冷藏庫

總容積	7,786	凍結量	—
收容量	37	冷凍力	6

所在	靜岡縣田方郡綱代町四八三番地ノ一
所在者氏名	綱代製氷株式會社
所有者住所	靜岡縣田方郡綱代町
竣工年月	大正十四年六月
設計者	—
工事施行者	—

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	322	3,550	1¼″	1,100
	No. 2	15°F	322	3,550	1¼″	1,100
小計		—	644	7,100	1¼″	2,200
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	38°F	98	686		—
小計		—	98	686		—
總計		—	742	7,786	1¼″	2,200

冷藏庫略圖：——

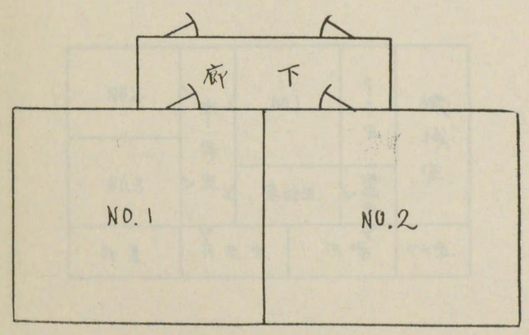

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		177.00
建物延坪	總延坪	52.70
	冷藏室	21.00
	凍結室	—
	準備室廊下	3.50
	機械室	28.20Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚
	量(噸)	37
	温度	25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	6
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	4¼
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	180
主動原機	種類	三交、誘、電動機
	馬力	12
補機	冷却水唧筒	ウオシントン横置
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.18呎8段
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″ S.D. 1尺	C.B. 2″ S.D. 1尺	C.B. 4″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 40

三重縣尾鷲町冷藏庫

總容積 11,179 | 凍結量 2.85
收容量 48 | 冷凍力 10

所在	三重縣北牟婁郡尾鷲町大字南浦四一一番地
所有者氏名	株式會社尾鷲冷藏庫
所有者住所	三重縣尾鷲町大字南浦四一一一番地ノ一六
竣工年月	大正十四年十月
設計者	—
工事施行者	—

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	10°F	314.5	2,830	1¼″	480
	No. 2	〃	228.0	2,052	1¼″	360
	No. 3	〃	228.0	2,052	1¼″	360
小計		—	770.5	6,934	1¼″	1,200
凍結室	No. 1	-20°F	141	1,269	1¼″	1,890
小計		—	141	1,269	1¼″	1,890
準備室廊下	No. 1	30°F	268.84	2,419.5	1¼″	208
	No. 2	30°F	68.8	557.2	1¼″	112
小計		—	337.64	2,976.7	1¼″	320
總計		—	1,249.14	11,179.7	1¼″	3,410

冷藏庫略圖：——

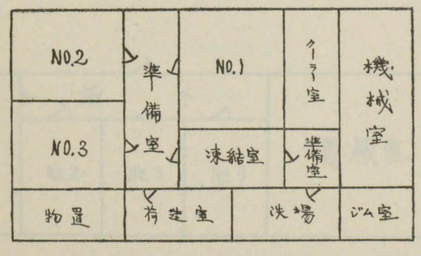

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		180
建物延坪	總延坪	71.5
	冷藏室	24.9
	凍結室	5.1
	準備室廊下	10.05
	機械室	10.00
	附屬室	洗場其他 16.50
	クーラー室	4.95

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚
	量(噸)	48
	温度	15°F
凍結	凍結量(一日噸)	2.85
	温度	—5°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	フリツク會社
	冷凍力(噸)	10
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	6
	氣筒 行程(吋)	6
	回轉數	250
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水喞筒	渦卷2″×1臺
	ブライン喞筒	タービン2½1臺
	ブラインクーラー	セルチユーブ1臺
	コンデンサー	D.P.20呎8段
冷却様式		ブライン循環
凍結様式		同上空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B 4″ S.D. 4寸	C.B. 2″ S.D. 1尺	C.B. 4″
凍結室	C.B. 6″ S.D. 4寸	C.B. 2″ S.D. 1尺	C.B. 6″
準備室廊下	C.B. 4″ S.D. 4寸	C.B. 2″ S.D. 1尺	C.B. 4″

備考

冷藏庫 41

三重縣鳥羽町冷藏庫

總容積 10,965 | 凍結量 —
收容量 67 | 冷凍力 15

所在	三重縣鳥羽町大字鳥羽一〇五三番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄉業平町一七一番地
竣工年月	大正十四年十月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	271.5	2,796	2″ 774
	No. 2	〃	184.4	1,899	2″ 406
	No. 3	〃	184.4	1,899	2″ 406
	No. 4	〃	176.8	1,821	2″ 406
小計		—	817.1	8,415	2″ 1,992
凍結室					
小計					
準備室廊下	廊下	—	247.5	2,550	—
小計		—	247.5	2,550	—
總計		—	1,064.6	10,965	2″ 1,992

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料	鐵骨鐵筋煉瓦造
建物階數	機械室二階建
敷地坪數	341.00
建物延坪 總延坪	90.00
冷藏室	32.06
凍結室	—
準備室廊下	8.44
機械室	49.5Ⓐ
附屬室	Ⓐ
其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	67
	温度	17°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	15
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$7^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$7^1/_2$
	回轉數	150
主原動機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水喞筒	グーズ複働横置
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段2列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″	C.D. 8寸	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ製氷兼用、凝縮器室ヲ含ム
上記ノ外防熱ニ抗火石2寸ヲ周壁、床ニ用ヲ

冷藏庫 42

金澤市田丸町冷藏庫

總容積	12,977	凍結量	—
收容量	84	冷凍力	13.0

所在	金澤市田丸町五九番地
所有者氏名	越桐與兵衛
所有者住所	金澤市田丸町五五番地
竣工年月	大正十四年十一月
設計者	鈴木商店
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	217	2,930	1¼″	825
	No. 2	〃	218	2,940	1¼″	825
	No. 3	〃	332	4,480	1¼″	1,287
	No. 4	〃	111	880	1¼″	160
小計		—	878	11,230	1¼″	3,097
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	72	970		—
		—	111	777		—
小計		—	183	1,747		—
總計		—	1,061	12,977	1¼″	3,097

冷藏庫略圖：——

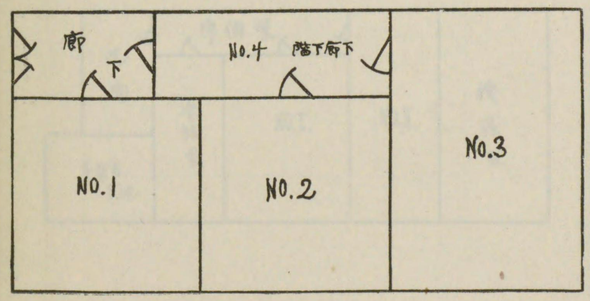

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		平家
敷地坪數		
建物延坪	總延坪	35.67Ⓐ
	冷藏室	29.00
	凍結室	—
	準備室廊下	6.67
	機械室	7.00
	附屬室	—
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚
	量(噸)	84
	溫度	20°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ブラウンスウイツク會社
	冷凍力(噸)	13
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	6
	氣筒 行程(吋)	5¾
	回轉數	200
主動原機	種類	三、交、誘、電働機
	馬力	20
補機	冷却水唧筒	積置複働
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.20呎9段2列
冷却様式		NH^3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	S.B. 6″	C.B. 4″ S.D. 1尺	C.B. 4″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ機械室ヲ含マズ

冷藏庫 43

青森縣小中野町冷藏庫

總容積 16,605　凍結量 4.4
收容量 114　冷凍力 22

所在	青森縣三戸郡小中野町字北横町九番地
所有者氏名	三陸水產冷藏株式會社
所有者住所	盛岡市紺屋町二七番戸
竣工年月	大正十四年十一月
設計者	所有者
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	510	5,967	1 1/2″	1,264
	No. 2Ⓐ	10°F	455	5,330	1 1/2″	1,350
小計		—	965	11,297	1 1/2″	2,614
凍結室	No. 1	-8°F	265	3,100	1 1/2″	2,766
小計		—	265	3,100	1 1/2″	2,766
準備室廊下	準備室	25°F	194	2,208	1 1/2″	253
小計		—	194	2,208	1 1/2″	253
總計		—	1,424	16,605	1 1/2″	5,633

冷藏庫略圖；——



建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家(事務室二階)
敷地坪數		250.0
建物延坪	總延坪	86.00
	冷藏室	31.625Ⓐ
	凍結室	9.5
	準備室廊下	6.875
	機械室	18.0Ⓐ
	附屬室	洗場7.0
	其ノ他	事務室 13.0

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚、	凍魚
	量(噸)	53	61
	温度	25°	10°F
凍結	凍結量(一日噸)	4.4	
	温度	5°F	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型	
	製作者	フリック會社	
	冷凍力(噸)	9	13
	臺數	1	1
	氣筒 數	2	2
	氣筒 直徑(吋)	6	7
	氣筒 行程(吋)	6	7
	回轉數	220	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機	
	馬力	20	25
補機	冷却水喞筒	渦卷喞筒	
	ブライン喞筒	—	
	ブラインクーラー	—	
	コンデンサー	D.P.20呎12段2列	
冷却様式		NH_3 直接膨脹	
凍結様式		同上空氣凍結	

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″ S.D. 5寸	C.B. 2″ S.D. 1尺	C.B. 3″ 木炭3.5寸
凍結室	C.B. 3″ S.D. 5寸	C.B. 2″ S.D. 1尺	C.B. 4″ 木炭3.5寸
準備室廊下	S.D. 6寸	S.D. 1尺	C.B. 2″

備考　Ⓐ增設變更後ノモノ

冷藏庫 44

和歌山縣田邊町冷藏庫

總容積 20,639 | 凍結量 —
收容量 133 | 冷凍力 15

所在	和歌山縣西牟婁郡田邊町大字江川町三三〇ノ七九
所有者氏名	田邊製氷冷藏株式會社
所有者住所	和歌山縣西牟婁郡田邊町大字江川町三三〇ノ七九
竣工年月	大正十五年五月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	292.6	4,301.2	2″	742
	No. 2	〃	299.2	4,398.2	2″	742
	No. 3	〃	299.2	4,398.2	2″	742
	No. 4	〃	292.6	4,301.2	2″	742
小計		—	1,183.6	17,398.8	2″	2,968
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	393.36	3,240.24		—
小計		—	393.36	3,240.24		—
總計		—	1,576.96	20,639.04	2″	2,968

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		平家
敷地坪數		370.8
建物延坪	總延坪	51.66
	冷藏室	40.0
	凍結室	—
	準備室廊下	11.66
	機械室	Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	133
	温度	17°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—·
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	15
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$7^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$7^1/_2$
	回轉數	150
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	25
補機	冷却水喞筒	ピラミツド複働
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎×12段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.D. 7寸	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	抗火石2寸	—	抗火石2寸

備考 Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 45

和歌山縣太地町冷藏庫

總容積	2,337	凍結量	—
收容量	15	冷凍力	2

所在	和歌山縣東牟婁郡太地町太地美代坂三〇五九ノ五
所有者氏名	笏師千代市
所有者住所	和歌山縣太地町大字太地三三六三
竣工年月	大正十五年三月
設計者	英安商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	10°F	84.24	758.16	2″	300
	No. 2	〃	84.24	758.16	2″	300
小計		—	168.48	1,516.32	2″	600
凍結室						
小計						
準備室廊下	準備室	—	91.20	820.80		—
小計		—	91.20	820.80		—
總計		—	259.68	2,337.12	2″	600

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		45.00
建物延坪	總延坪	21.00
	冷藏室	6.00
	凍結室	—
	準備室廊下	3.40
	機械室	2.50
	附屬室	荷受室 9.10
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚
	量(噸)	15
	温度	25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	フクツク會社
	冷凍力(噸)	2
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	3
	氣筒 行程(吋)	3
	回轉數	300
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	3
補機	冷却水喞筒	渦卷喞筒
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	セルサブマーヂ式
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″	C.B. 4″ S.D. 1尺	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 4″ S.D. 4寸	C.B. 4″ S.D. 1尺	C.B. 4″

備考

冷藏庫 46

岡山市上石井冷藏庫

總容積	16,497	凍結量	—
收容量	95	冷凍力	14

所在	岡山縣岡山市上石井一〇番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄉業平町一七一番地
竣工年月	大正十五年三月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1(階下)	15°F	438.6	5,688.9	2″	1,120
	No. 2(階上)	〃	402.5	4,105.7	2″	1,120
	No. 3	〃	425.3	4,040.9	2″	1,680
小計		—	1,266.4	13,835.5	2″	3,920
凍結室						
小計						
準備室廊下	階上	—	114.6	1,089.2		—
	階下	—	143.7	1,572.7		—
小計			258.3	2,661.9		—
總計		—	1,524.7	16,497.4	2″	3,920

冷藏庫略圖：——

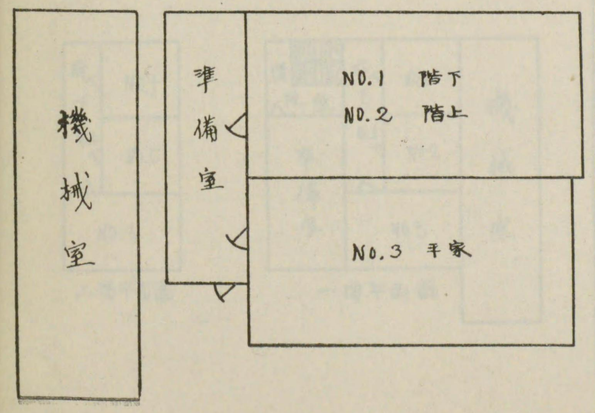

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家及二階建
敷地坪數		242.0
建物延坪	總延坪	65.01
	冷藏室	44.12
	凍結室	—
	準備室廊下	8.11
	機械室	12.78
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	95
	温度	17°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	30Ⓐ
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	170
主動原機	種類	三、交、誘、電働機
	馬力	40
補機	冷却水喞筒	複働三聯成喞筒
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段3列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 2″ C.D.4.5寸	C.D. 7寸	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.D.4.5寸	C.D 5寸	抗火石2寸

備考　Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 47

兵庫縣洲本町冷藏庫

總容積 12,858 | 凍結量 —
收容量 62 | 冷凍力 10

所在	兵庫縣洲本町船場町乙五七二番地
所有者氏名	谷安三郎
所有者住所	兵庫縣洲本町鹽屋七二番地
竣工年月	大正十五年六月
設計者	長谷川鐵工所
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	20°F	139	1,043	2″	240
	No. 2	〃	144	1,080	2″	240
	No. 3	〃	211	1,583	2″	376
	No. 4	〃	139	1,029	2″	240
	No. 5	〃	144	1,066	2″	240
	No. 6	〃	211	1,461	2″	376
小計		—	988	7,262	2″	1,712
凍結室						
小計						
準備室廊下	準備室	35°F	330	3,630	2″	370
	廊下No.1	〃	131	983	2″	100
	〃 No.2	〃	131	983	2″	100
小計		—	592	5,596	2″	570
總計		—	1,580	12,858	2″	2,282

冷藏庫略圖：——

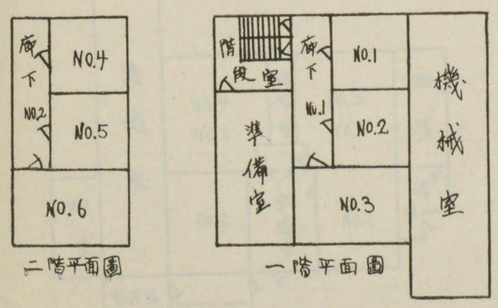

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		二階
敷地坪數		60
建物延坪	總延坪	74.8
	冷藏室	32.84
	凍結室	—
	準備室廊下	19.95
	機械室	17.32
	附屬室	階段室4.69
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚
	量(噸)	62
	温度	20°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 複働横置
	製作者	長谷川鐵工所
	冷凍力(噸)	10
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	6
	氣筒 行程(吋)	12
	回轉數	150
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水喞筒	横置複働
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6寸	C.D. 3.5寸 S.D. 5寸	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	

備考

冷藏庫 48

桐生市末廣町冷藏庫

總容積 14,518 | 凍結量 —
收容量 72.5 | 冷凍力 11

所在	桐生市末廣町一一三八番地
所有者氏名	小林秀內
所有者住所	桐生市末廣町一一三八番地
竣工年月	大正十五年五月
設計者	東邦商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	30°F	151	1,087	1¼″	311.2
	No. 2	30°F	148	1,051	1¼″	311.2
	No. 3	30°F	285	2,708	2″	582
	No. 4	15°F	264	2,508	2″	513
	No. 5	15°F	292	2,599	2″	467.2
	No. 6	15°F	294	2,617	2″	544.9
小計		—	1,434	12,570	1¼″ 2″	622.4 2,107.1
凍結室						
小計						
準備室廊下	No.1	—	168	1,310		—
	No.2	—	82	638		—
小計		—	250	1,948		—
總計		—	1,684	14,518	1¼″ 2″	622.4 2,107.1

冷藏庫略圖；——

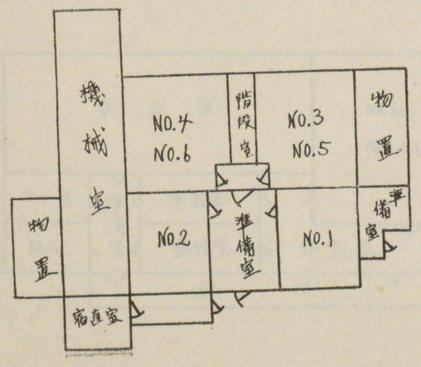

建物概要

外部建築材料		石造及木造
建物階數		階上一部製氷室
敷地坪數		305.00
建物延坪	總延坪	78.01
	冷藏室	52.9
	凍結室	—
	準備室廊下	10.45
	機械室	14.66Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚	乾魚	鹽魚
	量(噸)	50	13	9.5
	温度	20°F	30°F-36°F	
凍結	凍結量(一日噸)	—		
	温度	—		

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	アークチツク會社
	冷凍力(噸)	11
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	6½
	氣筒 行程(吋)	6½
	回轉數	190
主機原動	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水喞筒	タービン喞筒
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 4″	C.B. 4″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考 Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 49

青森縣湊町冷藏庫

總容積 19,338　凍結量 6.2
收容量 113　冷凍力 14

所在	青森縣三戸郡湊町大字濱通字三嶋下二三
所有者氏名	八戸製氷株式會社
所有者住所	青森縣三戸郡湊町大字濱通字三島下二三
竣工年月	大正十五年五月
設計者	英安商會
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	10°F	94.1	866	2″	151
	No. 2	0°F	684.7	6,025	2″	1,731
	No. 3	〃	684.7	6,162	2″	1,800
小計		—	1,463.5	13,053	2″	3,682
凍結室	No. 1	-20°F	132.5	1,059	1¼″	2,929
	No. 2	〃	132.5	1,059	1¼″	2,929
小計		—	265	2,118	1¼″	5,858
準備室廊下	No. 1 作業室	10°F	137.7	1,267	2″	200
		〃	348	2,900	2″	403
					1¼″	165
小計		—	485.7	4,167	2″	603
					1¼″	165
總計		—	2,214.2	19,338	2″	4,285
					1¼″	6,023

冷藏庫略圖：——

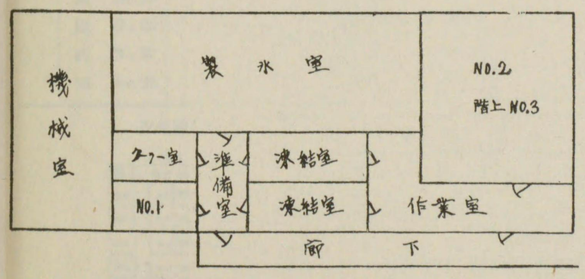

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		二階建
敷地坪數		532.0
建物延坪	總延坪	150.0Ⓑ
	冷藏室	48.75
	凍結室	10.5
	準備室	22.5
	機械室	19.5Ⓐ
	クーラー室	3.75
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚
	量(噸)	113
	温度	5°F
凍結	凍結量(一日噸)	6.2
	温度	0°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	フリツク會社
	冷凍力(噸)	24Ⓐ
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	40
補機	冷却水喞筒	ブランジヤ喞筒
	ブライン喞筒	渦巻喞筒
	ブラインクーラー	セルチューブ 26吋×10呎
	コンデンサー	D. P. 20呎10段2列
冷却様式		ブライン循環
凍結様式		同上空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 4″ C.D. 5寸	C.D. 1.2尺	C.B. 5″
凍結室	C.B. 5″ 叡穀 1.2尺	C.B. 6″ C.D. 5寸	C.B. 6″ 叡穀 1尺
準備室廊下	C.D. 1.2尺	C.B. 5″	C.B. 5″

備考 Ⓐ 製氷兼用
Ⓑ 製氷室廊下ヲ含マズ

冷藏庫 50

所
所有者氏
所有者住
竣工年
設計
工事施行

名

室名稱		最
冷藏室	一階 No. 1	
	同 No. 2	
	同 No. 3	
	同 No. 4	
	同 No. 5	
	同 No. 6	
	同 No. 7	
	同 No. 8	
	同 No. 9	
	同 No.10	
	同 No.11	
	同 No.12	
	同 No.13	
	同 No.14	
	同 No.15	
	二階 No.16	
	同 No.17	
	同 No.18	
	同 No.19	
	同 No.20	
	同 No.21	
	同 No.22	
	同 No.23	
	同 No.24	
	同 No.25	
	同 No.26	
	同 No.27	
	同 No.28	

冷藏庫



0.8
8

型
社

動機

喞筒

床
B. 6″
B. 8″
B. 6″

京都市中央卸賣市場冷藏庫

冷藏庫 50

所在	京都市下京區朱雀分木町
所有者氏名	京都市
所有者住所	京都市中京區御池通河原町西入
竣工年月	大正十五年十月
設計者	所有者
工事施行者	東京物産株式會社

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	一階 No. 1	28°F	292.4	3,640.4	2″	378
	同 No. 2	〃	292.4	3,640.4		378
	同 No. 3	〃	286.4	3,565.7		378
	同 No. 4	20°F	277.2	3,451.1		675
	同 No. 5	〃	283.1	3,524.6		675
	同 No. 6	〃	283·1	3,524.6		675
	同 No. 7	〃	286.4	3,565.7		675
	同 No. 8	〃	277.2	3,451.1		675
	同 No. 9	〃	283.1	3,524.6		675
	同 No.10	〃	283.1	3,524.6		675
	同 No.11	〃	286.4	3,565.7		675
	同 No.12	〃	295.8	3,682.7		675
	同 No.13	〃	292.4	3,640.4		675
	同 No.14	〃	292.4	3,640.4		675
	同 No.15	〃	286.4	3,565 7		675
	二階 No.16	28°F	286.4	3,608.6		351
	同 No.17	〃	292.4	3,684.2		351
	同 No.18	〃	292.4	3,684.2		351
	同 No.19	〃	295.8	3,727.1		351
	同 No.20	〃	286.4	3,608.6		351
	同 No.21	〃	283.1	3,567.1		351
	同 No.22	〃	283.1	3,567.1		351
	同 No.23	〃	277.2	3,492.7		351
	同 No.24	〃	277.2	3,492.7		351
	同 No.25	〃	283.1	3,567.1		351
	同 No.26	〃	283.1	3,567.1		351
	同 No.27	〃	286.4	3,608.6		351
	同 No.28	〃	283 8	3,575.9		351
冷藏室	二階 No.29	28°F	280.5	3,534.3	2″	351
	同 No.30	〃	280.5	3,534.3		351
	同 No.31	〃	481.8	6,070.7		567
	三階 No.32	〃	286.4	3,537.0		351
	同 No.33	〃	292.4	3,610.2		351
	同 No.34	〃	292.4	3,610.2		351
	同 No.35	〃	295.8	3,653.1		351
	同 No.36	〃	286.4	3,537.0		351
	同 No.37	〃	283.1	3,496.3		351
	同 No.38	〃	283.1	3,496.3		351
	同 No.39	〃	277.2	3,423.4		351
	同 No.40	〃	277.2	3,423.4		351
	同 No.41	〃	283.1	3,496.3		351
	同 No.42	〃	283.1	3,496.3		351
	同 No.43	〃	286.4	3,537.0		351
	同 No.44	〃	287.2	3,546.9		351
	同 No.45	〃	283.9	3,506.2		351
	同 No.46	〃	283.9	3,506.2		351
	同 No.47	〃	487.6	6,021.9		567
小計		—	13,820.2	172,295.7		20,898
廊下	一階 No. 1	50°F	814.8	10,551.7		120
	同 No. 2	〃	1,012.3	13,109.3		200
	同 No. 3	〃	814.8	10,551.7		120
	二階 No. 4	〃	814.8	10,510.9		120
	同 No. 5	〃	1,012.3	13,058.7		200
	同 No. 6	〃	814.8	10,510.9		120
	三階 No. 7	〃	814.8	10,266.5		120
	同 No. 8	〃	1,012.3	12,755.0		200
	同 No. 9	〃	814.8	10,266.5		120
小計			7,925.7	101,581.2		1,320
總計		—	21,745.9	273,876.9	2″	22,218

冷藏庫略圖：——



總容積 273,876 | 凍結量 —
收容量 859 | 冷凍力 100

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		三階建
敷地坪數		
建物延坪	總延坪	912Ⓐ
	冷藏室	435
	凍結室	—
	準備室廊下	222
	機械室	72Ⓑ
	附屬室	事務室 6 階段室18
	クーラー室	9
	製氷室其他	150

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚	鹽干魚	肉類
	量(噸)	273	379	25
	温度	25°F	35°F	35°F
	種類	卵	果實其他	
	量(噸)	126	56	
	温度	32°F	35°F	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類		NH_3 單働竪型
	製作者		フリツク會社
	冷凍力(噸)		40
	臺數		3Ⓑ
	氣筒	數	2
		直徑(吋)	10
		行程(吋)	10
	回轉數		200
主動原機	種類		三、交、誘、電動機
	馬力		75×3
補機	冷却水唧筒		タービン5″×2臺Ⓑ
	ブライン唧筒		タービン7″×2臺
	ブラインクーラー		セルチユーブ 42吋×13呎10吋
	コンデンサー		D.P.20呎12段4列
冷却様式			ブライン循還
凍結様式			—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 6″	C.B. 3″	

備考 Ⓐ製氷，貯氷室ヲ含ム
エレベーター室ヲ含マズ
Ⓑ内一臺製氷ト兼用

冷藏庫 51

神奈川縣三崎町冷藏庫

總容積	5,262	凍結量	0.8
收容量	37	冷凍力	8

所在	神奈川縣三浦郡三崎町字仲崎一七番地
所有者氏名	久野六松　外十二名
所有者住所	神奈川縣三浦郡三崎町字仲崎一八番地
竣工年月	大正十五年六月
設計者	英安商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持溫度	而積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	10°F	222.60	1,869.96	1¼″	685
	No. 2	10°F	212.26	1,772.33	1¼″	685
小計		—	434.86	3,642.29	1¼″	1,370
凍結室	No. 1	-20°F	79.30	713.00	1¼″	1,120
小計		—	79.30	713.00	1¼″	1,120
準備室廊下 準備室		30°F	106.74	907.29	1¼″	180
小計		—	106.74	907.29	1¼″	180
總計		—	620.90	5,262.58	1¼″	2,670

冷藏庫略圖：——

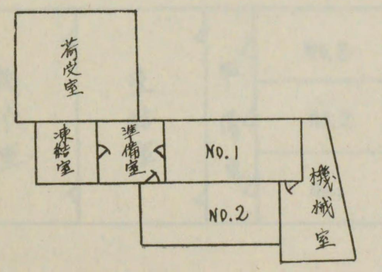

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		55.1
建物延坪	總延坪	36.542
	冷藏室	13.469
	凍結室	3.11
	準備室廊下	3.734
	機械室	5.729
	附屬室	(荷受室)10.5
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚
	量(噸)	37
	溫度	15°F
凍結	凍結量(一日噸)	0.8
	溫度	0°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	8.00
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	5½
	氣筒 行程(吋)	5½
	回轉數	250
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	15
補機	冷却水唧筒	プランジヤー唧筒
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.10呎10段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		同上空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″ C.D. 4寸	C.B. 2″ C.D. 4寸	C.B. 6″
凍結室	C.S. 5″ C.D. 5寸	C.D. 15″	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 3″ C.D. 4寸	C.B. 2″ C.D. 4寸	C.B. 6″

備考　凍結室ハ後ニ增設ス

冷藏庫 52

北海道色古丹島冷藏庫

總容積	12,744	凍結量	8
收容量	135	冷凍力	20

所在	北海道千島國色古丹島斜古丹村斜古丹
所有者氏名	東洋捕鯨株式會社
所有者住所	大阪市川口町一四番地乙地
竣工年月	大正十五年十月
設計者	矢野製氷冷藏工業所
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	10°F	291.6	3,207	2″	660
	No. 2	〃	292.8	3,222	2″	660
	No. 3	〃	291.6	3,207	2″	660
小計		—	876	9,636	2″	1,980
凍結室	—	—	—	—	$1^1/_4$″	2,160 (ブラインタンク内配管)
小計		—	—	—	$1^1/_4$″	2,160
準備室廊下	準備室	30°F	282.6	3,108	2″	640
小計		—	282.6	3,108	2″	640
總計		—	1,153.6	12,744	2″	2,620
					$1^1/_4$″	2,160

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		164.00
建物延坪	總延坪	80.00
	冷藏室	27.00
	凍結室	21.00
	準備室廊下	9.00
	機械室	23.00
	附屬室	

主要收容物

冷藏	種類	凍結鯨肉
	量(噸)	135
	温度	15°F
凍結	凍結量(一日噸)	8
	温度	-5°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働堅型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	10
	臺數	2
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$6^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$6^1/_2$
	回轉數	180
主動原機	種類	堅型不凝縮汽機
	馬力	20×2臺
補機	冷却水唧筒	横置複働ピストン
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.17.5呎14段2列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		ブライン間接凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D 4寸 C.B. 2″	C.D. 4″	C.B. 4″
凍結室			
準備室廊下	C.D. 4寸 C.B. 2″	C.D. 4″	C.B. 4″

備考

冷藏庫 53

熊本縣高瀨町冷藏庫

總容積	2,506	凍結量	—
收容量	16	冷凍力	3.8

所在	熊本縣玉名郡高瀨町高瀨一一五番地
所在者氏名	高瀨魚市場株式會社
所有者住所	熊本縣玉名郡高瀨町一一一二番地
竣工年月	大正十五年八月
設計者	東京物產株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最抵保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	20°F	110.11	770.04	1¼″	250
	No. 2	〃	140.39	980.13	1¼″	250
小計		—	250.5	1,750.17	1¼″	500
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	84.10	756.02		—
小計		—	84.10	756.02		—
總計		—	334.6	2,506.19	1¼″	500

冷藏庫略圖：——

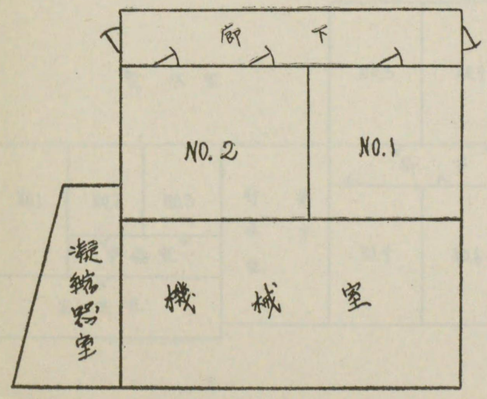

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		平家階上製氷室
敷地坪數		80.00
建物延坪	總延坪	34.40Ⓐ
	冷藏室	11.25
	凍結室	—
	準備室廊下	4.16
	機械室	15.99Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	16
	溫度	25°F內外
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	フリツク會社
	冷凍力(噸)	3.8
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	4
	氣筒 行程(吋)	4
	回轉數	300
主動原機	種類	三交、誘、電動機
	馬力	5
補機	冷却水喞筒	上水
	ブライン喞筒	タービン喞筒
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.10呎10段
冷却様式		ブライン循環
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″ C.D. 5寸	C.B. 4″	C.B. 4″
凍結室	—	—	—
準備室廊下		—	—

備考　Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
　　Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 54

明石市東仲之町冷藏庫

總容積 41,470 | 凍結量 5
收容量 199 | 冷凍力 40

所在	明石市東仲之町一丁目一〇七八番地
所有者氏名	播淡冷藏株式會社
所有者住所	明石市東仲之町一丁目一〇七八番地
竣工年月	大正十五年五月
設計者	株式會社長谷川鐵工所
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 2	20°F	206	2,267	2″	693
	No. 3	20°F	205	2,251	2″	679
	No. 4	25°F	386	6,946	2″	1,225
	No. 5	25°F	386	6,946	2″	1,241
	No. 6	25°F	404	7,276	2″	1,309
	No. 7	25°F	404	7,276	2″	1,301
小計		—	1,991	32,962	2″	6,448
凍結室	No. 1	—	292	2,920	2″	727
				凍結槽內配管	2″	2,818
小計		—	292	2,920	2″	3,545
準備室廊下	準備室	30°F	168	2,022	2″	265
	廊下	30°F	189	3,566	2″	306
小計		—	357	5,588	2″	571
總計		—	2,640	41,470	2″	10,564

冷藏庫略圖：——

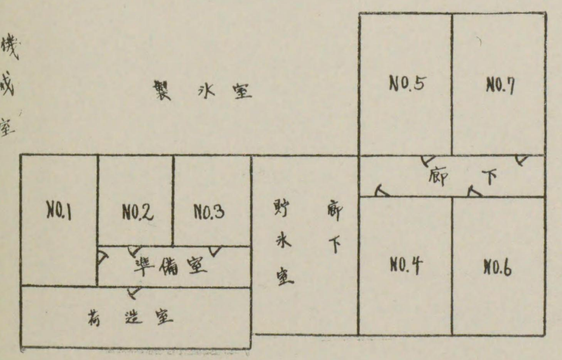

建物概要

外部建築材料		腰煉瓦木造
建物階數		平家
敷地坪數		434.00
建物延坪	總延坪	154.97
	冷藏室	69.97
	凍結室	10.83
	準備室廊下	14.67
	機械室	59·50Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚
	量(噸)	199
	温度	15°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	5
	温度	0°—10°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	長谷川鐵工所
	冷凍力(噸)	40
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	10
	氣筒 行程(吋)	20
	回轉數	80
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	75
補機	冷却水唧筒	複働三聯式
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	18呎12段4列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		ブラインフリーズ

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″ S.D. 5寸	C.B. 3″ S.D. 8寸	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ製氷兼用

大正十五年度

奨勵冷藏庫

冷藏庫 55

宇都宮市大町冷藏庫

總容積 5,054　凍結量 —
收容量 28　冷凍力 5

所在	宇都宮市大町八一番地
所有者氏名	株式會社山吉魚問屋
所有者住所	宇都宮市大町八一番地
竣工年月	大正十五年八月
設計者	中央冷凍工業所
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	219.6	2,196	1¼″	561.6
	No. 2	15°F	154.0	1,540	1¼″	401.8
小計		—	373.6	3,736	1¼″	963.4
凍結室						
小計						
準備室廊下	No. 1	30°F	131.8	1,318	1¼″	246.0
小計		—	131.8	1,318	1¼″	246.0
總計		—	505.4	5,054	1¼″	1,209.4

冷藏庫略圖：——

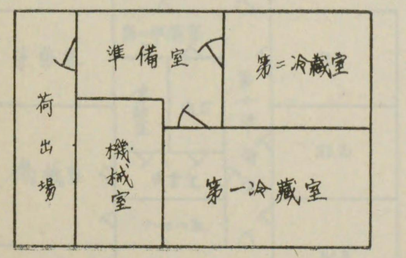

建物概要

外部建築材料		木造
建延階數		平家
敷地坪數		—
建物延坪	總延坪	24.0
	冷藏室	12.0
	凍結室	—
	準備室廊下	4.25
	機械室	3.75
	附屬室	4.00
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	28
	温度	28°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 竪型單働
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	5.0
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	5
	氣筒 行程(吋)	5
	回轉數	230
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	10
補機	冷却水唧筒	ピストンポンプ
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	17呎6段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 2″ C.D. 4寸	C.B. 2″ C.D. 5寸	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 1″ C.D. 4寸	C.B. 1″ C.D. 3寸	C.B. 4″

備考

冷藏庫 56

北海道根室町冷藏庫

総容積 27,486 | 凍結量 3
收容量 198 | 冷凍力 26.4

所在	北海道根室町字根室別二番地
所有者氏名	梅谷周造外六名
所有者住所	北海道根室町大字有磯町一丁目一番地
竣工年月	大正十五年十月
設計者	英安商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	20°F	401	4,010	2″	1,040
	No. 2	〃	401.5	4,015	2″	1,040
	No. 3	7°F	529	5,290	2″	1,040
	No. 4	〃	406	4,060	2″	912
	No. 5	〃	156.5	1,565	1¼″	672
小計		—	1,894	18,940	2″	4,032
					1¼″	672
凍結室	No. 1	-20°F	157	1,570	1¼″	2,688
小計		—	157	1,570	1¼″	2,688
準備室廊下	No. 1	20°F	166.6	1,666	2″	96
	No. 2	〃	363	3,630	2″	240
	作業室	〃	168	1,680	2″	96
小計		—	697.6	6,976	2″	432
總計		—	2,748.6	27,486	2″	4,464
					1¼″	3,360

冷藏庫略圖：——

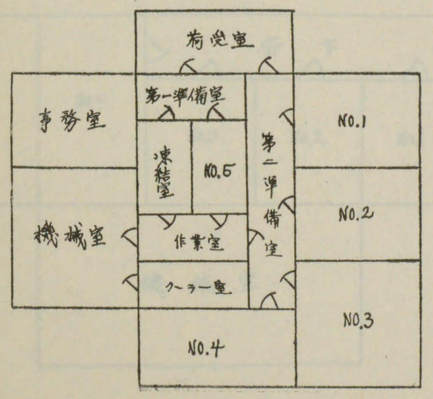

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		400.00
建物延坪	總延坪	130.00
	冷藏室	57.75
	凍結室	5.25
	準備室廊下	21.75
	機械室	23.25
	附屬室	12.5
	其ノ他	9.5

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚	魚類
	量(噸)	140	58
	温度	15°—25°F	
凍結	凍結量(一日噸)	3	
	温度	-10°F	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	26.4
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	9
	氣筒 行程(吋)	9
	回轉數	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	40
補機	冷却水喞筒	渦巻喞筒
	ブライン喞筒	タービン喞筒
	ブラインクーラー	シエルチユーブ 26吋×10呎
	コンデンサー	D.P.20呎10段2列
冷却様式		ブライン循環
凍結様式		同空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 5寸 C.B. 2″	C.B. 9½″	C.B. 6″
凍結室	C.D. 5寸 C.B. 4″	C.D. 12″	C.B. 8″
準備室廊下	C.D. 5寸	C.D. 5寸	C.B. 6寸

備考

冷藏庫 57

別府市東濱冷藏庫

總容積	9,042	凍結量	—
收容量	45	冷凍力	10

所在	大分縣別府市大字濱脇字東濱四〇七八番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄕業平町一七一番地
竣工年月	大正十五年八月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　社

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	121	1,367	2″	336
	No. 2	〃	124	1,420	2″	〃
	No. 3	〃	124	1,420	2″	〃
	No. 4	〃	193.5	2,253	2″	486
小計		—	562.5	6,460	2″	1,494
凍結室						
小計						
準備室廊下 廊下		—	235	2,582		—
小計		—	235	2,582		—
總計		—	797.5	9,042	2″	1,494

冷藏庫略圖：——

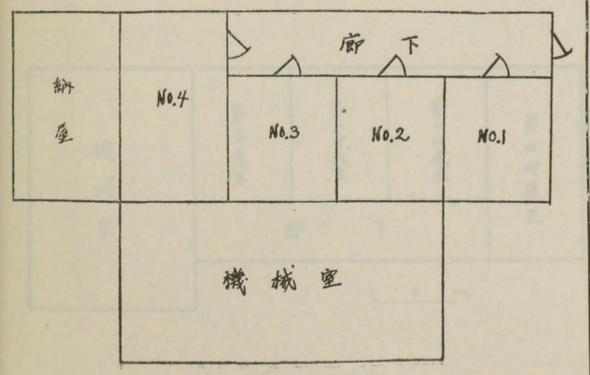

建物概要

外部建築材料	鐵筋混凝土
建延階數	階上製氷室
敷地坪數	162.6
建物延坪 總延坪	149.0
建物延坪 冷藏室	21.0
建物延坪 凍結室	—
建物延坪 準備室廊下	7.0
建物延坪 機械室	36.0Ⓐ
建物延坪 附屬室	7.0
建物延坪 其ノ他	78.0

主要收容物

冷藏	種類	魚類
冷藏	量(噸)	45
冷藏	温度	17°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
凍結	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
冷凍機械	製作者	ヨーク會社
冷凍機械	冷凍力(噸)	10
冷凍機械	臺數	1
冷凍機械 氣筒	數	2
冷凍機械 氣筒	直徑(吋)	6
冷凍機械 氣筒	行程(吋)	6
冷凍機械	回轉數	185
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
主動原機	馬力	25
補機	冷却水唧筒	グード横置複働
補機	ブライン唧筒	—
補機	ブラインクーラー	—
補機	コンデンサー	20呎12段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″	C.B. 5″	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 5″	C.B. 5″	抗火石2寸

備考　Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 58

千葉縣勝浦町冷藏庫

總容積	9,839
收容量	50
凍結量	—
冷凍力	8

所在	千葉縣夷隅郡勝浦町大字墨名字小家名八〇一番地
所有者氏名	勝浦製氷冷藏株式會社
所有者住所	千葉縣勝浦町大字墨名字小家名八〇一番地
竣工年月	大正十五年九月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　社

各室明細

室名稱		最抵保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	第一冷藏室	15°F	152	1,600	2″	396
	第二〃	〃	158	1,675	2″	396
	第三〃	〃	158	1,675	2″	396
	第四〃	〃	227	2,366	2″	600
小計		—	695	7,316	2″	1,788
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	232	2,523		—
小計		—	232	2,523		—
總計		—	927	9,839	2″	1,788

冷藏庫略圖：——

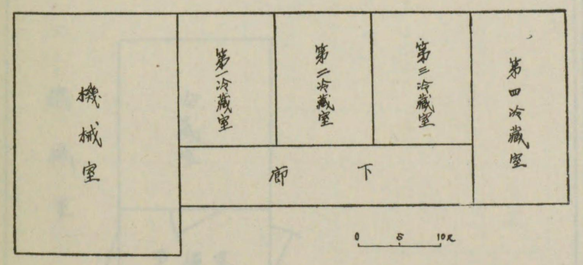

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		159.37
建物延坪	總延坪	31.46
	冷藏室	24.06
	凍結室	—
	準備室廊下	7.4
	機械室	Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚
	量(噸)	50
	溫度	17°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	8
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	6
	氣筒 行程(吋)	6
	回轉數	185
主動原機	種類	ベンツ重油機關
	馬力	70
補機	冷却水唧筒	グーズ複働横置
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎×12段
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″	C.D. 8″	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 2″	C D. 8″	C.B. 2″

備考　Ⓐ製氷彙用トス

冷藏庫 59

長崎市丸尾町冷藏庫

總容積	687	凍結量	—
收容量	3.3	冷凍力	0.76

所在	長崎市丸尾町長崎縣水產試驗場
所有者氏名	長崎縣
所有者住所	長崎市外浦町
竣工年月	大正十五年十一月
設計者	
工事施行者	

各室明細

室名稱		最低保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	47.36	383.6	1¼″ 270
小計		—	47.36	383.6	1¼″ 270
凍結室					
小計					
準備室廊下	準備室	—	37.5	303.7	—
小計			37.5	303.7	—
總計		—	84.86	687.3	1¼″ 270

冷藏庫略圖：——

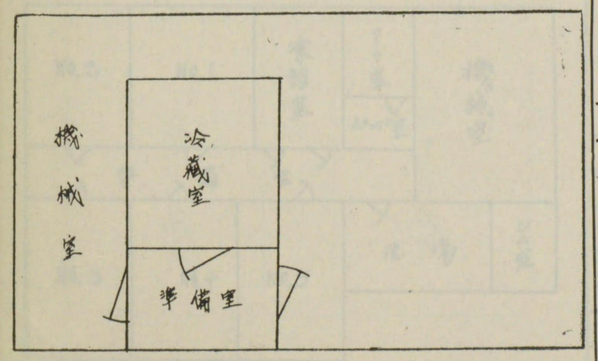

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		
建物延坪	總延坪	15.00
	冷藏室	2.00
	凍結室	—
	準備室廊下	1.25
	機械室	3.00
	附屬室	—
	其ノ他	8.75

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	3.3
	溫度	20°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	山陽鐵工所
	冷凍力(噸)	0.76
	臺數	1
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	3¼
	氣筒 行程(吋)	3
	回轉數	260
主動原機	種類	石油發動機
	馬力	6
補機	冷却水唧筒	ウオシントン型
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.10呎×2段
冷却樣式		NH_3直接膨脹
凍結樣式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B 5″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　試驗場構內ニ冷藏箱式ニ設置
セラレタルモノナリ

冷藏庫 60

福島縣小名濱町冷藏庫

總容積	29,912	凍結量	6
收容量	217	冷凍力	30

所在	福島縣石城郡小名濱町字元分二十二番地
所有者氏名	磐城水產工業株式會社
所有者住所	福島縣石城郡小名濱町字元分十五番地
竣工年月	大正十五年八月
設計者	中央冷凍工業所
工事施行者	同上

各室名細

室名稱		最抵保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	457.2	4,572	2″	750
	No. 2	〃	377.2	3,772	2″	670
	No. 3	〃	427.7	4,277	2″	731
	No. 4	〃	441.5	4,415	2″	734
	No. 5	〃	427.7	4,277	2″	734
小計		—	2,131.3	21,313	2″	3,622
					2″	505
凍結室	No. 1	−15°F	296.1	3,257	$1^1/_4$″	3,928
小計			296.1	3,257	2″	505
					$1^1/_4$″	3,928
廊下	No. 1	30°F	534.2	5,342	2″	534
小計			534.2	5,342	〃	534
總計		—	2,961.6	29,912	2″	4,661
					$1^1/_4$″	3,928

冷藏庫略圖：——

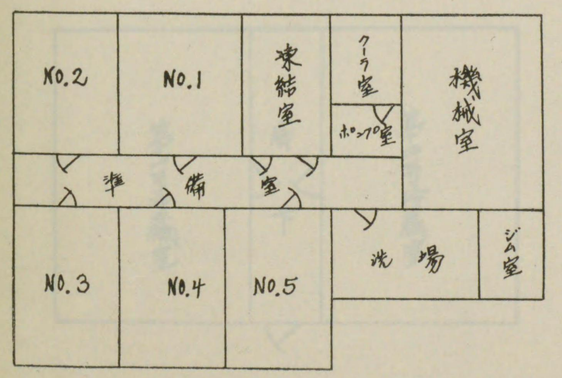

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		287.00
建物延坪	總延坪	155.5
	冷藏室	66.5
	凍結室	10.0
	準備室廊下	16.5
	機械室	22.0
	凝縮器室	5.5
	クーラー室	8.0
	洗場事務室	27.0

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚	魚類
	量(噸)	160	57
	溫度	20°	
凍結	凍結量(一日噸)	6	
	溫度	10°—0°F	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	15
	臺數	2
	氣筒數	2
	氣筒直徑(吋)	$7^1/_2$
	氣筒行程(吋)	$7^1/_2$
	回轉數	200
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	25×2
補機	冷却水唧筒	ウオシントン型2臺
	ブライン唧筒	タービン4″×2臺
	ブラインクーラー	42″×8呎
	コンデンサー	D.P.20呎10段4列
冷却樣式		ブライン循環
凍結樣式		NH_3 直接膨脹 空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″	C.D. 5寸 C.B. 2″	C.B. 5″
凍結室	C.B. 8″	C.D. 5寸 C.B. 5″	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 4″	C.D. 4寸 C.B. 1″	C.B. 4″

備考

冷藏庫 61

高知縣清水町冷藏庫

總容積 10,403 | 凍結量 —
收容量 53 | 冷凍力 20

所在	高知縣幡多郡清水町清水五一一番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄉業平町一七一番地
竣工年月	昭和二年一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　社

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	第一號冷室	15°F	355	4,508	2″ 930
	第二號冷室	〃	336	4,272	2″ 930
	小計	—	691	8,780	2″ 1,860
凍結室					
	小計				
準備室廊下	廊下	—	131	1,623	—
	小計	—	131	1,623	—
總計		—	822	10,403	2″ 1,860

冷藏庫略圖：——

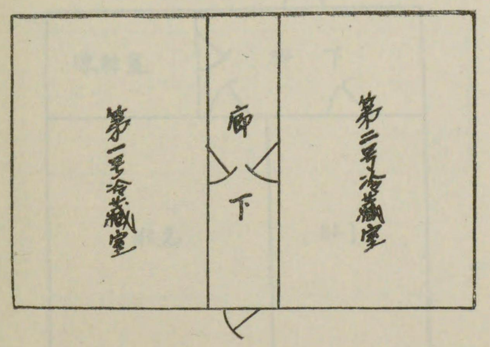

建物概要

外部建築材料		鐵筋凝混土
建物階數		平家
總敷坪數		396.64
建物延坪	總延坪	27.30
	冷藏室	23.10
	凍結室	—
	準備室廊下	4.20
	機械室	Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	53
	温度	20°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	20
	臺數	1
	氣筒數	2
	氣筒直徑(吋)	9
	氣筒行程(吋)	9
	回轉數	175
主動原機	種類	ラストン冷始動重油機關
	馬力	60
補機	冷却水唧筒	グーズ横置複働
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段3列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 7寸	C.D. 7寸	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.D. 4寸	C.D. 7寸	抗火石2寸

備考　Ⓐ製氷兼用トス

冷藏庫 62

靜岡縣田子村冷藏庫

總容積 10,774　凍結量 2.7
收容量 68　冷凍力 12.5

所在	靜岡縣田子村字姥浦一六二四ノ二
所有者氏名	田子製氷株式會社
所有者住所	靜岡縣賀茂郡田子村字姥浦
竣工年月	大正十五年十二月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　社

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	198	2,900	2″ 961
	No. 2	〃	311	4,572	2″ 1,416
小計		—	509	7,472	2″ 2,377
凍結室	No. 1	0°F	69	1,014	1¼″ 929
小計		—	69	1,014	1¼″ 929
準備室廊下	廊下	—	143	2,288	—
小計		—	143	2,288	—
總計		—	721	10,774	2″ 2,377 1¼″ 929

冷藏庫略圖：——

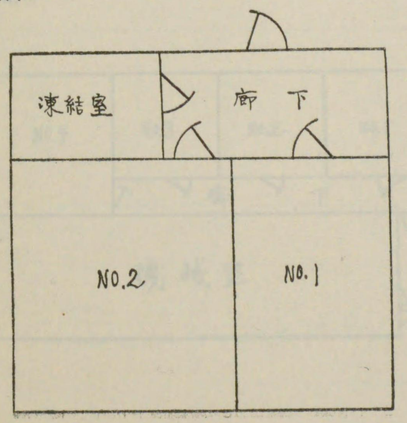

建物概要

外部建築材料		石造
建物階數		平家
敷地坪數		74.6
建物延坪	總延坪	40.51
	冷藏室	18.78
	凍結室	2.67
	準備室廊下	4.96
	機械室	14.10Ⓐ
	附屬室	
	其ノ他	

主要收容物

冷藏	種類	凍魚	干魚
	量(噸)	40	28
	温度	0°—25°F	
凍結	凍結量(一日噸)	2.7	
	温度	10°F	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	オリエント製氷機製造所
	冷凍力(噸)	12.5
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	7
	氣筒 行程(吋)	7
	回轉數	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水唧筒	横置複働ピストン
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.20呎18段
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		同空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.D. 1尺	C.B. 6″
凍結室	C.B. 6″	C.D. 1尺	C.B. 6″
準備室廊下	—	C.D. 1尺	2寸抗火石

備考　Ⓐ製氷兼用
凝縮器室ヲ含マズ

冷藏庫 63

香川縣多度津町冷藏庫

總容積	18,212	凍結量	—
收容量	104	冷凍力	20

所在	香川縣仲多度津郡多度津町大字多度津乙671番地
所有者氏名	多度津製氷冷藏株式會社
所有者住所	香川縣多度津町大字多度津乙六七一番地ノ七三
竣工年月	昭和二年十二月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	全社

各室明細

室名稱		最低保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	262.40	3,266.88	2″	741
	No. 2	〃	264.00	3,286.80	2″	741
	No. 3	〃	262.35	3,266.25	2″	741
	No. 4	〃	420.20	5,231.49	2″	1,180
小計		—	1,208.95	15,051.42	2″	3,403
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	—	246.95	3,160.9		—
小計		—	246.95	3,160.9		—
總計		—	1,455.90	18,212.32	2″	3,403

冷藏庫略圖：——

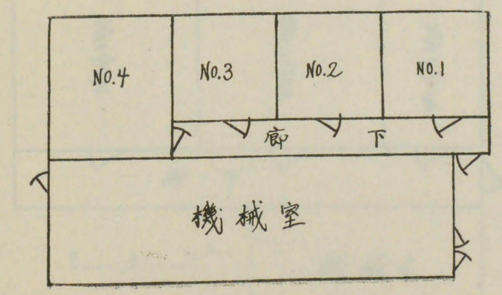

建物概要

外部建築材料		煉瓦鐵筋混凝土
建物階數		二階階上製氷室
敷地坪數		414.27
建物延坪	總延坪	106.00
	冷藏室	41.00
	凍結室	—
	準備室廊下	9.00
	機械室	56.00Ⓐ
	附屬室	—
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	104
	溫度	20°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	20
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	10
	氣筒 行程(吋)	10
	回轉數	170
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	50
補機	冷却水唧筒	グーズ横置
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段4列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 5″	C.B. 2″	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	抗火石2寸	C.B. 2″	抗火石2寸

備考 Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 64

靜岡縣御前崎村冷藏庫

總容積	12,241	凍結量	—
收容量	67	冷凍力	10

所在	靜岡縣榛原郡御前崎村字井戶澤
所有者氏名	御前崎冷藏株式會社
所有者住所	靜岡縣榛原郡御前崎村四四八八番地
竣工年月	昭和二年五月
設計者	東邦商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	第一冷室	15°F	267	3,327	2″	745
	第二〃	〃	287	3,577	2″	745
	第三〃	20°F	158	1,974	2″	355
小計		—	712	8,878	2″	1,845
凍結室						
小計						
準備室廊下		33°F	269	3,363	2″	611
小計		—	269	3,363	2″	611
總計		—	981	12,241	2″	2,456

冷藏庫略圖：——

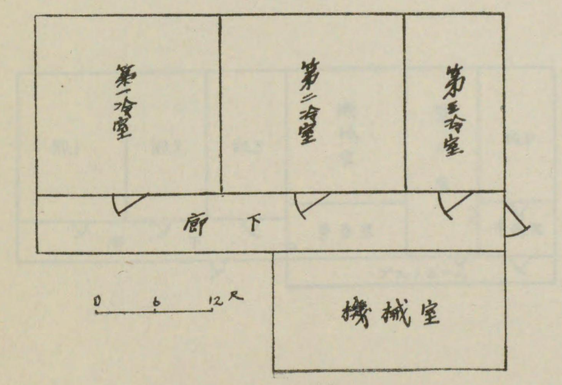

建物概要

外部建築材料		石造
建物階數		平家
敷地坪數		350.00
建物延坪	總延坪	40.00
	冷藏室	24.00
	凍結室	—
	準備室廊下	8.00
	機械室	8.00
	附屬室	—
	其ノ他	—

主要收容物

		鮮魚	乾魚
冷藏	種類		
	量(噸)	58	9
	温度	20°F	30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—	
	温度	—	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	10
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$6^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$6^1/_2$
	回轉數	180
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水唧筒	三聯成唧筒
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.16.5呎12段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 4″	C.B. 4″	C.B. 6″

備考

冷藏庫 65

靜岡縣蒲原町冷藏庫

總容積 42,095 | 凍結量 —
收容量 98 | 冷凍力 15

所在	靜岡縣庵原郡蒲原町堰澤字川東四六〇番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄉業平町一七一番地
竣工年月	昭和二年一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同社

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	25°F	733.7	10,345.2	2″	1,260
	No. 2	〃	555.1	7,825.5	2″	960
	No. 3	15°F	550.4	7,760.6	2″	1,560
	No. 4	25°F	462.7	7,171.9	2″	810
小計		—	2,301.9	33,103.2	2″	4,590
凍結室						
小計						
準備室廊下	No. 1	30°F	180.7	2,005.8	2″	224
	廊下	—	499	6,986		—
小計		—	679.7	8,991.8	2″	224
總計		—	2,981.6	42,095	2″	4,814

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		531.921
建物延坪	總延坪	140.00
	冷藏室	69.16※
	凍結室	—
	準備室廊下	20.66※
	機械室	22.5
	附屬室	ジム室 9.0
	其ノ他	18.66※

主要收容物

冷藏	種類	櫻蝦
	量(噸)	98
	温度	25°—35°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	〃—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	15
	臺數	2A
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	7½
	氣筒 行程(吋)	7½
	回轉數	150
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水唧筒	横置複動
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	2)呎12段3列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 5寸 C.B. 2″	C.D. 6寸	C.B. 4″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.D. 5寸 C.B. 2″	C.D. 6寸	C.B. 4″

備考 ※以下6ノ端數ガック
Ⓐ內一臺製氷用

冷藏庫 66

所在	
所有者氏名	
所有者住所	
竣工年月	
設計者	
工事施行者	

室名稱		最低保
冷藏室	No. 1	
	No. 2	
	No. 3	
	No. 4	
	No. 5	
	No. 6	
	No. 7	
	No. 8	
	No. 9	
	No.10	
	No.11	
	No.12	
	No.13	
	No.14	
	No.15	3
	No.16	
	No.17	
	No.18	2
	No.19	3
	No.20	
總計		

冷藏庫略圖：



一階平面圖

冷藏庫 66

大阪中央卸賣市場冷藏庫

總容積10,636m³　凍結量 —
收容量 1,415　冷凍力 223.8

所在	大阪市此花區西野田十六町二一、二二番地
所有者氏名	大阪市
所有者住所	大阪市北區中ノ島一丁目
竣工年月	昭和三年九月
設計者	所有者
工事施行者	大倉商事株式會社

各室明細

	室名稱	最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	83.60	296.78	2″ 2,070
	No. 2	〃	87.07	309.10	2,074
	No. 3	〃	89.89	319.11	〃
	No. 4	25°F	83.60	296.78	〃
	No. 5	15°F	82.50	292.88	〃
	No. 6	25°F	82.44	292.66	〃
	No. 7	〃	83.39	296.35	1,382
	No. 8	〃	87.26	309.77	〃
	No. 9	〃	89.52	317.80	〃
	No.10	〃	83.50	296.38	〃
	No.11	〃	83.31	295.75	〃
	No.12	〃	64.84	230.18	851
	No.13	〃	66.20	235.01	〃
	No.14	〃	83.67	297.03	1,382
	No.15	30°F	83.23	291.31	〃
	No.16	〃	86.61	303.14	〃
	No.17	〃	89.23	312.31	〃
	No.18	25°F	83.33	291.66	〃
	No.19	30°F	83.01	290.54	〃
	No.20	〃	64 52	225.82	851
總計		—			

	室名稱	最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	No.21	25°F	66.01	231.04	2″ 851
	No.22	〃	83.23	291.31	1,382
	No.23	〃	83.33	293.32	〃
	No.24	〃	86.80	305.54	〃
	No.25	〃	89.50	315.04	〃
	No.26	〃	83.31	293.25	〃
	No.27	〃	90.07	317.05	〃
	No.28	〃	64.58	227.32	851
	No.29	〃	66.37	233.62	〃
	No.30	〃	83.31	293.32	1,382
小計			2,437.23	8,601.17	42,422
研究室 二階		—	15.37	53.33	432
研究室 三階		—	15.57	45.50	〃
小計		—	30.94	98.83	864
準備室廊下 一階		—	146.17	513.06	691
準備室廊下 二三階		—	129.07	447.87	〃
準備室廊下 三四階		—	129.51	453.29	〃
準備室廊下 四階		—	148.29	522.49	〃
小計		—	553.04	1,936.71	2,764
總計		—	3,021.21	10,636.71	2″ 46,050

冷藏庫略圖：——

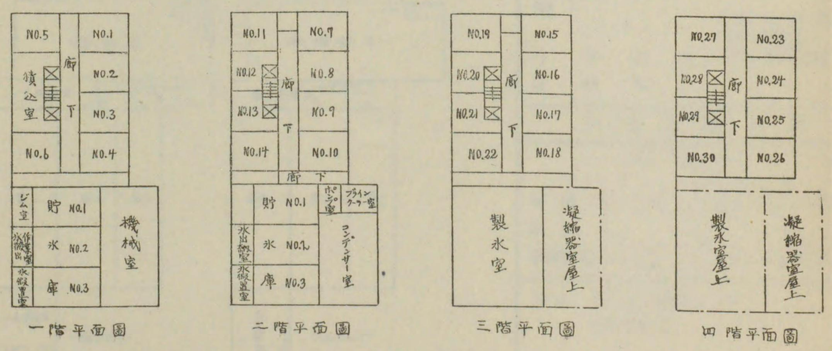

一階平面圖　二階平面圖　三階平面圖　四階平面圖

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		四階
敷地坪數		1,300坪
建物延坪	總延坪	5,957.6平方米
	冷藏室	2,836.8 〃
	積込室	153.6 〃
	準備室廊下	648.0 〃
	機械室	676.0 〃Ⓑ
	製氷室	520.0 〃
	貯氷室	585.0 〃
	其ノ他	538.2 〃Ⓒ

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚	鹽干魚	肉類
	量(噸)	343	420	117
	温度	15°F	25°F	25°F
	種類	鷄卵	蔬菜	果實
	量(噸)	374	161	
	温度	25°F	30°F	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置高速型	
	製作者	ビルター會社	
	冷凍力(噸)	74.6	149.2Ⓐ
	臺數	1	2
	氣筒 數	1	2
	氣筒 直徑(粍)	13	13
	氣筒 行程(粍)	13	13
	回轉數	180	
主動原機	種類	同期電動機	
	馬力	130	230
補機	冷却水喞筒	タービン	5″ 4″
	ブライン喞筒	タービン	6″2臺
	ブラインクーラー	42吋×18呎×2個	
	コンデンサー	20呎12段30列Ⓑ	
冷却様式		ブライン循環	
凍結様式		—	

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C B. 4″	C.B. 4″	C.B. 4″

備考 ◇冷室面積容積ハ夫々平方米，立方米
Ⓐ一臺ハ製氷用 Ⓑ製氷用モ含ム
Ⓒエレベーター 事務室 階段室屋上塔屋

冷藏庫 67

東京市南小田原町冷藏庫

總容積 60,747　凍結量 —
收容量 370　冷凍力 39

所在	東京市京橋區南小田原町二丁目一八番地
所有者氏名	大增商店合資會社
所有者住所	東京市淺草區淺草公園二區二番地
竣工年月	昭和二年八月
設計者	中央冷凍工業所
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	20°F	891	8,736	2″	1,956
	No. 2	〃	901	8,921	2″	1,966
	No. 3Ⓐ	30°F	666	6,598	2″	1,728
	No. 4Ⓐ	〃	893	9,065	2″	1,188
	No. 5Ⓐ	32°F	903	9,209	2″	990
	No. 6Ⓐ	〃	668	6,867	2″	1,728
小計		—	4,922	49,396	2″	9,556
凍結室						
小計						
準備室廊下	一號準備室	30°F	290	2,906	2″	333
	二號準備室	〃	212	2,265	2″	428
	三號準備室	34°F	355	3,732	2″	288
	廊下	—	227	2,448	2″	64
小計		—	1,034	11,351	2″	1,113
總計		—	6,006	60,747	2″	10,669

冷藏庫略圖：——

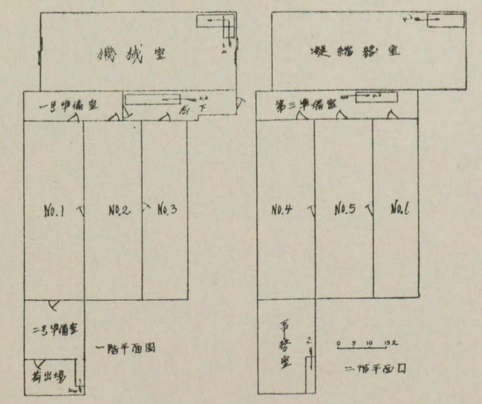

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		二階建
敷地坪數		351.4
建物延坪	總延坪	286.63
	冷藏室	150.0
	凍結室	—
	準備室廊下	37.29
	機械室	78.34Ⓑ
	荷出場	6.00
	其ノ他	15.00

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	370
	溫度	25°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類		NH_3 單働竪型
	製作者		ヨーク會社
	冷凍力(噸)	24	15Ⓐ
	臺數	1	1
	氣筒數	2	2
	氣筒直徑(吋)	9	7½
	氣筒行程(吋)	9	7½
	回轉數	160	170
主動原機	種類	三、交、誘、電動機	
	馬力	40	30Ⓐ
補機	冷却水喞筒	複働深井戶	
	ブライン喞筒	—	
	ブラインクーラー	—	
	コンデサンサー	D.P.19.5呎12段2列 16呎10段Ⓐ	
冷却様式		NH_3 直接膨脹	
凍結様式		—	

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 5寸 C.B. 3″	C.D. 4寸 C.B. 3″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.D. 5寸 C.B. 2″	C.D. 5寸	C.B. 4″

備考　Ⓐハ後ニ增設セルモノ
　　Ⓑ製氷缶用

昭和二年度
奬勵冷藏庫

冷藏庫 68　水戸市三ノ丸冷藏庫

總容積	5,079	凍結量	—
收容量	30	冷凍力	6.5

所在	茨城縣水戸市大字上市北三ノ丸一ノ六番地
所有者氏名	株式會社水戸魚市場
所有者住所	茨城縣水戸市大字上市北三ノ丸一ノ六番地
竣工年月	昭和二年九月
設計者	中央冷凍工業所
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	一號室	20°F	193.23	1,932.3	1¼″	510
	二號室	〃	194.36	1,943.6	1¼″	540
小計		—	387.59	3,875.9	1¼″	1,080
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	30°F	116.9	1,204.07	1¼″	160
小計		—	116.9	1,204.07	1¼″	160
總計		—	504.49	5,079.97	1¼″	1,240

冷藏庫略圖：——

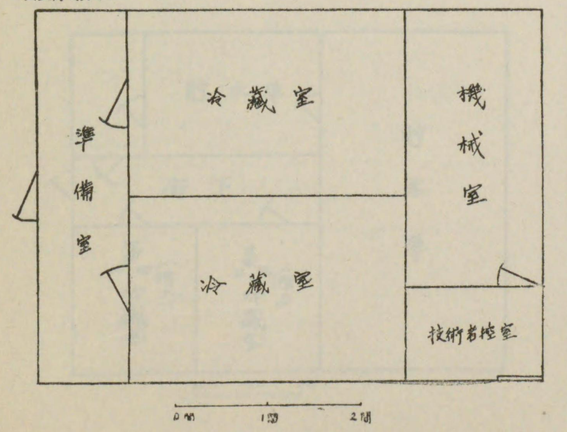

建物概要

外部建築材料		木造スレート葺
建物階數		平家
敷地坪數		130
建物延坪	總延坪	74
	冷藏室	12
	凍結室	—
	準備室廊下	4
	機械室	6
	附屬室	—
	其ノ他	市場52

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	30
	温度	25°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	6.5
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	5
	氣筒 行程(吋)	5
	回轉數	280
主動原機	種類	三、交、誘、電働機
	馬力	13.5
補機	冷却水喞筒	3.5″×4″
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.19呎7段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷凍室	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 4″	C.B. 4″	C.B. 5″

備考

冷藏庫 69

愛知町三谷町冷藏庫

總容積	7,475	凍結量	—
收容量	37	冷凍力	14

所在	愛知縣寶飯郡三谷町字東前六十二番地ノ一
所有者氏名	三谷製氷株式會社
所有者住所	愛知縣寶飯郡三谷町字東前六十二番地ノ一
竣工年月	昭和二年七月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同上

各室明細

室明稱		最抵保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	一號室	15°F	140.07	1,4 8.71	2″	271.2
	二號室	〃	140.07	1,428.71	2″	271.2
	三號室	〃	140.40	1,109.16	2″	203.4
	四號室	〃	140.40	1,109.16	2″	203,4
小計		—	560.94	5,075.74	2″	949.2
凍結室						
小計						
廊下	階下	30°F	130.09	1,346.43		—
	階上	〃	130.90	1,053.74		—
小計		—	260.99	2,400.17		—
總計		—	821.93	7,475.91	2″	949.2

冷藏庫略圖：——

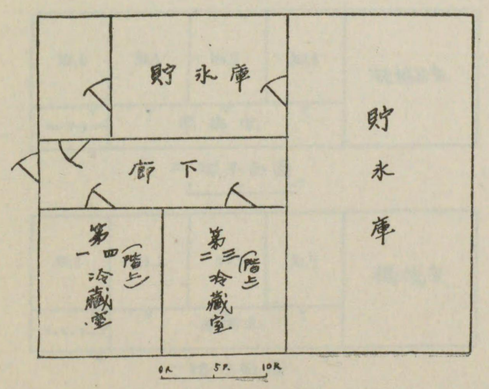

建物概要

外部建築材料		腰煉瓦木造
建物階數		二階建
敷地坪數		300
建物延坪	總延坪	28.12
	冷藏室	19.2
	凍結室	—
	準備室廊下	8.92
	機械室	Ⓐ
	附屬室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	37
	溫度	17°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	溫度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3單働堅型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	1ヶ
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$6^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$6^1/_2$
	回轉數	270
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	25
補機	冷却水喞筒	三聯成複働4″×5″
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	2〃呎12段
冷却樣式		NH_3接直膨脹
凍結樣式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″ C.D .6″	C.B. 6″	C.B. 5″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 3″ C.D. 9″	—	C.B. 2″

備考 Ⓐ製氷兼用トス

冷藏庫 70

福岡縣若松市冷藏庫

總容積 24,608 | 凍結量 —
收容量 137 | 冷凍力 27

所在	福岡縣若松市東海岸通三丁目四十二番地ノ一
所有者氏名	小野田彦助外五名
所有者住所	福岡縣若松市若松町六丁目六十三番地
竣工年月	昭和三年十月
設計者	木下商會
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	210.6	2,249.2	1¼″	660
	No. 2	〃	220.9	2,376.8	〃	〃
	No. 3	〃	221.2	2,402.2	〃	〃
	No. 4	〃	214.9	2,320.9	〃	〃
	No. 5	〃	214.9	2,320.9	〃	〃
	No. 6	〃	221.3	2,401.1	〃	〃
	No. 7	〃	221.3	2,390.0	〃	〃
	No. 8	〃	208.5	2,251.8	〃	〃
小計		—	1,733.6	18,712.9	1¼″	5,280
エレベーター室	階下		98	1,146.6		—
	階上		98	1,146.6		—
小計		—	196	2,293.2		—
準備室	No. 1	30°F	272.1	2,965.8	1¼″	153
	No. 2	30°F	270	2,929.5	1¼″	180
小計		—	542.1	5,895.3	1¼″	333
總計		—	2,273.7	24,608.2	1¼″	5,613

冷藏庫略圖：——

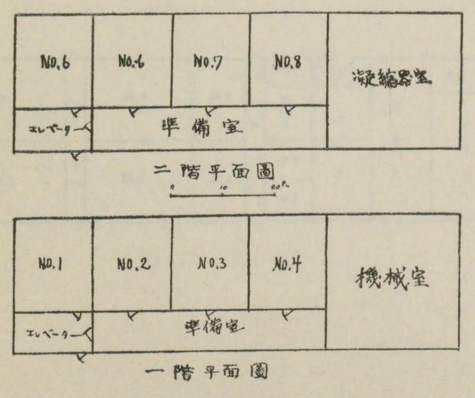

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		二階建
敷地坪數		200.00
建物延坪	總延坪	125.06
	冷藏室	60.00
	凍結室	—
	準備室廊下	26.67
	機械室	36.83Ⓐ
	附屬室	—
	其ノ他	エレベーター塔1.56

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	137
	温度	20°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	27
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(粍)	9
	氣筒 行程(粍)	9
	回轉數	190
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	40
補機	冷却水唧筒	三聯成4½″×5½″
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D P.20呎12段3列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C B 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C B. 4″	C.B. 4″	C.B. 4″

備考 Ⓐ製氷釜用トス
面積容積總計中ニハ
昇降機室ヲ含マズ

冷藏庫 71　青森縣田名部町冷藏庫

總容積	148,607	凍結量	3.7
收容量	1,450	冷凍力	80

所在	青森縣下北郡田名部町大字田名部字海老川番外地
所有者氏名	大湊冷藏株式會社
所有者住所	東京市麹町區丸ノ内二ノ二丸ビル七二四
竣工年月	昭和二年七月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同社

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	5°F	1,604.2	22,619	2″	4,329
	No. 2	〃	1,603.8	22,613	2″	4,329
	No. 3	〃	1,616.4	22,791	2″	4,368
	No. 4	〃	1,617.1	22,801	2″	4,368
	No. 5	〃	784.1	11,055	2″	2,150
	No. 6	〃	785.6	11,076	2″	2,150
	No. 7	〃	334.9	4,722	2″	888
	No. 8	〃	328.2	4,627	2″	888
小計		—	8,674.3	122,304	2″	23,470
凍結室		-20°F	430.1	6,021	2″	2,069
					$1^1/_4$″	2,664
					2″換算	4,462
小計		—	430.1	6,021	2″	4,462
準備室廊下	廊下	—	599.8	8,627		—
	〃	—	599.8	8,627		—
	準備室	—	211.8	3,028		—
小計		—	1,411.4	20,282		—
總計		—	10,515.8	148,607	2″	27,932

冷藏庫略圖：——



建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		2,492
建物延坪	總延坪	384Ⓐ
	冷藏室	261
	凍結室	14
	準備室廊下	43
	機械室	52.25Ⓒ
	附屬室	事務室13.75
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚
	量(噸)	1,450
	温度	20°F
凍結	凍結量(一日噸)	3.7
	温度	-5°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	ヴイルター會社
	冷凍力(噸)	40
	臺數	3Ⓑ
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	$10^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$10^1/_2$
	回轉數	175
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	60
補機	冷却水喞筒	タービン4″×2Ⓒ
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	30吋15呎9吋×2Ⓒ
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		同空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.D. 1尺	C.B. 6″
凍結室	C.B. 8″	C.D.1.2尺	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 4″	C.D. 1尺	C.B. 4″

備考　Ⓐ製氷室貯氷庫ヲ含マズ
Ⓑ一臺ハ製氷用トス
Ⓒ製氷共用トス

冷藏庫 72

岩手縣山田町冷藏庫

總容量	13,863	凍結量	6.4
收容量	74.0	冷凍力	19.0

所在	岩手縣下閉伊郡山田町山田第七地割字小濱通
所有者氏名	山田灣製氷株式會社
所有者住所	岩手縣山田町山田第七地割字小濱通一三ノ二
竣工年月	昭和三年十月
設計者	—
工事施行者	—

各室明細

室名稱		最低保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	10°F	460	4,485	2″	900
小計		—	460	4,485	2″	900
凍結室	No. 1	-15°F	275.2	2,559.55	2″	2,950
	No. 2	〃	278.2	2,590.98	2″	2,950
小計			553.4	5,150.53	2″	5,900
準備室廊下	No. 1	30°F	433.6	4,227.6	2″	490
		—				
小計		—	433.6	4,227.6	2″	490
總計		—	1,447.0	13,863.13	2″	7,290

冷藏庫略圖:——

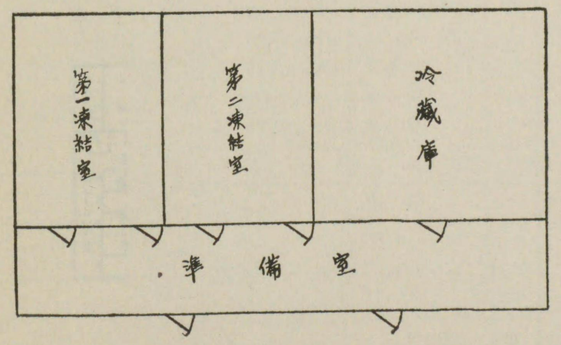

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		585.0
建物延坪	總延坪	45.00
	冷藏室	14.00
	凍結室	17.50
	準備室廊下	13.50
	機械室	既設Ⓑ
	附屬室	Ⓑ
	其ノ他	Ⓑ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	74.0
	溫度	10°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	6.4
	溫度	0°—10°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ビルター會社
	冷凍力(噸)	19.0
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$7^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$7^1/_2$
	回轉數	220
主動原機	種類	無水重油發動機
	馬力	50
補機	冷却水唧筒	ウオシントン横置
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.19呎12段2列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		同空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 3″ S. 5寸	C.B. 3″ S. 5寸	C.B. 6″
凍結室	C.B. 5″ S. 5寸	C.B. 5″ S. 5寸	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 2″ S. 5寸	C.B. 1″ S. 5寸	C.B. 4″

備考 Ⓑ製氷兼用
S :— スラツグウール

冷藏庫 7

所	
所有者氏	
所有者住	
竣工年	
設計	
工事施行	

室名	稱	
冷藏室	No. 1	
	No. 2	
	No. 3	
	No. 4	
	No. 5	
	No. 6	
	No. 7	
	No. 8	
	No. 9	
	No.10	
	No.11	
	No.12	
	No.13	
	No.14	
	No.15	
小計		
廊下	No. 1	
	No. 2	
	No. 3	
小計		
總計		

冷藏



8.5

電動機

4″×6″

膨脹

斗
床
C.B. 6″
—
C.B. 3″

冷藏庫 73

青森市新濱町冷藏庫

総容積 246,708 | 凍結量 36.8
收容量 1,453 | 冷凍力 100

所在	青森市新濱町一四番地
所有者氏名	青森製氷株式會社
所有者住所	青森市新濱町一三番地
竣工年月	昭和二年十月
設計者	三機工業株式會社
工事施行者	同上

各室明細

	室名稱	最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	No. 1	15°F	717.26	9,446.0	2″ 2,203.8
	No. 2	10°F	1,014.54	13,568.57	2″ 2,080.8
	No. 3	〃	570.8	7,386.77	2″ 1,228.0
	No. 4	〃	782.12	9,211.04	2″ 1,368.4
	No. 5	〃	1,330.12	15,949.31	2″ 2,368.8
	No. 6	〃	1,439.04	17,254.28	2″ 2,538.0
	No. 7	〃	721.82	8,609.44	2″ 1,342.0
	No. 8	〃	1,003.72	12,142.85	2″ 1,812.0
	No. 9	〃	950.95	11,249.50	2″ 1,805.2
	No.10	〃	801.97	8,484.11	2″ 1,180.8
	No.11	〃	1,350.49	14,392.42	2″ 2,199.6
	No.12	〃	1,481.11	15,590.59	2″ 2,385.6
	No.13	〃	740.37	7,994.95	2″ 1,214.0
	No.14	〃	1,020.15	10,962.59	2″ 1,691.2
	No.15	〃	966.39	10,327.81	2″ 1,484.0
	小計	—	14,890.85	172,570.23	2″ 26,902.2
廊下	No. 1	30°F	819.28	11,059.65	2″ 1,120.0
	No. 2	〃	869.59	10,647.12	2″ 1,170.0
	No. 3	〃	779.92	8,719.33	2″ 1,050.0
	小計	—	2,468.79	30,426.10	2″ 3,340.0
總計		—		—	—

	室名稱	最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
凍結室	No. 1	-10°F	332.24	4,355.26	1¼″ 6,200.0
	No. 2	〃	331.84	4,281.83	〃 6,200.0
	No. 3	〃	327.79	4,227.29	〃 6,200.0
	No. 4	〃	327.79	4,227.29	〃 6,200.0
	No. 5	〃	326.97	4,222.51	〃 6,118.0
	小計		1,646.63	21,314.18	1¼″ 30,918.0
準備室其他	準備室	30°F	354.16	4,726.21	2″ 675.2
	グレージング室	〃	496.88	6,637.9	2″ 677.6
	處理室	—	830.5	11,033.51	—
	小計	—	1,681.54	22,397.62	2″ 1,352.8
總計		—	20,687.81	246,708.13	2″ 31,595.0 1¼″ 30,918.0

冷藏庫略圖：——

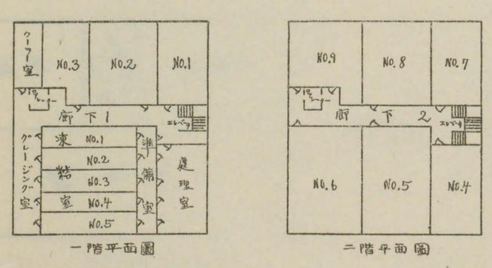

一階平面圖　二階平面圖　三階平面圖

建物概要

外部建築材料	鐵筋混凝土
建物階數	三階建
敷地坪數	242.00
建物延坪 總延坪	681.540Ⓐ
建物延坪 冷藏室	453.895
建物延坪 凍結室	56.000
建物延坪 準備室廊下	143.670
建物延坪 機械室	Ⓐ
建物延坪 クーラー室	12.285
建物延坪 サーヂタンク室	14.356
建物延坪 エレベーター	1.334

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚	鮮魚
冷藏	量(噸)	1,410	42.5
冷藏	温度	15°F	23°F
凍結	凍結量(一日噸)	36.8	
凍結	温度	0°F	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
冷凍機械	製作者	ヨーク會社
冷凍機械	冷凍力(噸)	100
冷凍機械	臺數	1
冷凍機械	氣筒 數	2
冷凍機械	氣筒 直徑(吋)	14
冷凍機械	氣筒 行程(吋)	16
冷凍機械	回轉數	155
主動原機	種類	ラストン重油機關
主動原機	馬力	168
補機	冷却水唧筒	プランジヤ竪型複働
補機	ブライン唧筒	タービン 8″
補機	ブラインクーラー	48吋×18呎
補機	コンデンサー	20呎12段9列
冷却様式		ブライン循還
凍結様式		同上空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 7″	C.B. 7″	C.B. 6″
凍結室	C.B.8 ″	C.B. 5″	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 6″	C.B. 7″	C.B. 6″

備考 Ⓐ製氷兼用
機械室ヲ不含

冷藏庫 74

鳥取縣米子町冷藏庫

總容積 9,694 | 凍結量 —
收容量 74 | 冷凍力 8.5

所在	鳥取縣米子町灘町二丁目一五五番地
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ鄉業平町一一七一番地
竣工年月	昭和三月一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　社

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長
冷藏室	第一號	15°F	368	4,784	2″ 1,050
	第二號	〃	368	4,784	2″ 1,050
小計		—	736	9,568	2″ 2,100
凍結室					
小計					
準備室廊下	廊下	—	95.34	126.8	—
小計		—	95.34	126.8	—
總計		—	831.34	9,694.8	2″ 2,100

冷藏庫略圖：——

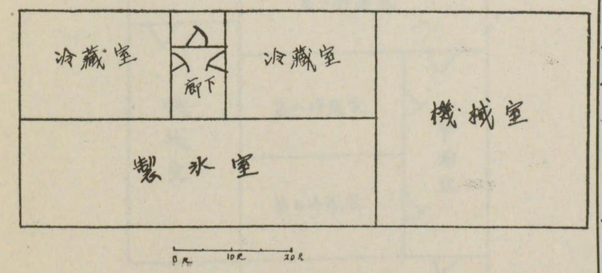

建物概要

外部建築材料		煉瓦造
建物階數		平家
敷地坪數		720
建物延坪	總延坪	28.50
	冷藏室	25.2
	凍結室	—
	準備室廊下	3.3
	機械室	—Ⓐ
	附屬室	—Ⓐ
	其ノ他	—Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	74
	温度	17°—30°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	8.5
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	5
	氣筒 行程(吋)	5
	回轉數	360
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水喞筒	複働三聯成4″×6″
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	18呎10段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 3″	C.B. 3″	C.B. 3″

備考　Ⓐ製氷兼用トス

冷藏庫 75

札幌市冷藏庫

總容積	7,408	凍結量	—
收容量	48	冷凍力	7.37

所在	北海道札幌市北一條東三丁目九番地五號一番地
所有者氏名	札幌市場株式會社
所有者住所	札幌北一條東三丁目二番地
竣工年月	昭和二年九月
設計者	大辰合資會社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	259.8	2,39	2″	665
	No. 2	〃	167.8	1,648	2″	450
	No. 3	〃	171.7	1,687	2″	450
小計		—	599.3	5,728	2″	1,565
凍結室						
小計						
準備室廊下 準備室		30°F	171.4	1,680	2″	280
小計		—	171.4	1,680	2″	280
總計		—	770.7	7,408	2″	1,845

冷藏庫略圖：——

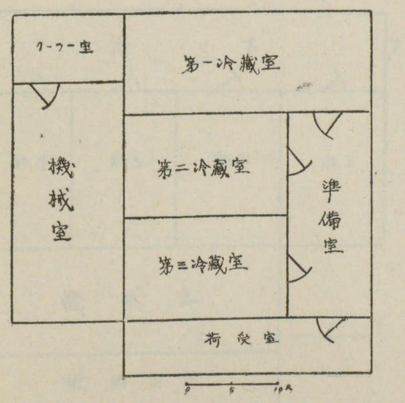

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		92.4
建物延坪	總延坪	40.25
	冷藏室	19.25
	凍結室	—
	準備室廊下	5.50
	機械室	8.50
	附屬室	荷受場4.50
	クーラー室	2.50

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	48
	温度	25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	フリツーク會社
	冷凍力(噸)	7.37
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	5
	氣筒 行程(吋)	5
	回轉數	270
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	15
補機	冷却水喞筒	渦巻$1^1/_2$″
	ブライン喞筒	タービン$2^1/_2$″
	ブラインクーラー	26吋×5呎
	コンデンサー	D.P.20呎6段
冷却様式		ブライン循環
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 6寸	C.D. 5.5寸	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.D. 6寸	C.D. 5.5寸	C.B. 6″

備考

冷藏庫 76　宮崎縣油津町冷藏庫

總容積 15,113　凍結量 —
收容量 55.0　冷凍力 8.0

所在	宮崎縣南那珂郡油津町二五三番地
所有者氏名	油津製氷冷藏株式會社
所有者住所	宮崎縣南那珂郡油津町二五三番地
竣工年月	昭和三年三月
設計者	龍紋氷室
工事施行者	同社

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	204.16	2,204.9	2″	449
	No. 2	〃	209.44	2,261.9	2″	449
	No. 3	〃	209.44	2,261.9	2″	449
	No. 4	〃	151.36	1,135.2	2″	328
小計		—	774.4	7,863.9	2″	1,675
凍結室						
小計						
準備室廊下	廊下	貯氷兼用	518.0	7,250.0		—
小計		—	518.0	7,250.0		—
總計		—	1,292.4	15,113.9	2″	1,675

冷藏庫略圖：——

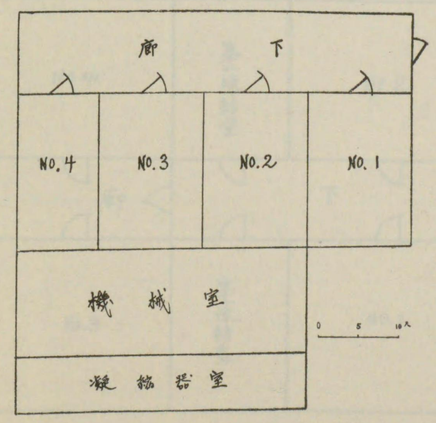

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		階上製氷室
敷地坪數		800.00
建物延坪	總延坪	3 9.47Ⓐ
	冷藏室	25.86
	凍結室	—
	準備室廊下	13.61
	機械室	20.84(凝)Ⓑ
	附屬室	—
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
	量(噸)	55.0
	温度	25°—40°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	8.0
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	5
	氣筒 行程(吋)	5
	回轉數	360
主動原機	種類	デイゼルエンヂン
	馬力	50
補機	冷却水唧筒	三聯成唧筒
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.18呎12段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考　Ⓐ機械室以下ヲ含マズ
Ⓑ製氷兼用

冷藏庫 77　靜岡縣下田町冷藏庫

總容積 28,062　凍結量 3.7
收容量 130　冷凍力 15.0

所在	靜岡縣賀茂郡下田町一七番地
所有者氏名	伊豆製氷冷藏株式會社
所有者住所	靜岡縣賀茂郡下田町一七番地
竣工年月	昭和二年十一月
設計者	日東製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	330	4,455	2″	1,404
	No. 2	15°F	330	4,455	2″	1,404
	No. 3	0°F	356	4,486	2″	1,280
	No. 4	0°F	356	4,486	2″	1,280
小計		—	1,372	17,882	2″	5,368
凍結室	No. 1	0°F	168	2,268	2″	700
					1¼″	1,740
	No. 2	〃	168	2,268	2″	700
					1¼″	1,740
小計		—	336	4,536	2″	1,400
					1¼″	3,480
準備室廊下	廊下一號	—	258	3,250		—
	廊下二號	—	190	2,394		—
小計		—	448	5,644		—
總計		—	2,156	28,062	2″	6,768
					1¼″	3,480

冷藏庫略圖：——

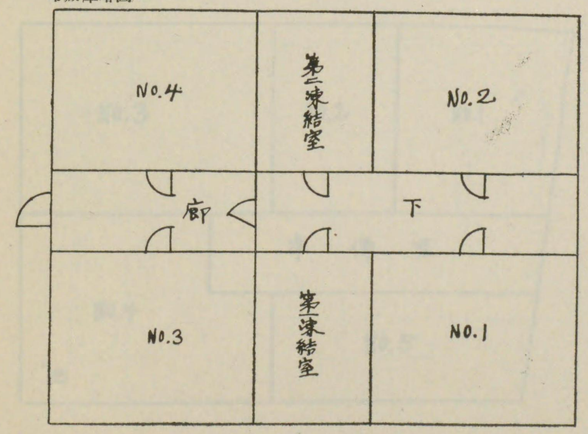

建物概要

外部建築材料		石造
建物階數		平家
敷地坪數		380
建物延坪	總延坪	79.16
	冷藏室	50.29
	凍結室	13.79
	準備室	15.08
	機械室	Ⓐ
	クーラー室	Ⓐ
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚
	量(噸)	130
	温度	15°—0°F
凍結	凍結量(一日噸)	3.7
	温度	5°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	15
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	7½
	氣筒 行程(吋)	7½
	回轉數	200
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水喞筒	三聯成複働型
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	2)呎12段4列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		同上空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.D. 1尺	C.B. 6″
凍結室	C.B. 6″	C.D. 1尺	C.B. 6″
準備室廊下	—	—	—

備考　防熱周壁、床ハ抗火石2寸ヲ夫々加フ
Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 78　姬路市高尾町冷藏庫

總容積 18,535　凍結量 —
收容量 132　冷凍力 20

所在	兵庫縣姬路市高尾町六百三十七番地
所有者氏名	植村冷藏製氷合資會社
所有者住所	兵庫縣姬路市高尾町六百三十七番地
竣工年月	昭和三年三月
設計者	長谷川鐵工所
工事施行者	同所

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	218.40	2,861.00	2″	720
	No. 2	〃	166.95	2,203.74	2″	630
	No. 3	〃	351.39	4,638.45	2″	1,260
	No. 4	〃	306.86	4,019.80	2″	1,080
	No. 5	〃	193.80	2,558.16	2″	682
小計		—	1,237.4	16,281.15	2″	4,372
凍結室						
小計						
準備室廊下	No. 1	30°F	173.42	2,254.56	2″	384
小計		—	173.42	2,254.56	2″	384
總計		—	1,410.82	18,535.71	2″	4,756

冷藏庫略圖：——

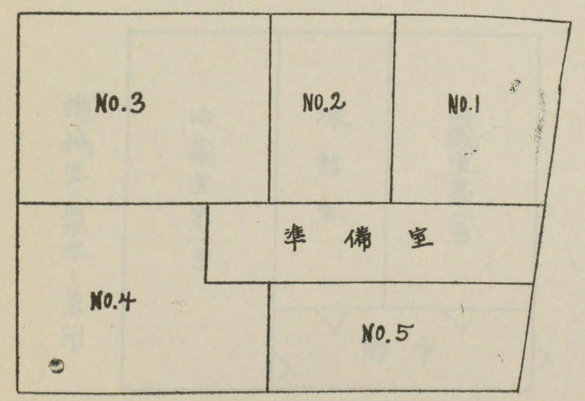

建物概要

外部建築材料	煉瓦造
建物階數	平家
敷地坪數	76
建物延坪 總延坪	60.5
建物延坪 冷藏室	41.75
建物延坪 凍結室	—
建物延坪 準備室廊下	6.25
建物延坪 機械室	12.5
建物延坪 附屬室	—
建物延坪 其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類
冷藏	量(噸)	132
冷藏	温度	15°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
凍結	温度	—

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
冷凍機械	製作者	長谷川鐵工所
冷凍機械	冷凍力(噸)	20
冷凍機械	臺數	1
冷凍機械	氣筒 數	1
冷凍機械	氣筒 直徑(吋)	8
冷凍機械	氣筒 行程(吋)	10
冷凍機械	回轉數	200
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
主動原機	馬力	35
補機	冷却水喞筒	二聯式4″×5″
補機	ブライン喞筒	—
補機	ブラインクーラー	—
補機	コンデンサー	20呎12段2列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 6″ C.D.12″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	—	—	—

備考

冷藏庫 79　高知縣室戸町冷藏庫

總容積 18,618　凍結量 2.8
收容量 93.4　冷凍力 13

所在	高知縣安藝郡室戸町浮津五、十、七合番地
所有者氏名	土佐製氷冷藏株式會社
所有者住所	高知市下知三ツ頭四三〇番地
竣工年月	昭和三年五月
設計者	大日本製氷株式會社
工事施行者	同　社

各室明細

室名稱		最抵保持温度	面積(內法)	容積(內法)	配管長
冷藏室	第一號	5°F	379.0	5,343.9	2″ 1,326.0
	第二號	〃	491.0	6,962.2	2″ 1,695.0
小計		—	870.0	12,306.1	2″ 3,021.0
凍結室	第一號	-20°F	251.5	3,495.9	2″ 1,836.0 1¼″ 2,448.0
小計		—	251.5	3,495.9	2″ 1,836.0 1¼″ 2,448.0
準備室廊下	第一號	—	190.9	2,816.0	—
小計		—	190.9	2,816.0	—
總計		—	1,312.4	18,618.0	2″ 4,857.0 1¼″ 2,448.0

冷藏庫略圖：——

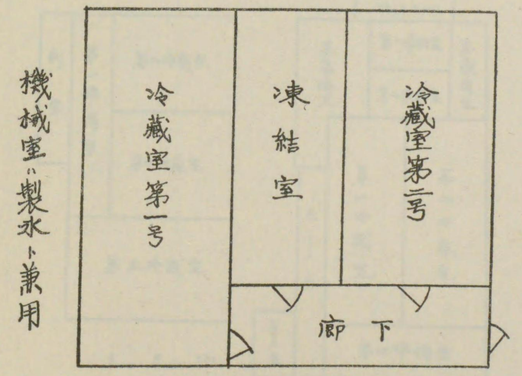

建物概要

外部建築材料	鐵筋混凝土煉瓦木造
建物階數	平家
敷地坪數	300.23
建物延坪 總延坪	42.00
建物延坪 冷藏室	27.56
建物延坪 凍結室	8.56
建物延坪 準備室廊下	5.88
建物延坪 機械室	—Ⓐ
建物延坪 附屬室	—Ⓐ
建物延坪 其ノ他	—Ⓐ

主要收容物

冷藏 種類	凍魚
冷藏 量(噸)	93.4
冷藏 溫度	15°F
凍結 凍結量(一日噸)	2.8
凍結 溫度	0°F

冷凍設備概要

冷凍機械 種類	NH_3單働竪型
冷凍機械 製作者	ビルター會社
冷凍機械 冷凍力(噸)	13
冷凍機械 臺數	1
冷凍機械 氣筒 數	2
冷凍機械 氣筒 直徑(吋)	7½
冷凍機械 氣筒 行程(吋)	7½
冷凍機械 回轉數	175
主動原機 種類	三、交、誘、電動機
主動原機 馬力	25
補機 冷却水唧筒	グルーズ横置複働一臺Ⓐ
補機 ブライン唧筒	—
補機 ブラインクーラー	—
補機 コンデンサー	20呎12段2列
冷却様式	NH_3直接膨脹
凍結様式	同上

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	C.B 8″	C.B. 8″	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 2″	C.B. 2″	C.B. 2″

備考　Ⓐ製氷兼用トス

冷藏庫 80　東京市深川區古石場町冷藏庫

總容積 61,390 | 凍結量 6.64
收容量 450 | 冷凍力 37Ⓐ

所在	東京市深川區古石場町二十二番地
所有者氏名	朝日製氷冷藏株式會社
所有者住所	東京市芝區芝浦町三丁目一番地ノ六號
竣工年月	昭和三年七月
設計者	冷業社
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	華氏 5度	725.9	9,836.4	2″	2,184
	No. 2	〃	710.9	9,776.2	2″	2,184
	No. 3	〃	485.1	6,330.5	2″	1,472
	No. 4	〃	543.9	7,016.9	2″	1,564
	No. 5	〃	720.1	9,254.0	2″	2,112
小計			3,185.9	42,214	2″	9,516
凍結室	No. 1	華氏 -20度	138.9	1,861.8	1¼″	2,995.2
					2″	374.4
	No. 2	〃	156.0	2,075.3	〃	
小計			294.9	3,937.1	1¼″	5,990.4
					2″	748.8
準備室廊下	No. 1	30°	349.86	4,618.2	2″	608
	No. 2	30°	408.9	4,947.6	2″	528
	No. 3	30°	134.6	1,817.1	2″	288
	No. 4	30°	285.65	3,856.2	2″	584
小計			1,179.01	15,239.1	2″	2,008
總計		—	4,659.81	61,390.2	1¼″	5,990.4
					2″	12,272.8

冷藏庫略圖：——

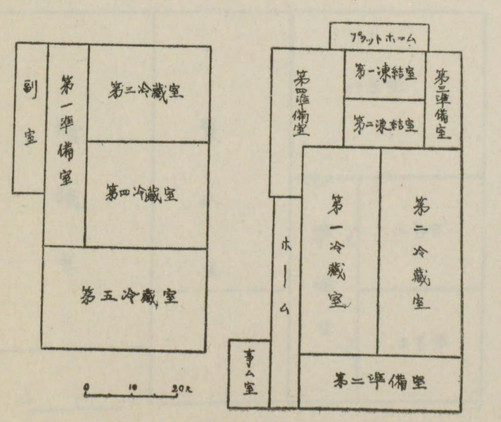

建物概要

外部建築材料		鐵筋凝土
建物階數		二階
敷地坪數		304.17
建物延坪	總延坪	154.36
	冷藏室	97.62
	凍結室	10.5
	準備室廊下	34.27
	機械室	Ⓐ
	附屬室	予冷室12.0
	其ノ他	Ⓐ

主要收容物

冷藏	種類	凍結魚
	量(噸)	450
	温度	10°F
凍結	凍結量(一日噸)	6.64
	温度	0°F

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	30
	臺數	1
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	8
	氣筒 行程(吋)	8
	回轉數	300
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	60
補機	冷却水喞筒	深井戸タービン
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.19呎12段3列
冷却様式		NH_3直接膨脹
凍結様式		同空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 2″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	C.B.10″	C.B. 6″	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 4″	C.B. 4″	C.B. 4″

備考　Ⓐ製氷兼用

冷藏庫 81

福岡縣飲塚町冷藏庫

總容積	8,818	凍結量	—
收容量	60.0	冷凍力	10

所在	福岡縣嘉穗郡穗波村大字堀池字草崎拾三番地
所有者氏名	渡邊福造
所有者住所	福岡縣嘉穗郡穗波村大字平恒三百三十六番地
竣工年月	昭和三年六月
設計者	長谷川鐵工所
工事施行者	同上

各室明細

室名稱		最低保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	320.9	3,886.8	2″	825
	No. 2	〃	127.0	1,514.0	2″	403
	No. 3	〃	125.1	1,496.6	2″	403
小計		—	573.0	6,897.4	2″	1,631
凍結室						
小計						
準備室廊下	No. 1	30°F	159.4	1,921.1	2″	329
小計		—	159.4	1,921.1	2″	329
總計		—	732.4	8,818.5	2″	1,960

冷藏庫略圖：——

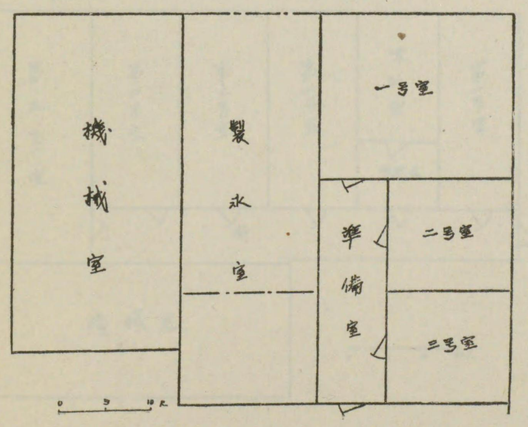

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		平家
敷地坪數		417
建物延坪	總延坪	60.0
	冷藏室	19.5
	凍結室	—
	準備室廊下	5.0
	機械室	18
	附屬室	—
	其ノ他	17.5

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚
	量(噸)	60.0
	温度	15°—25°F
凍結	凍結量(一日噸)	—
	温度	17.5

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 横置複働
	製作者	長谷川鐵工所
	冷凍力(噸)	10
	臺數	1Ⓐ
	氣筒 數	1
	氣筒 直徑(吋)	6
	氣筒 行程(吋)	8
	回轉數	200
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20
補機	冷却水唧筒	$3^3/_4''\times6''$
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	D.P.18.5呎14段
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		—

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 6″	C.B. 6″
凍結室	—	—	—
準備室廊下	C.B. 4″	C.B. 4″	C.B. 6″

備考 Ⓐ別ニ參噸製氷機アリ

冷藏庫 82　三重縣富洲原町冷藏庫

總容積	24,119	凍結量	2.9
收容量	187	冷凍力	22

所在	三重縣三重郡富洲原町大字富田一色三一〇ノ七
所有者氏名	大日本製氷株式會社
所有者住所	東京市本所區中ノ郷業平町一七一
竣工年月	昭和三年三月
設計者	大日本製氷株式會社
工事施行者	同　上

各室名細

室名稱		最抵保持温度	面積(内法)	容積(内法)	配管長	
冷藏室	第一號室	15°F	244.5	3,398.5	2″	782
	第二號室	〃	278.6	3,844.6	2″	1,012
	第三號室	〃	279.4	3,875.7	2″	828
	第四號室	〃	279.9	3,862.6	2″	828
	第五號室	〃	435.4	6,052.0	2″	1,192
小計		—	1,517.8	21,033.4	2″	4,642
凍結室		-20°F	146.9	2,041.9	2″	524.4
					1″	1,821
小計			146.9	2,041.9	2″	524.4
					1″	1,821
廊下		30°F	74.6	1,044.4	2″	148.8
小計		—	74.6	1,044.4	2″	148.8
總計		—	1,739.3	24,119.7	1″	1,821
					2″	5,315.2

冷藏庫略圖：——

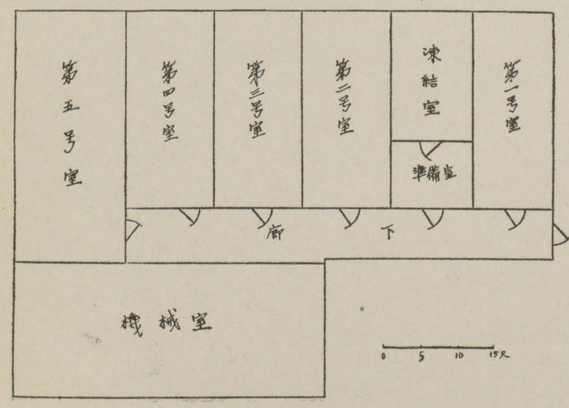

建物概要

外部建築材料		木造
建物階數		平家
敷地坪數		314.55
建物延坪	總延坪	120.22
	冷藏室	49.00
	凍結室	5.50
	準備室廊下	12.41
	機械室	42.00
	事務室	11.31
	其ノ他	—

主要收容物

冷藏	種類	魚類	凍結魚
	量(噸)	143.5	43.5
	温度	20°—30°	10°F
凍結	凍結量(一日噸)	2.9	
	温度	-5°F	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	11
	臺數	2
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	$6^1/_2$
	氣筒 行程(吋)	$6^1/_2$
	回轉數	310
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	20×2
補機	冷却水唧筒	渦巻、三聯成複働
	ブライン唧筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎12段4列
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		同空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.D. 5寸 C.B. 2″	C.D. 1尺	C.B. 6″
凍結室	C.D. 5寸 C.B. 6″	〃	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 3″	C.D. 8寸	C.B. 2″

備考

昭和三年度
奨勵冷藏庫

冷藏庫 83

青森市新安方町冷藏庫

總容積	159,027	凍結量	20.5
收容量	830	冷凍力	80

所在	青森市大字新安方町四十二番地
所有者氏名	大東食品株式會社
所有者住所	青森市大字造道字浪打七三二番地
竣工年月	昭和三年七月
設計者	所有者
工事施行者	三菱商事株式會社

各室明細

室名稱		最低保持溫度	面積(內法)	容積(內法)	配管長	
冷藏室	No. 1	15°F	6 2	8,200	2″	1,482
	No. 2	〃	516	7,017	2″	1,295
	No. 3	5°F	1,223	15,776	2″	2,988
	No. 4	〃	617	8,113	2″	1,776
	No. 5	〃	778	9,958	2″	2,150
	No. 6	〃	1,229	16,284	2″	3,122
	No. 7	〃	617	8,113	2″	1,872
	No. 8	〃	776	10,165	2″	2,150
小計			6,368	83,626	2″	16,835
凍結室	No. 1	−20°F	744	9,448	2″	2,021
					1¼″	1,209
				—	棚 1¼″	9,240
	No. 2	−20°F	774	9,560	2″	2,021
					1¼″	1,209
					棚 1¼″	9,240
小計			1,488	19,008	2″	4,042
					1¼″	20,898
廊下	No. 1	25°F	736	10,304	2″	1,184
	No. 2	〃	659	8,764	2″	1,062
	No. 3	〃	700	9,310	2″	1,062
	No. 4	〃	833	10,829	2″	1,399
	No. 5	〃	835	11,189	2″	1,399
準備室	No. 1		152	2,128		—
	No. 2		97	1,343		—
	No. 3		95	1,263	2″	123
	No. 4		95	1,263	2″	123
小計			4,202	56,393	2″	6,352
總計		—	12,058	159,027	2″	27,229
					1¼″	20,898

冷藏庫略圖：—

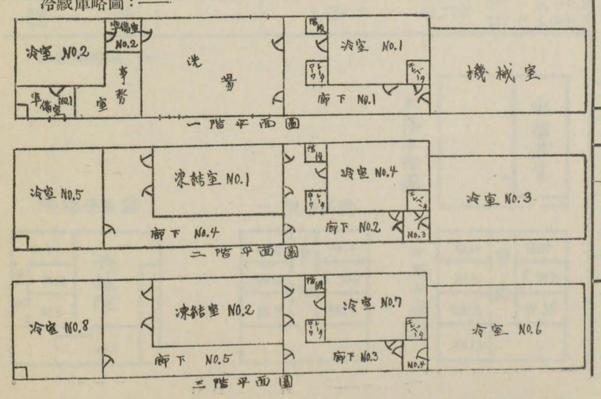

建物概要

外部建築材料		鐵筋混凝土
建物階數		四階
敷地坪數		187.75
建物延坪	總延坪	646.34
	冷藏室	206.01
	凍結室	47.95
	準備室廊下	145.21
	機械室	73.40Ⓐ
	製氷室	120.83
	洗場	42.37
	事務室其他	10.57

主要收容物

冷藏	種類	鮮魚	凍結魚
	量(噸)	113	717
	溫度	15°F	5°F
凍結	凍結量(一日噸)	20.5	
	溫度	−20°F	

冷凍設備概要

冷凍機械	種類	NH_3 單働竪型
	製作者	ヨーク會社
	冷凍力(噸)	80
	臺數	1Ⓑ
	氣筒 數	2
	氣筒 直徑(吋)	12½
	氣筒 行程(吋)	14½
	回轉數	160
主動原機	種類	三、交、誘、電動機
	馬力	150
補機	冷却水喞筒	複働三聯成5″×7″
	ブライン喞筒	—
	ブラインクーラー	—
	コンデンサー	20呎16段8列Ⓑ
冷却様式		NH_3 直接膨脹
凍結様式		同上空氣凍結

主要防熱材料

	周壁	天井	床
冷藏室	C.B. 6″	C.B. 2″	C.B. 6″
凍結室	C.B 8″	C.B. 4″	C.B. 8″
準備室廊下	C.B. 4″	C.B. 1″	C B. 4″

備考 Ⓐ凝縮器室モ含ム製氷兼用
Ⓑ此外ニ製氷20屯機アリ
