清理報告書

豫鄂皖三省
剿匪總司令部湖北水利堤工事務清理委員會
朱玖瑩

堤防地點圖說

上海图书馆藏书

1627209

上海图书馆藏书

A541 212 0014 8993B

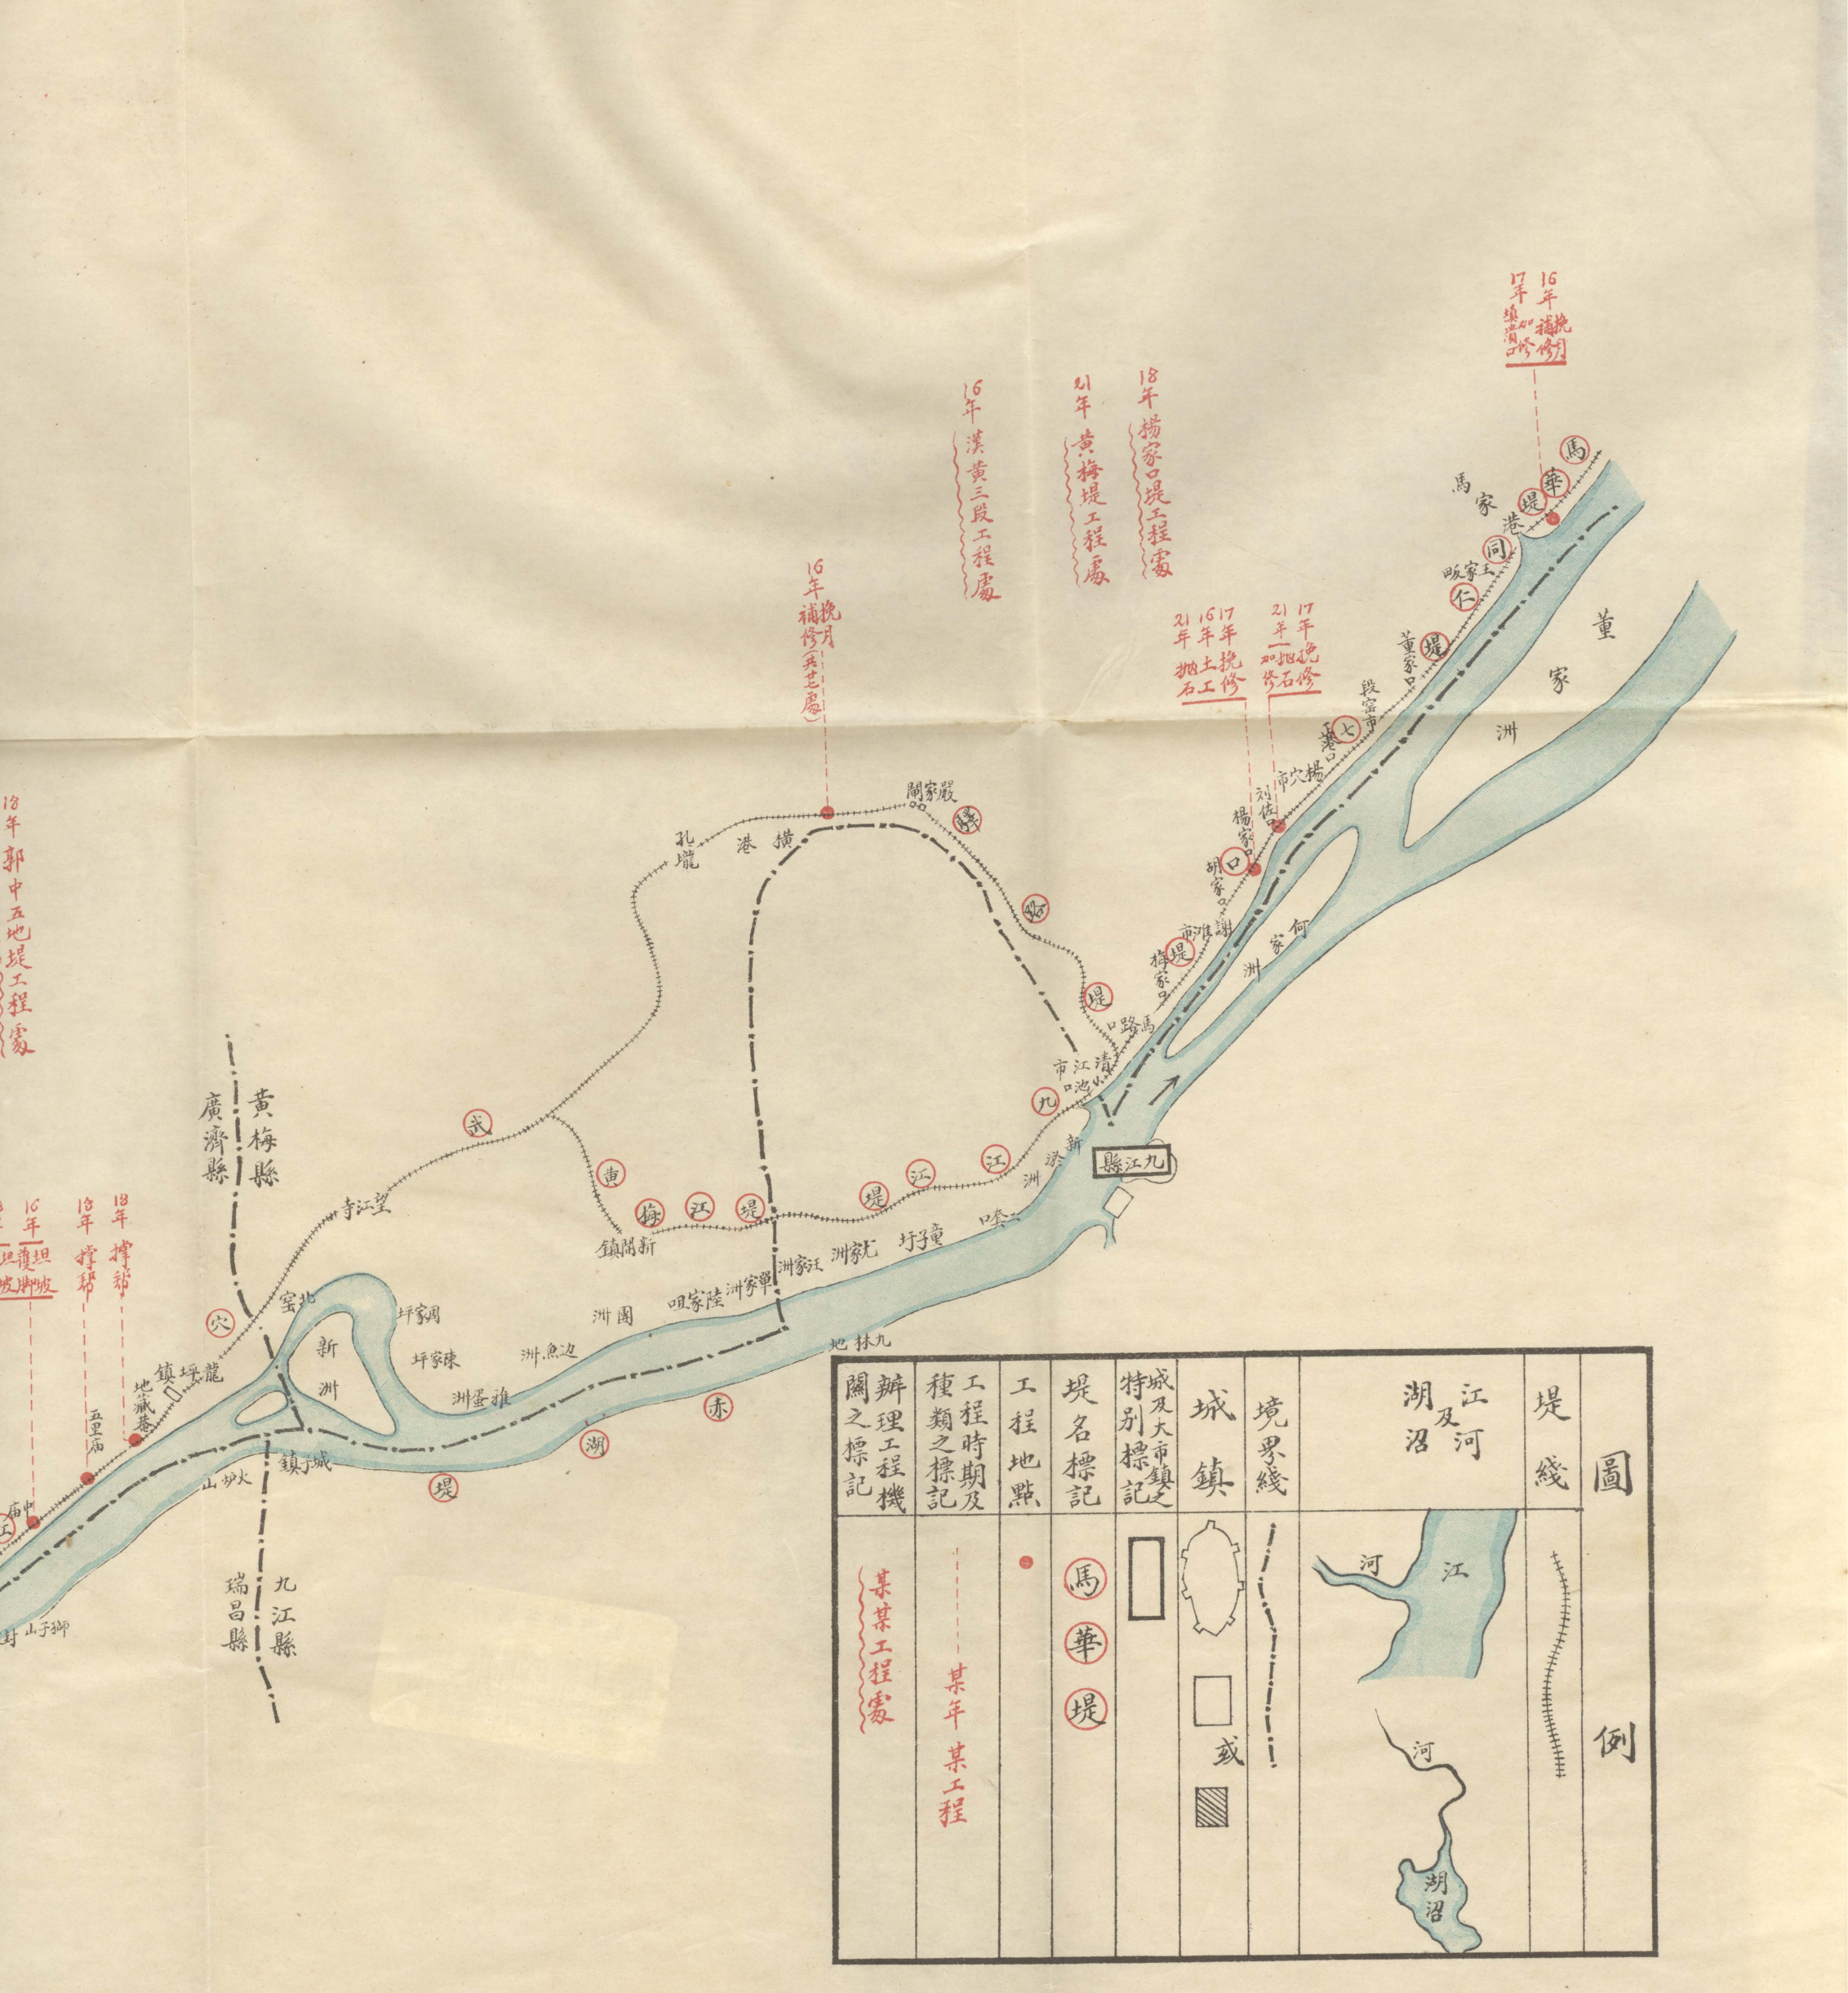
16年 挽月補修
17年 如修 填潰口
馬家港
董家洲
何家洲
董家口
段窑市
楊穴市
楊家口
胡家口
謝家口
淮市
梅家口
馬路口
清江池口
九江縣
新淤洲
嘆口
童子坪
九林地
洲就
洲家汪
洲家單
咀家陸
洲圍
洲魚边
洲蛋雍
坪家陳
坪家周
新洲
北窑
寺江望
鎮開新
嚴家閘
横港
孔壠
黄梅縣
廣濟縣
瑞昌縣
九江縣
龍坪
鎮口
地藏巷
五里庙
鎮子城
山炉火
獅子山封
16年 漢黄三段工程處
21年 黄梅堤工程處
18年 楊家口堤工程處
16年 挽月補修(兵士處)
21年 拋石
16年 土工
17年 挽修
21年 如修
17年 挽修
21年 拋石
18年 郭中五地堤工程處
16年 護坦坡脚
18年 捍緒
18年 捍帮
圖例
堤綫
江及河湖沼
境界綫
城鎮
城及大市鎮之特别標記
堤名標記
工程地點
工程時期及種類之標記
辦理工程機關之標記
某年 某工程
某某工程處

長江隄防圖一

（東自安徽境西至武昌縣）

縮尺二十萬分一

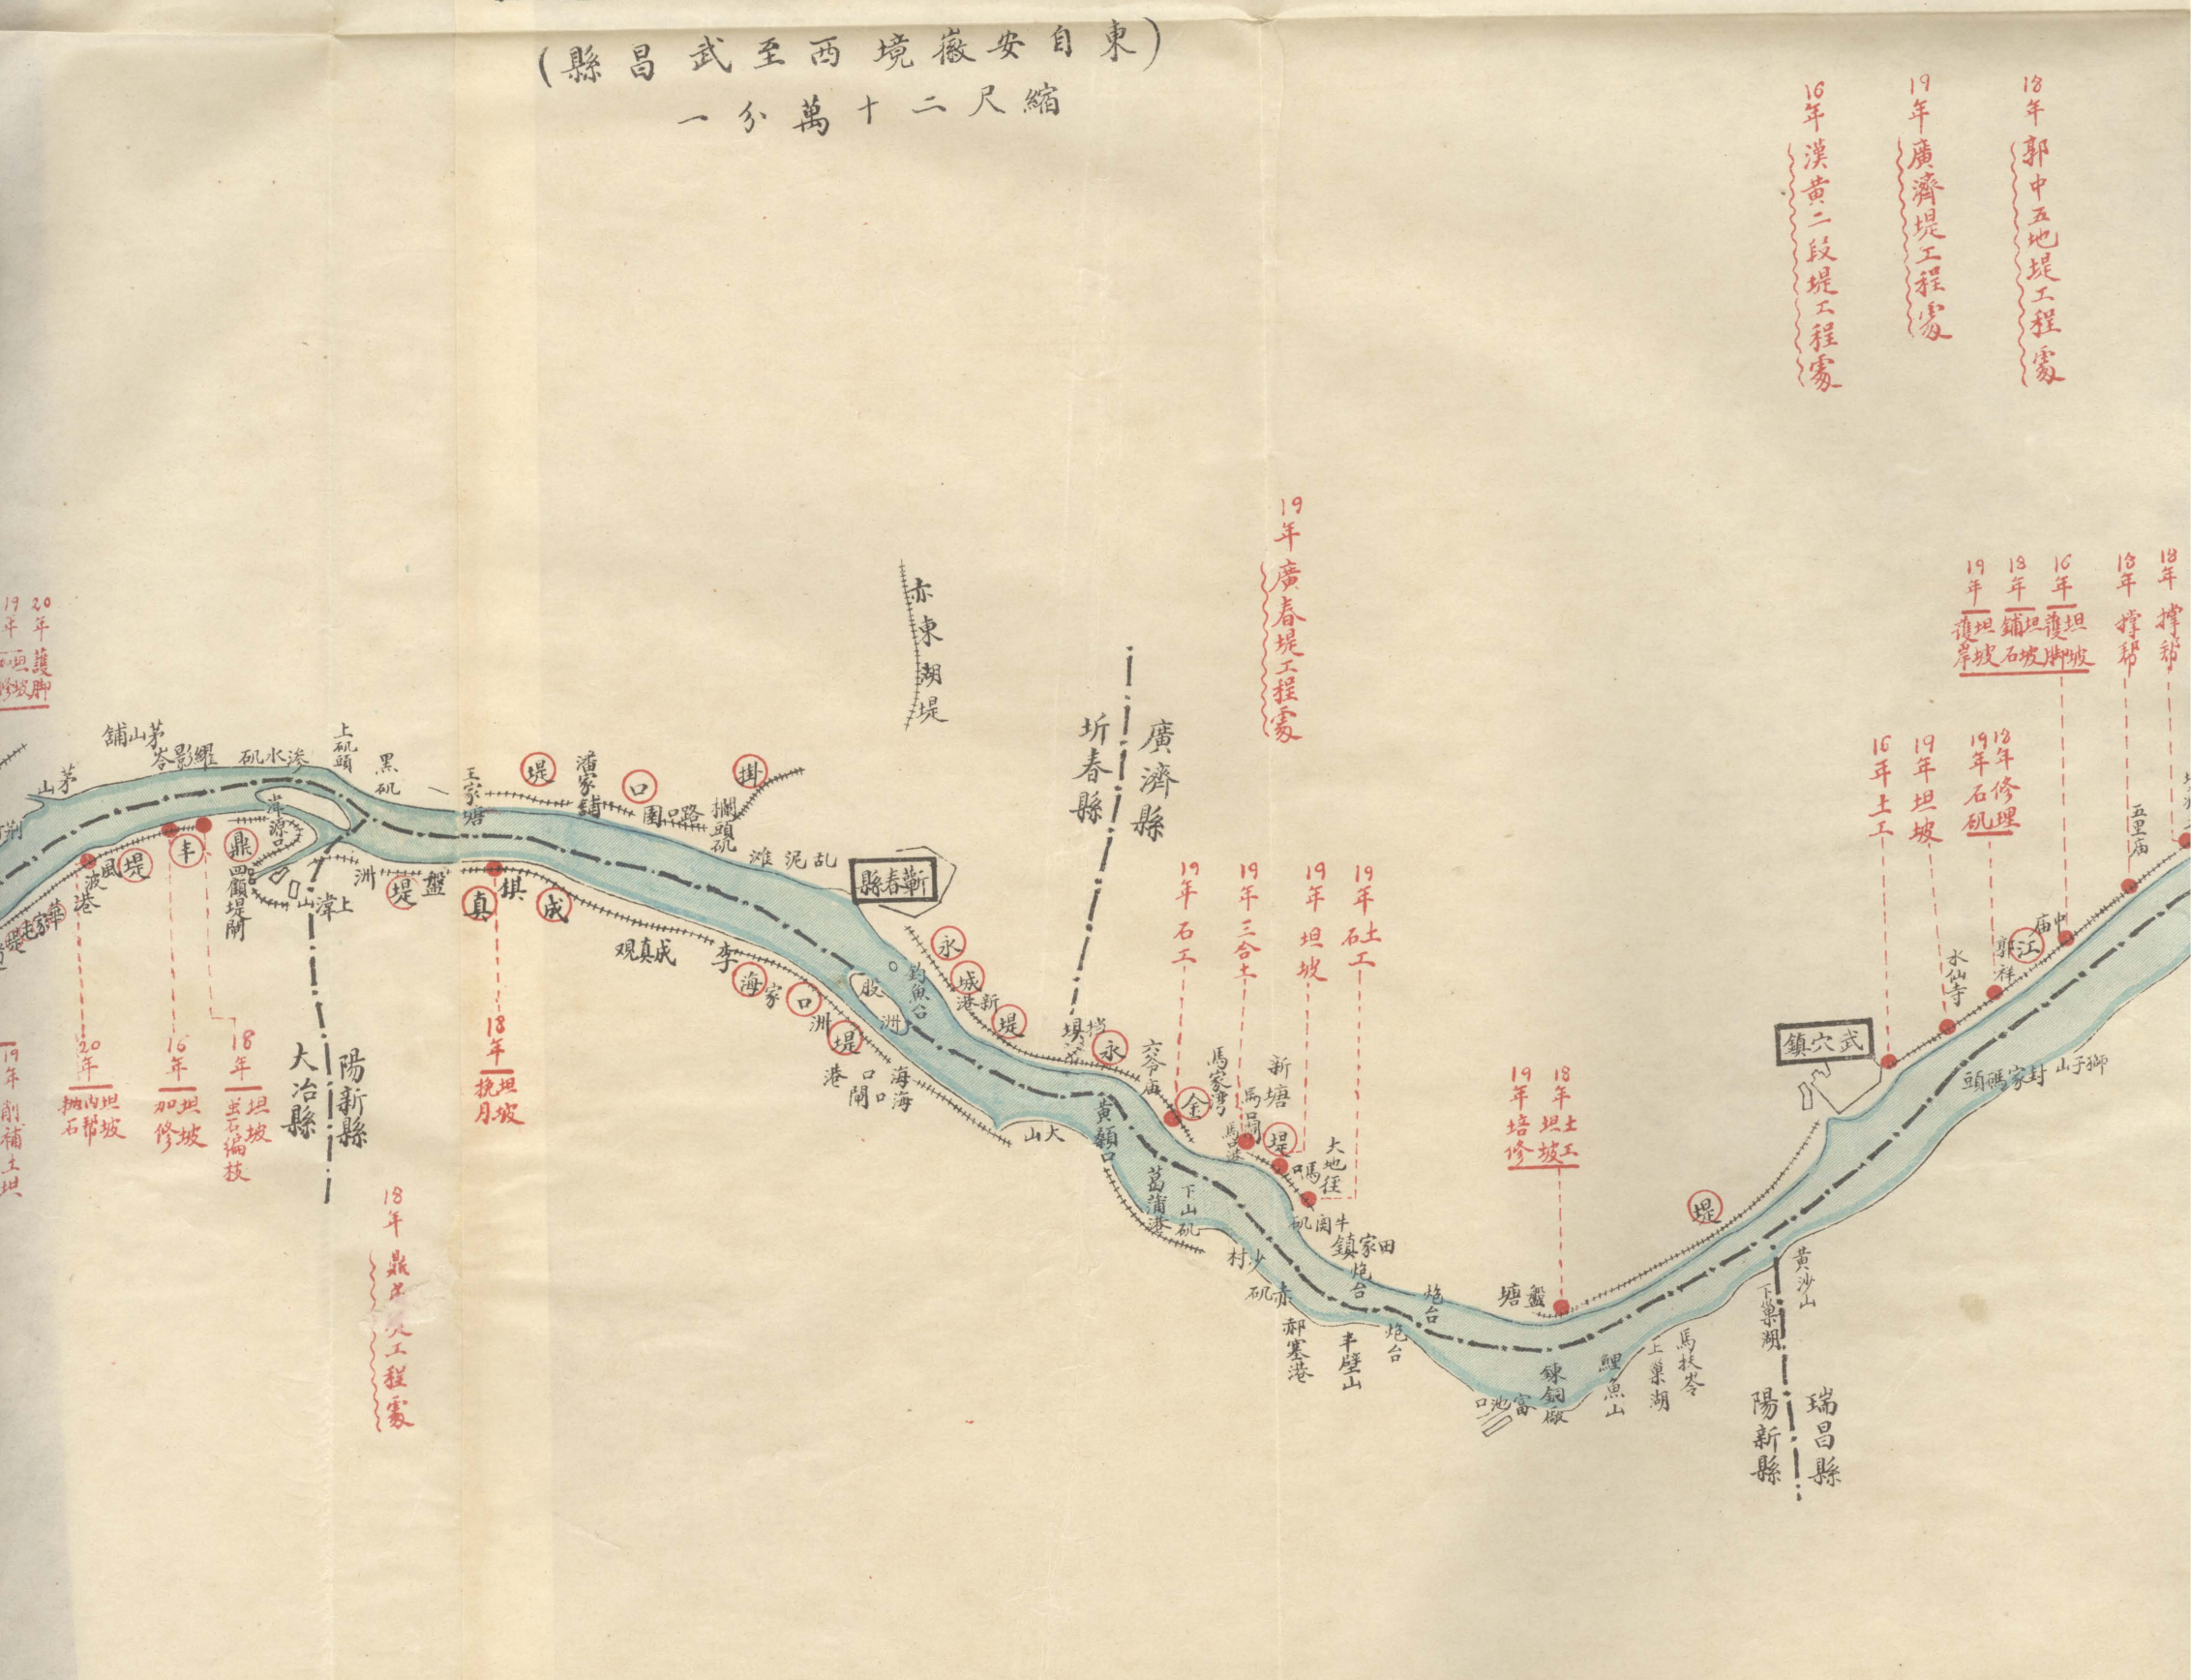

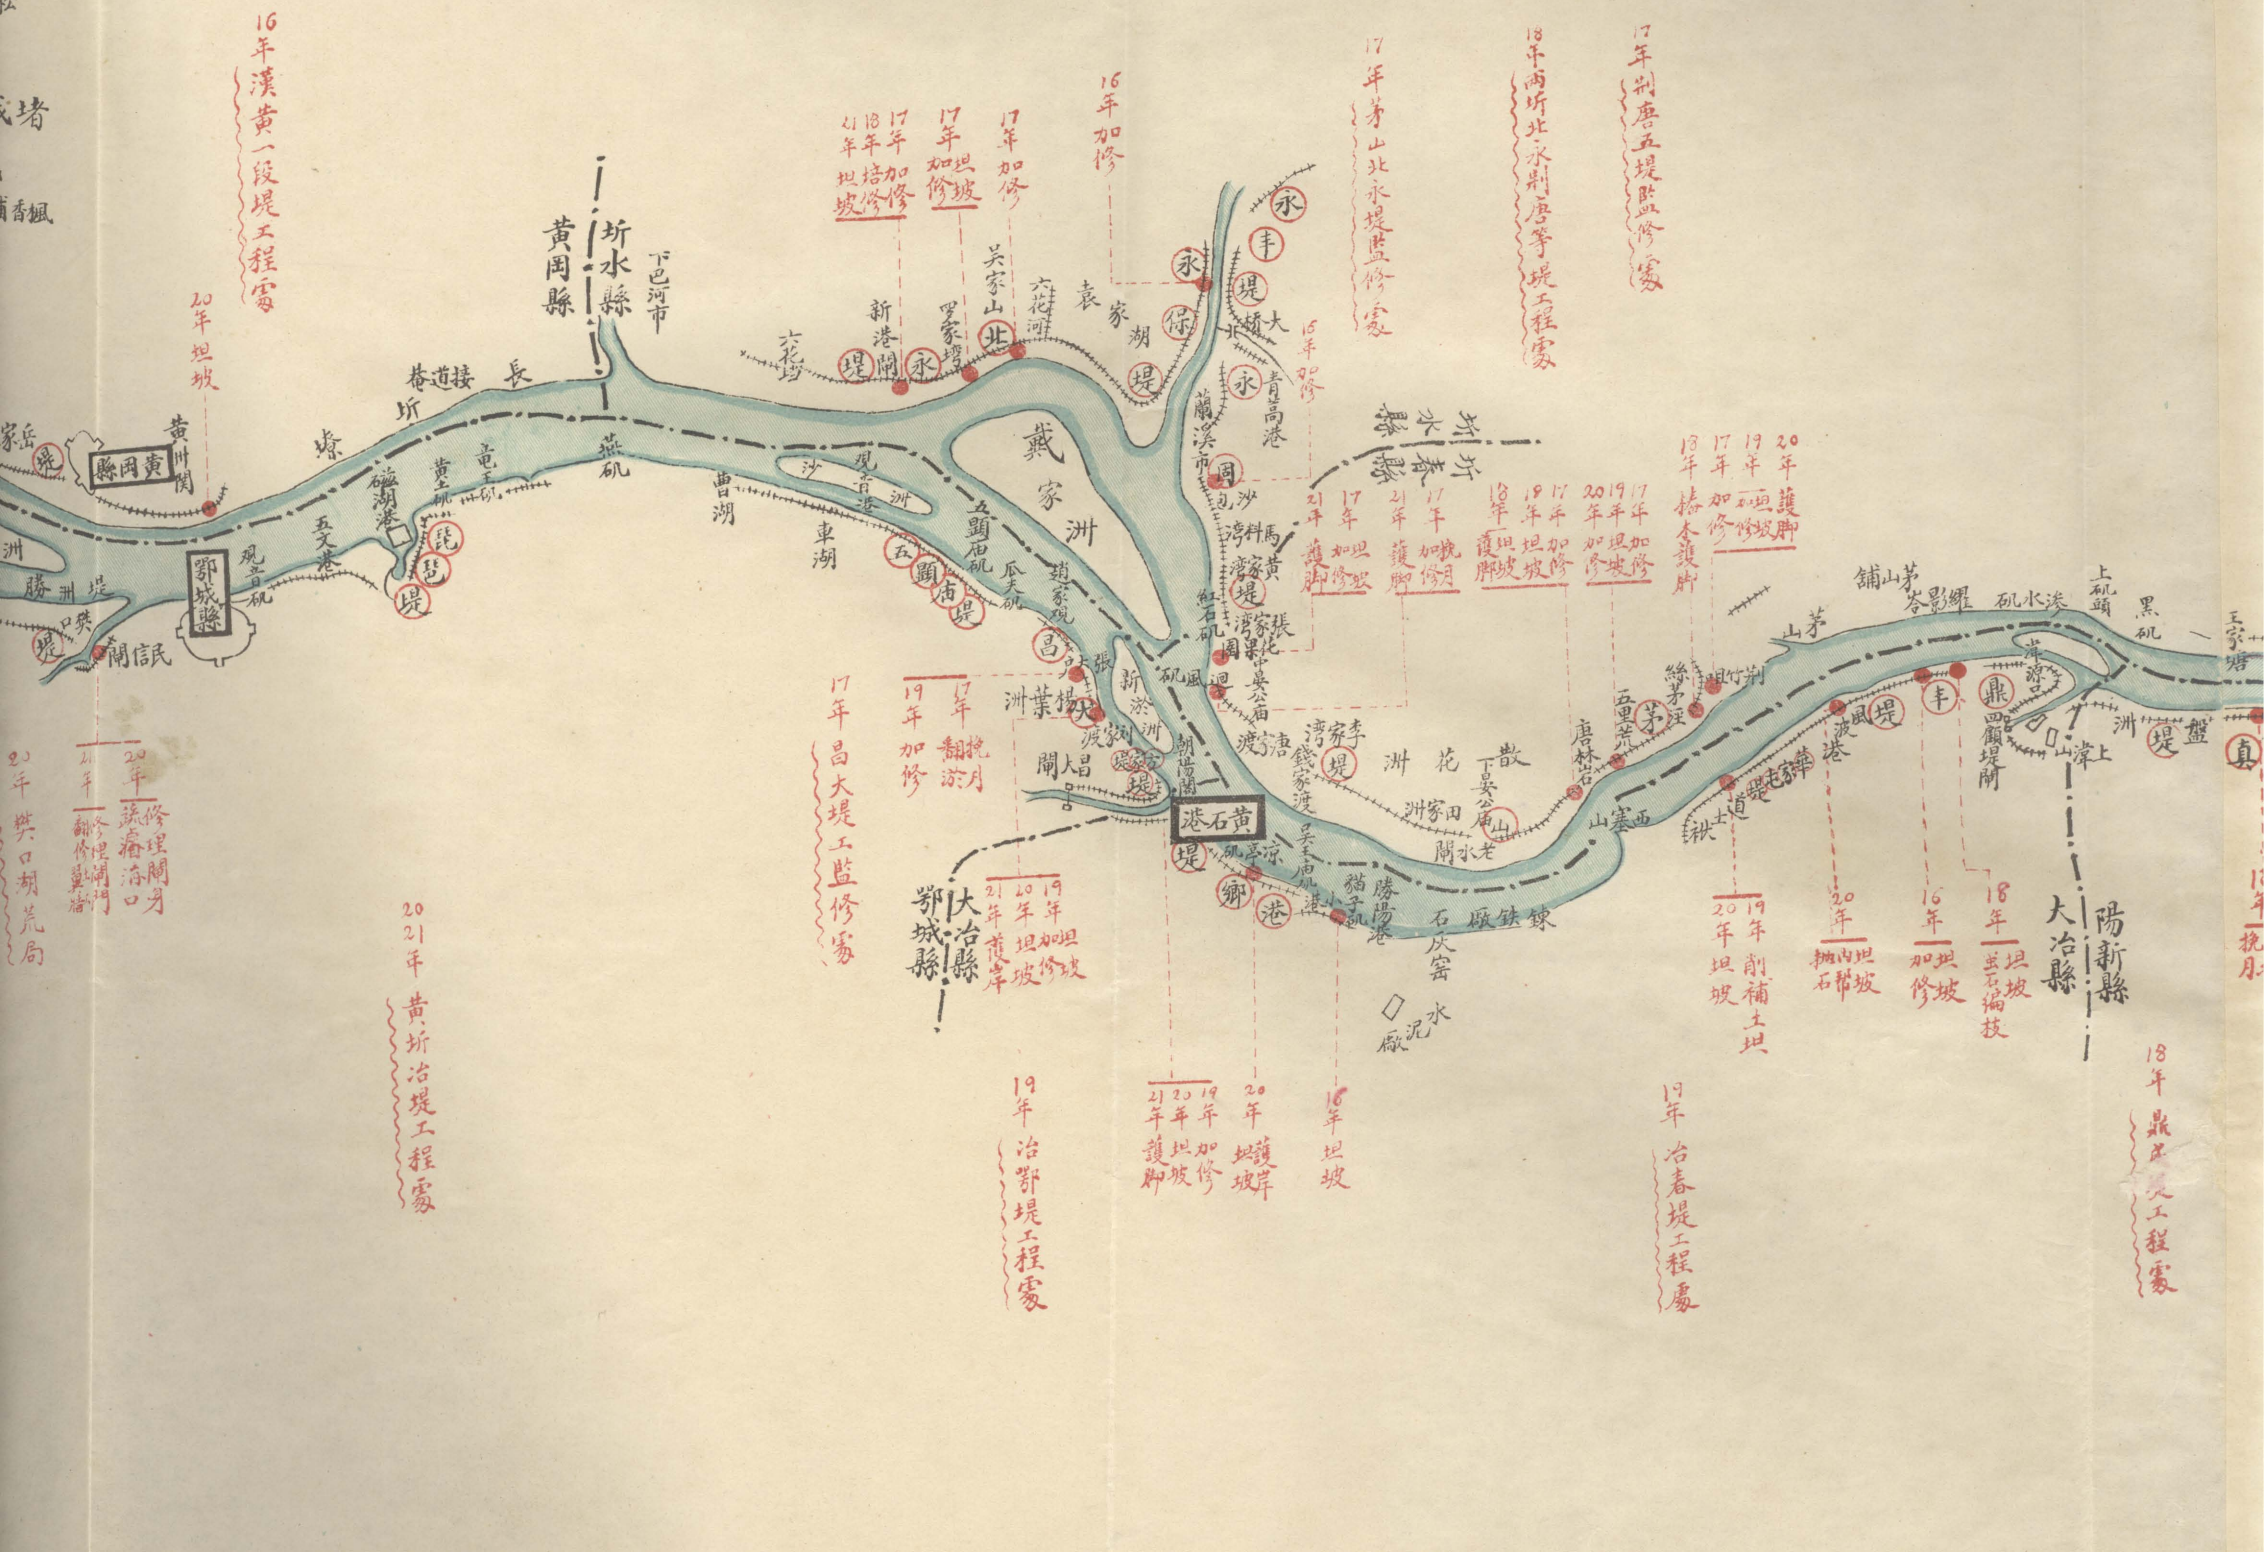
黃岡縣
鄂城縣
黃州關
黃州
黃岡縣
坼水縣
下巴河市
大冶縣
鄂城縣
陽新縣
大冶縣
黃石港
戴家洲
新淤洲
葉洲
花洲
車湖
曹湖
長港
五丈港
磁湖港
燕矶
五顯庙矶
瓜矶
紅石矶
風矶
唐林冶
西塞山
茅山
舖山
黑矶
水淡矶
上矶頭
王家塘
巢湖
鼎
四顧堤閘
真
盤
堤
丰
茅
永
保
昌
大
周
黃
鄉
港
琵
琶
五
顯
庙
堤
閘
信民
樊口湖荒局
17年制唐五堤監修處
18年兩坼北永制唐等堤工程處
17年茅山北永堤監修處
16年加修
17年加修
17年坦坡
17年加修
18年培修
21年坦坡
16年漢黃一段堤工程處
20年坦坡
20年修理閘身
21年修理閘門翻修量閘
17年昌大堤工監修處
20 21年黃坼冶堤工程處
17年翻淤
19年加修
21年護岸
20年坦坡
19年加修坦坡
19年冶鄂堤工程處
21年護脚
20年坦坡
19年加修
20年坦坡
16年坦坡
16年加修
21年護脚
17年坦坡
17年加修
21年護脚
18年坦坡
18年護脚
17年加修
20年坦坡
19年坦坡
17年加修
18年護脚
19年加修
20年護脚
19年冶春堤工程處
20年坦坡
19年削補土坦
20年坦坡
16年坦坡
18年坦坡
18年鼎盤工程處

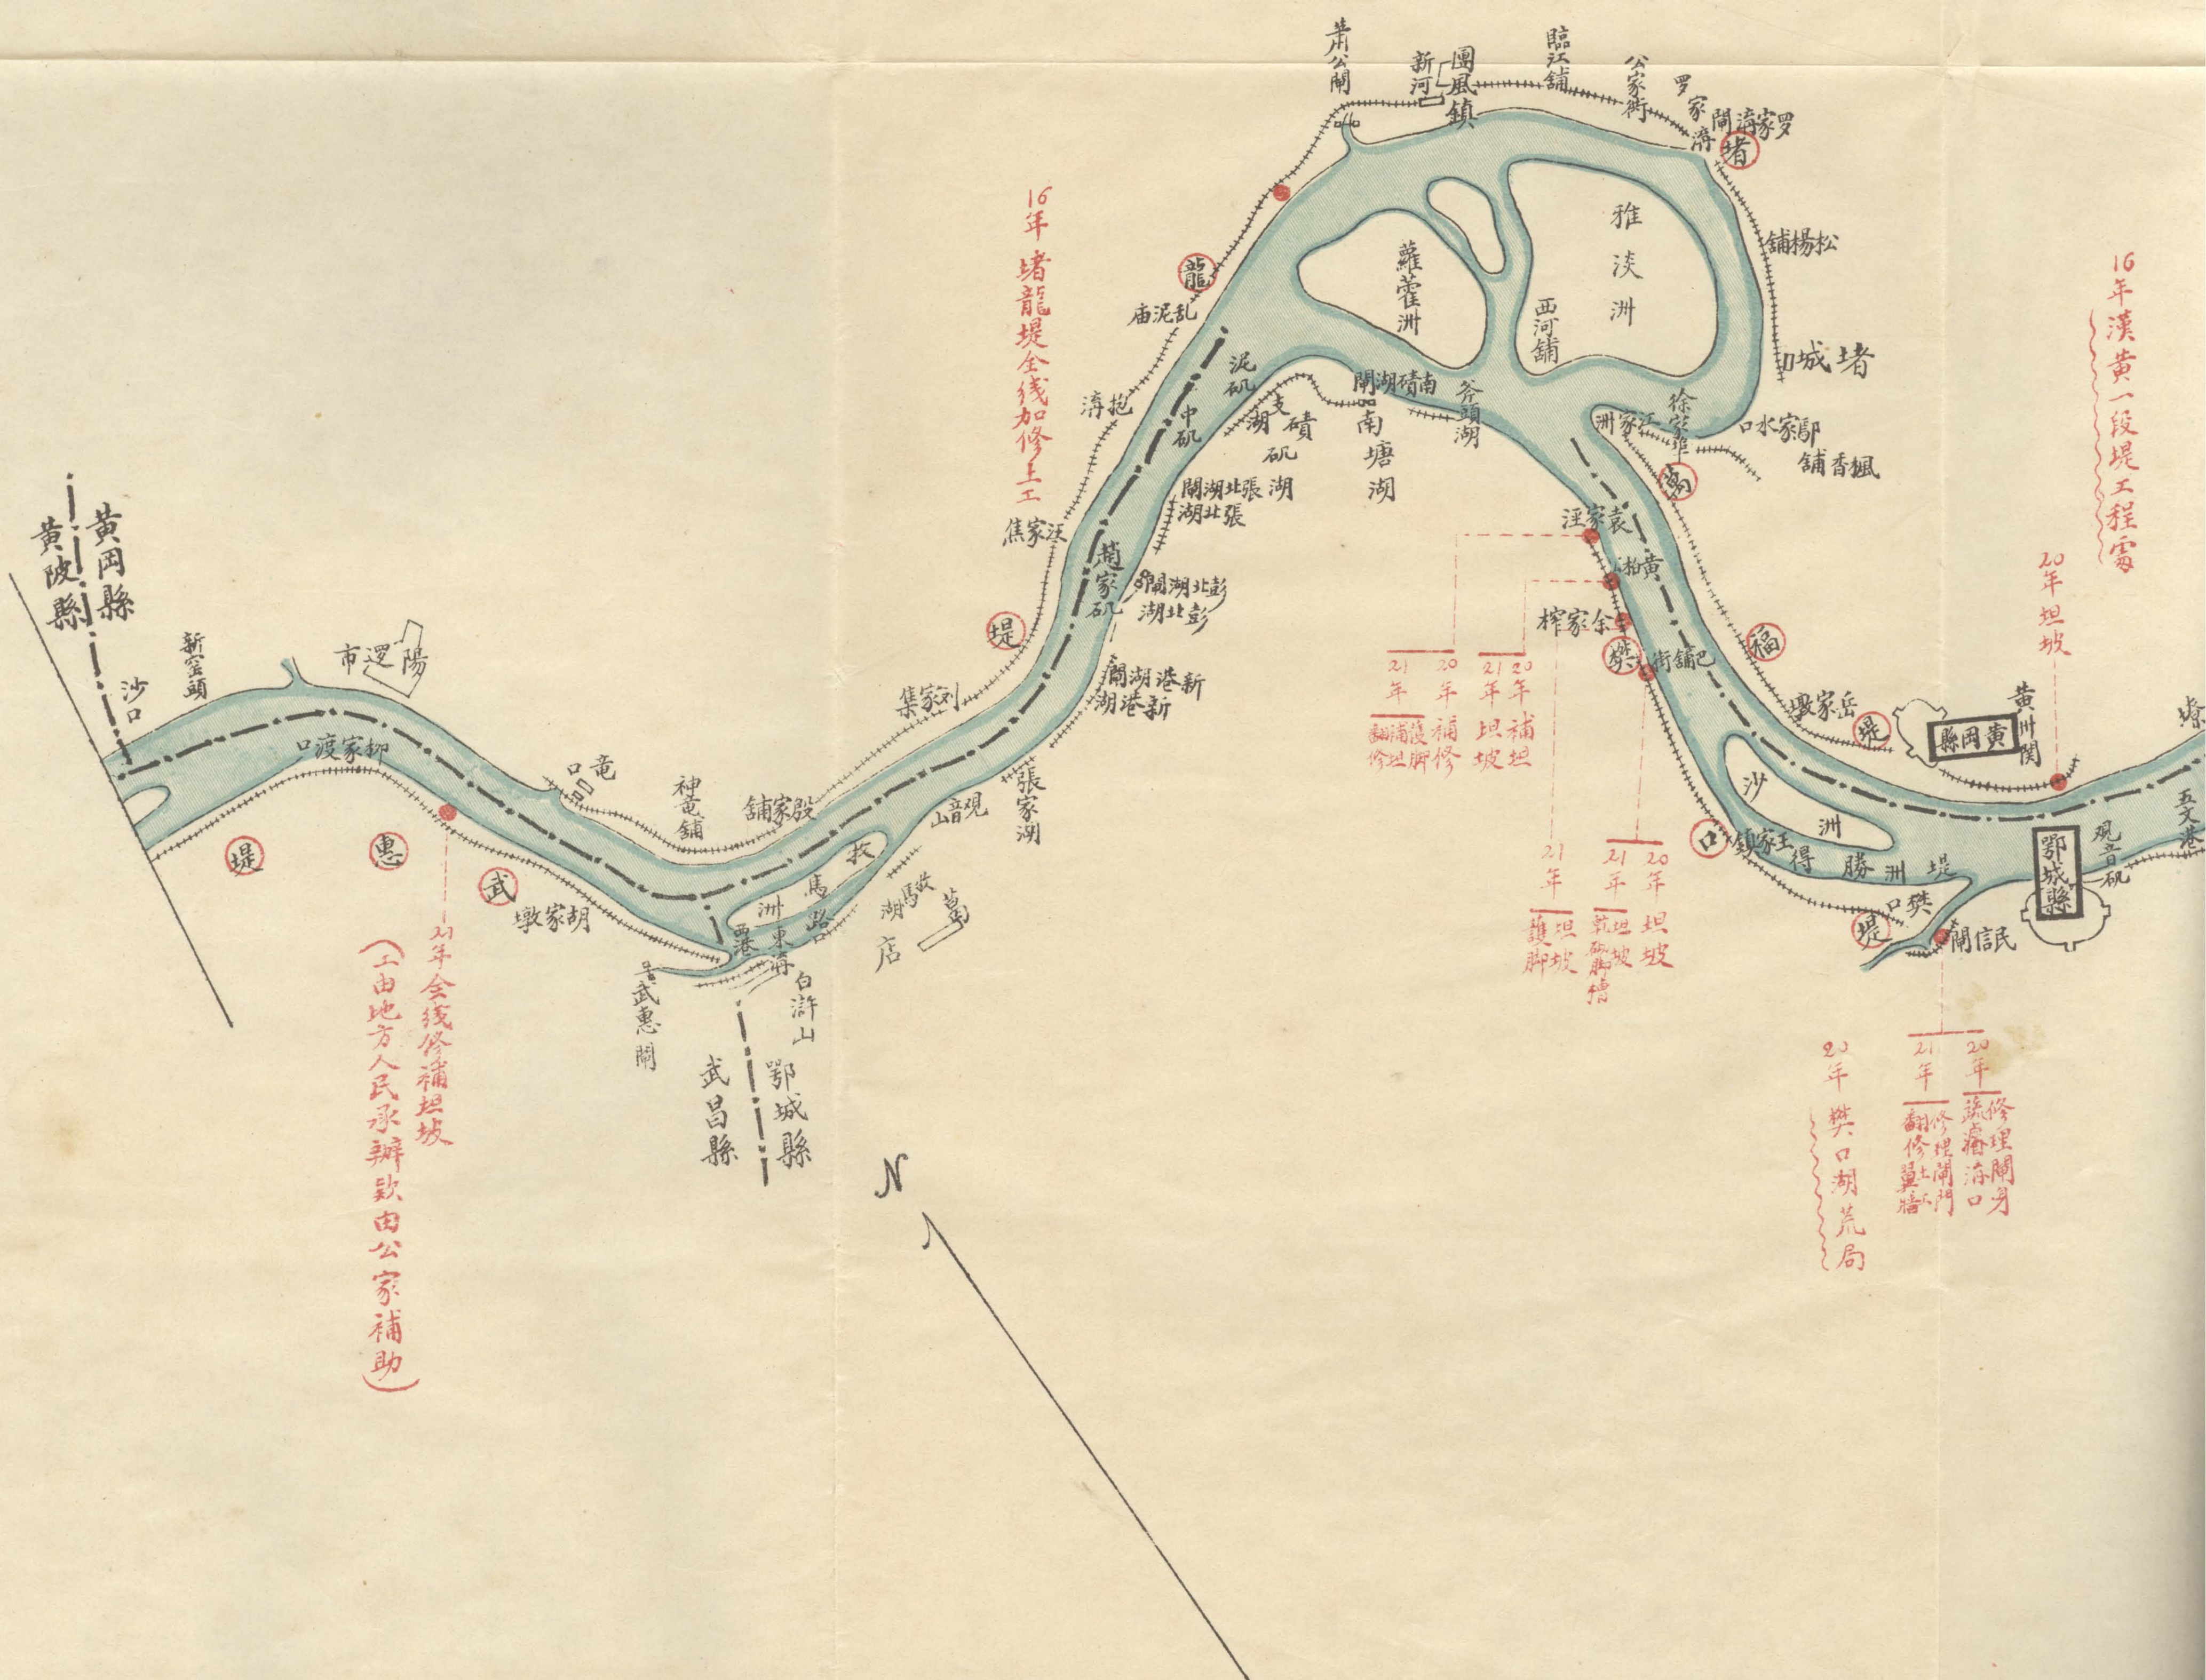
黄岡縣
黄陂縣
沙口
陽邏市
團風鎮
新河
臨江鋪
雅淡洲
蘆雀洲
西河鋪
南塘湖
堵城
16年堵龍堤全綫加修土工
16年漢黄一段堤工程費
20年坦坡
21年全綫修補坦坡
(工由地方人民承辦款由公家補助)
黄州
沙洲
民信閘
20年樊口湖荒局
武惠閘
白滸山
葛店
武昌縣
鄂城縣
N

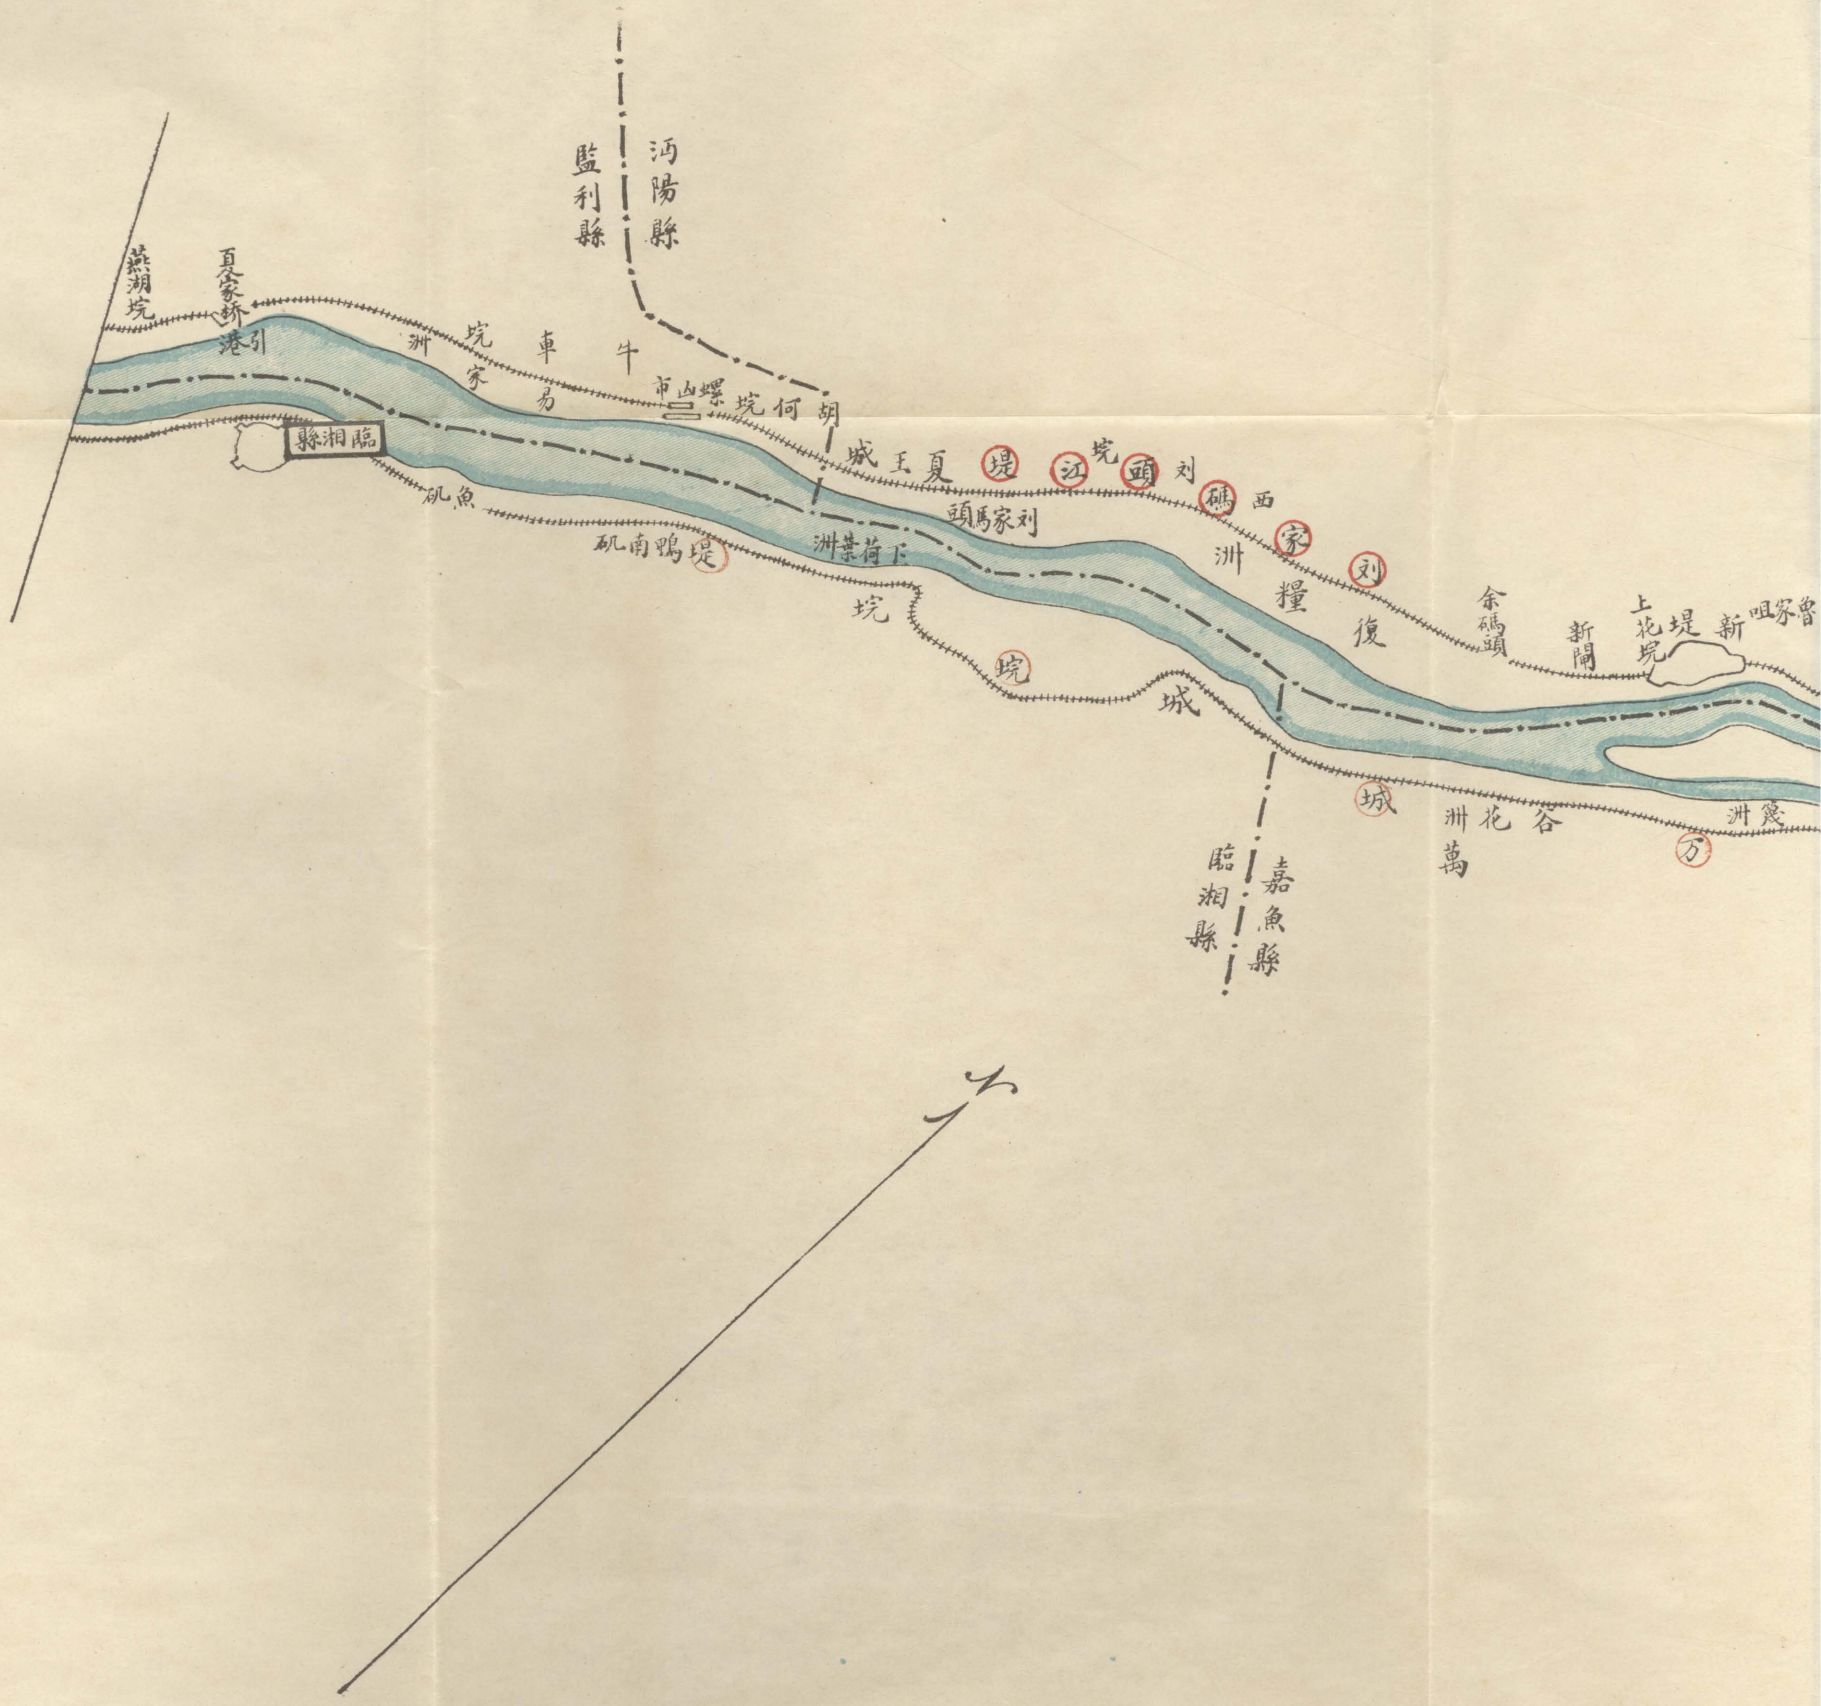
監利縣
沔陽縣
燕湖垸
夏家橋港
引
洲
垸
家
車
易
牛
市
山
螺
垸
何
胡
城
王
夏
堤
江
垸
頭
刘
碼
西
家
刘
洲
糧
復
余碼頭
新閘
上花垸
堤
新
咀家
曾
臨湘縣
矶
魚
矶南鴨堤
洲葉荷下
垸
垸
城
城
洲
花
谷
洲
萬
蔑
万
嘉魚縣
臨湘縣

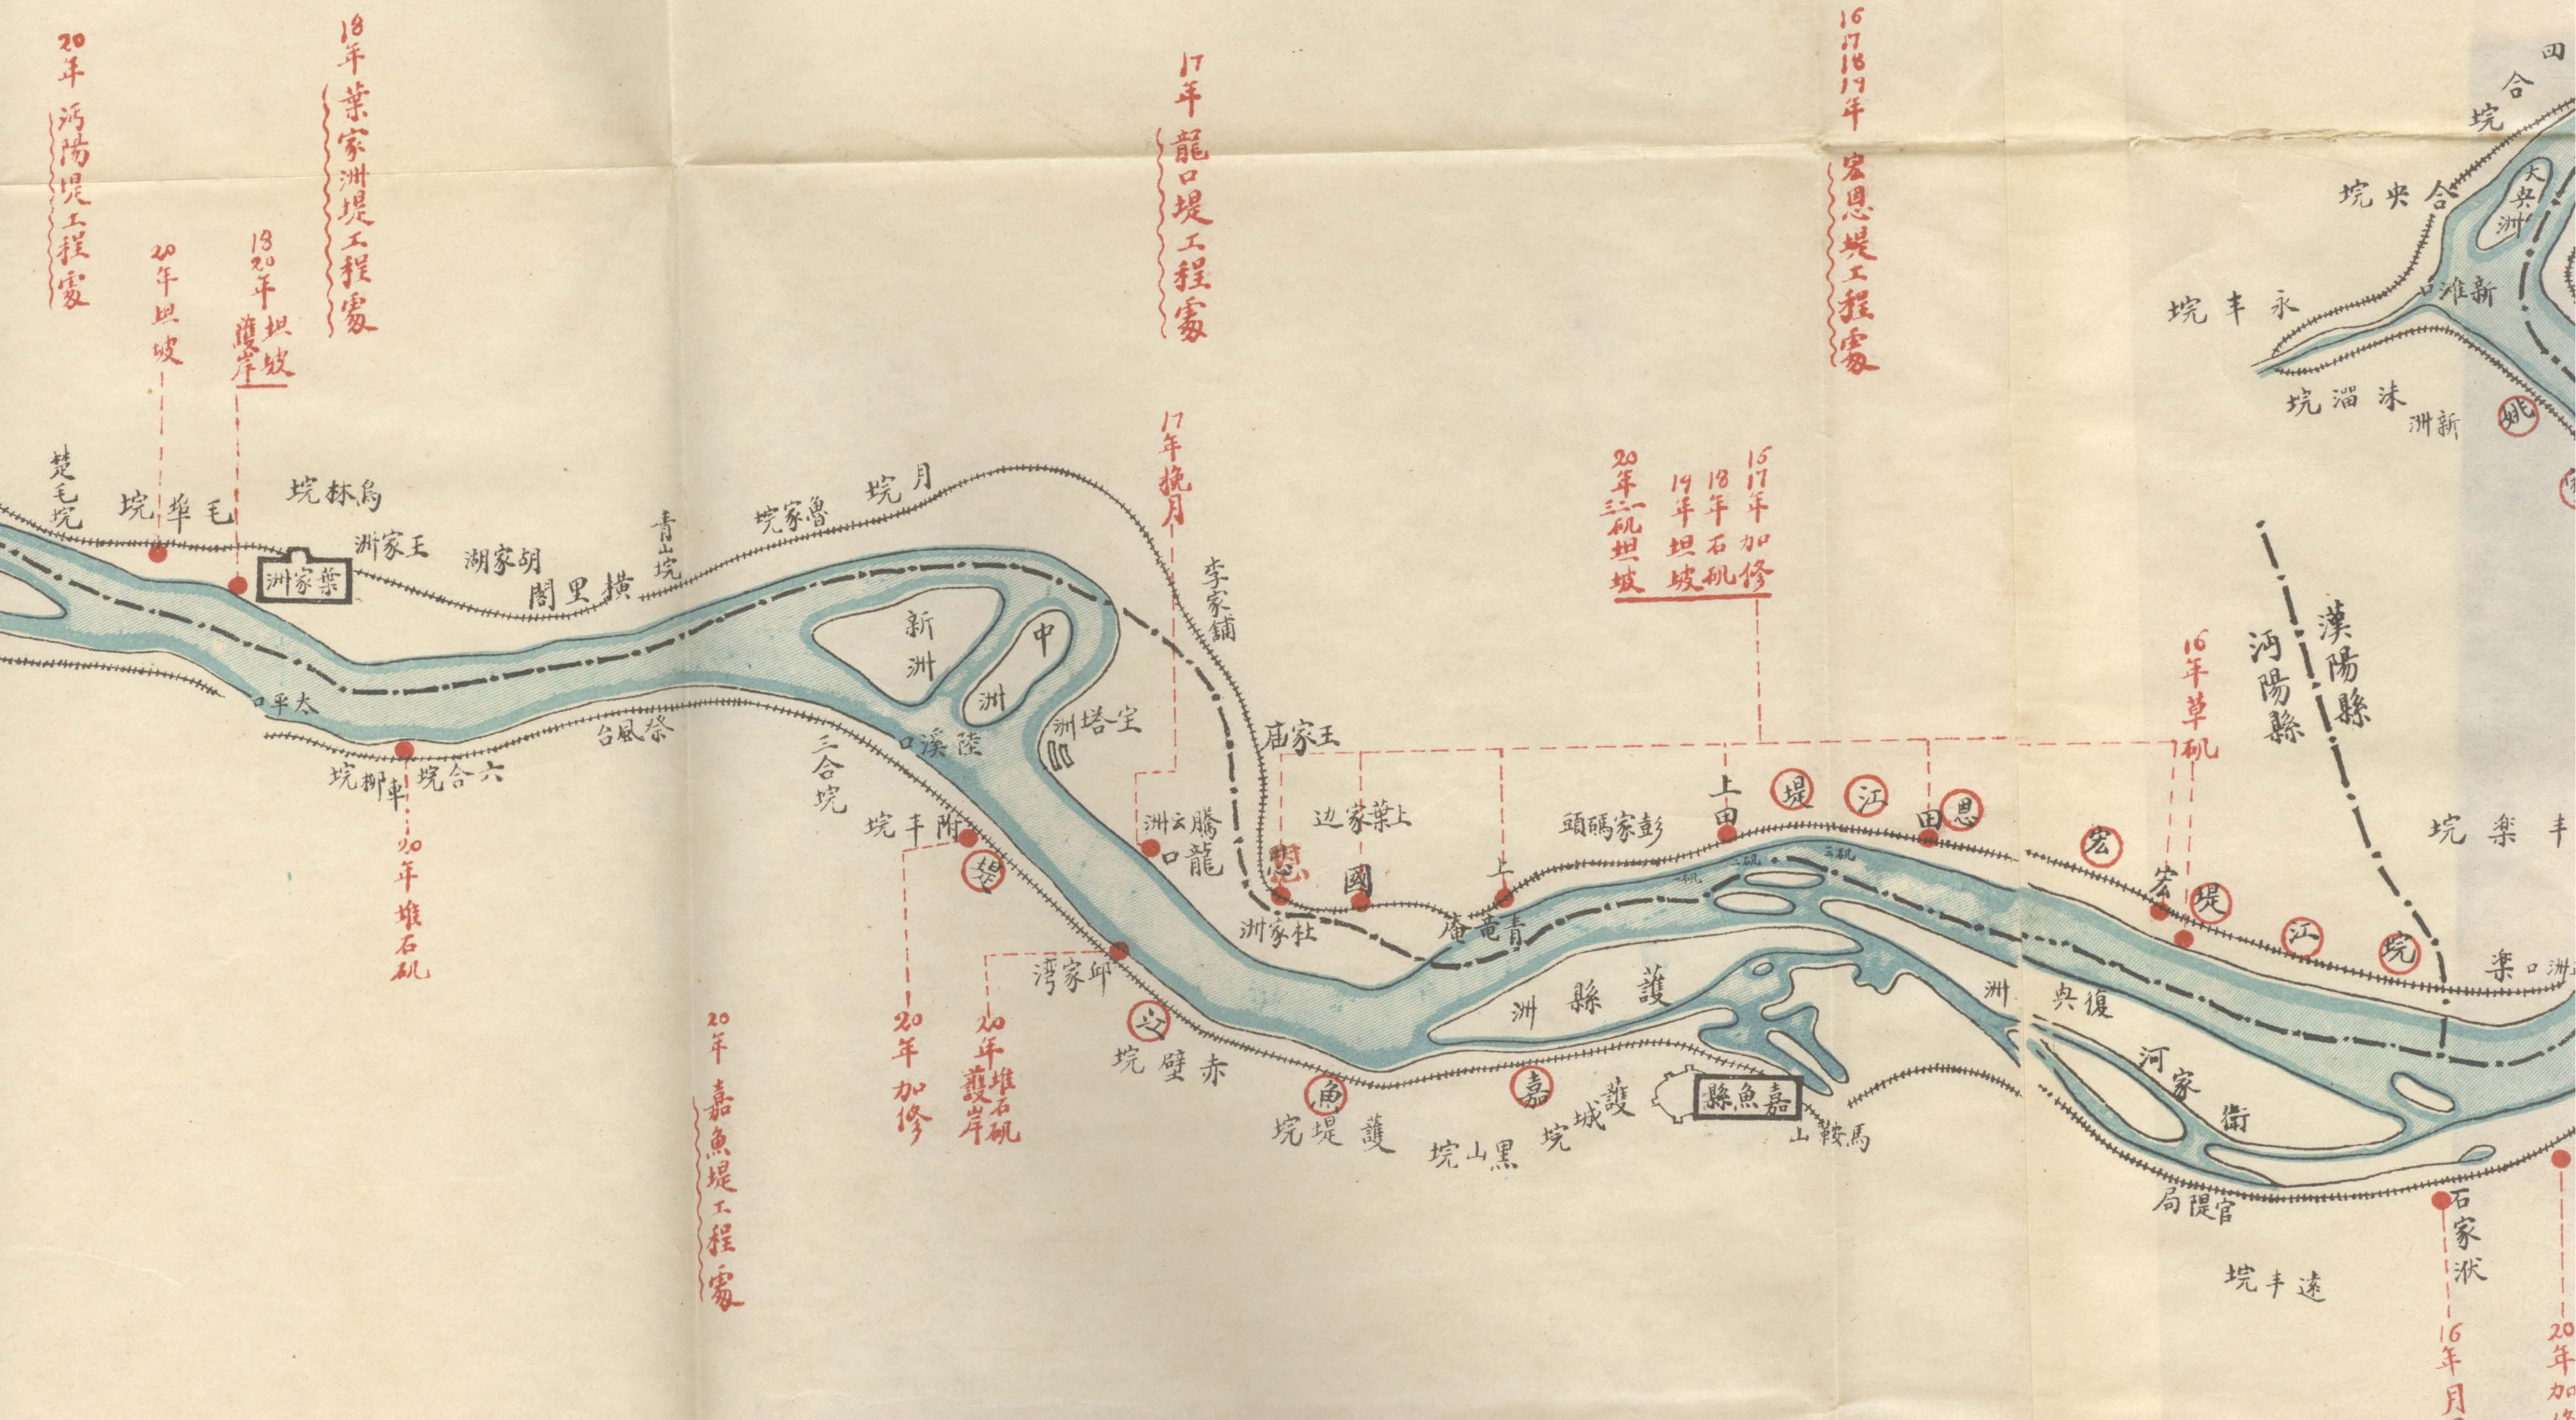

長江堤防圖二

(東自漢口西至監利縣境)

縮尺二十萬分一

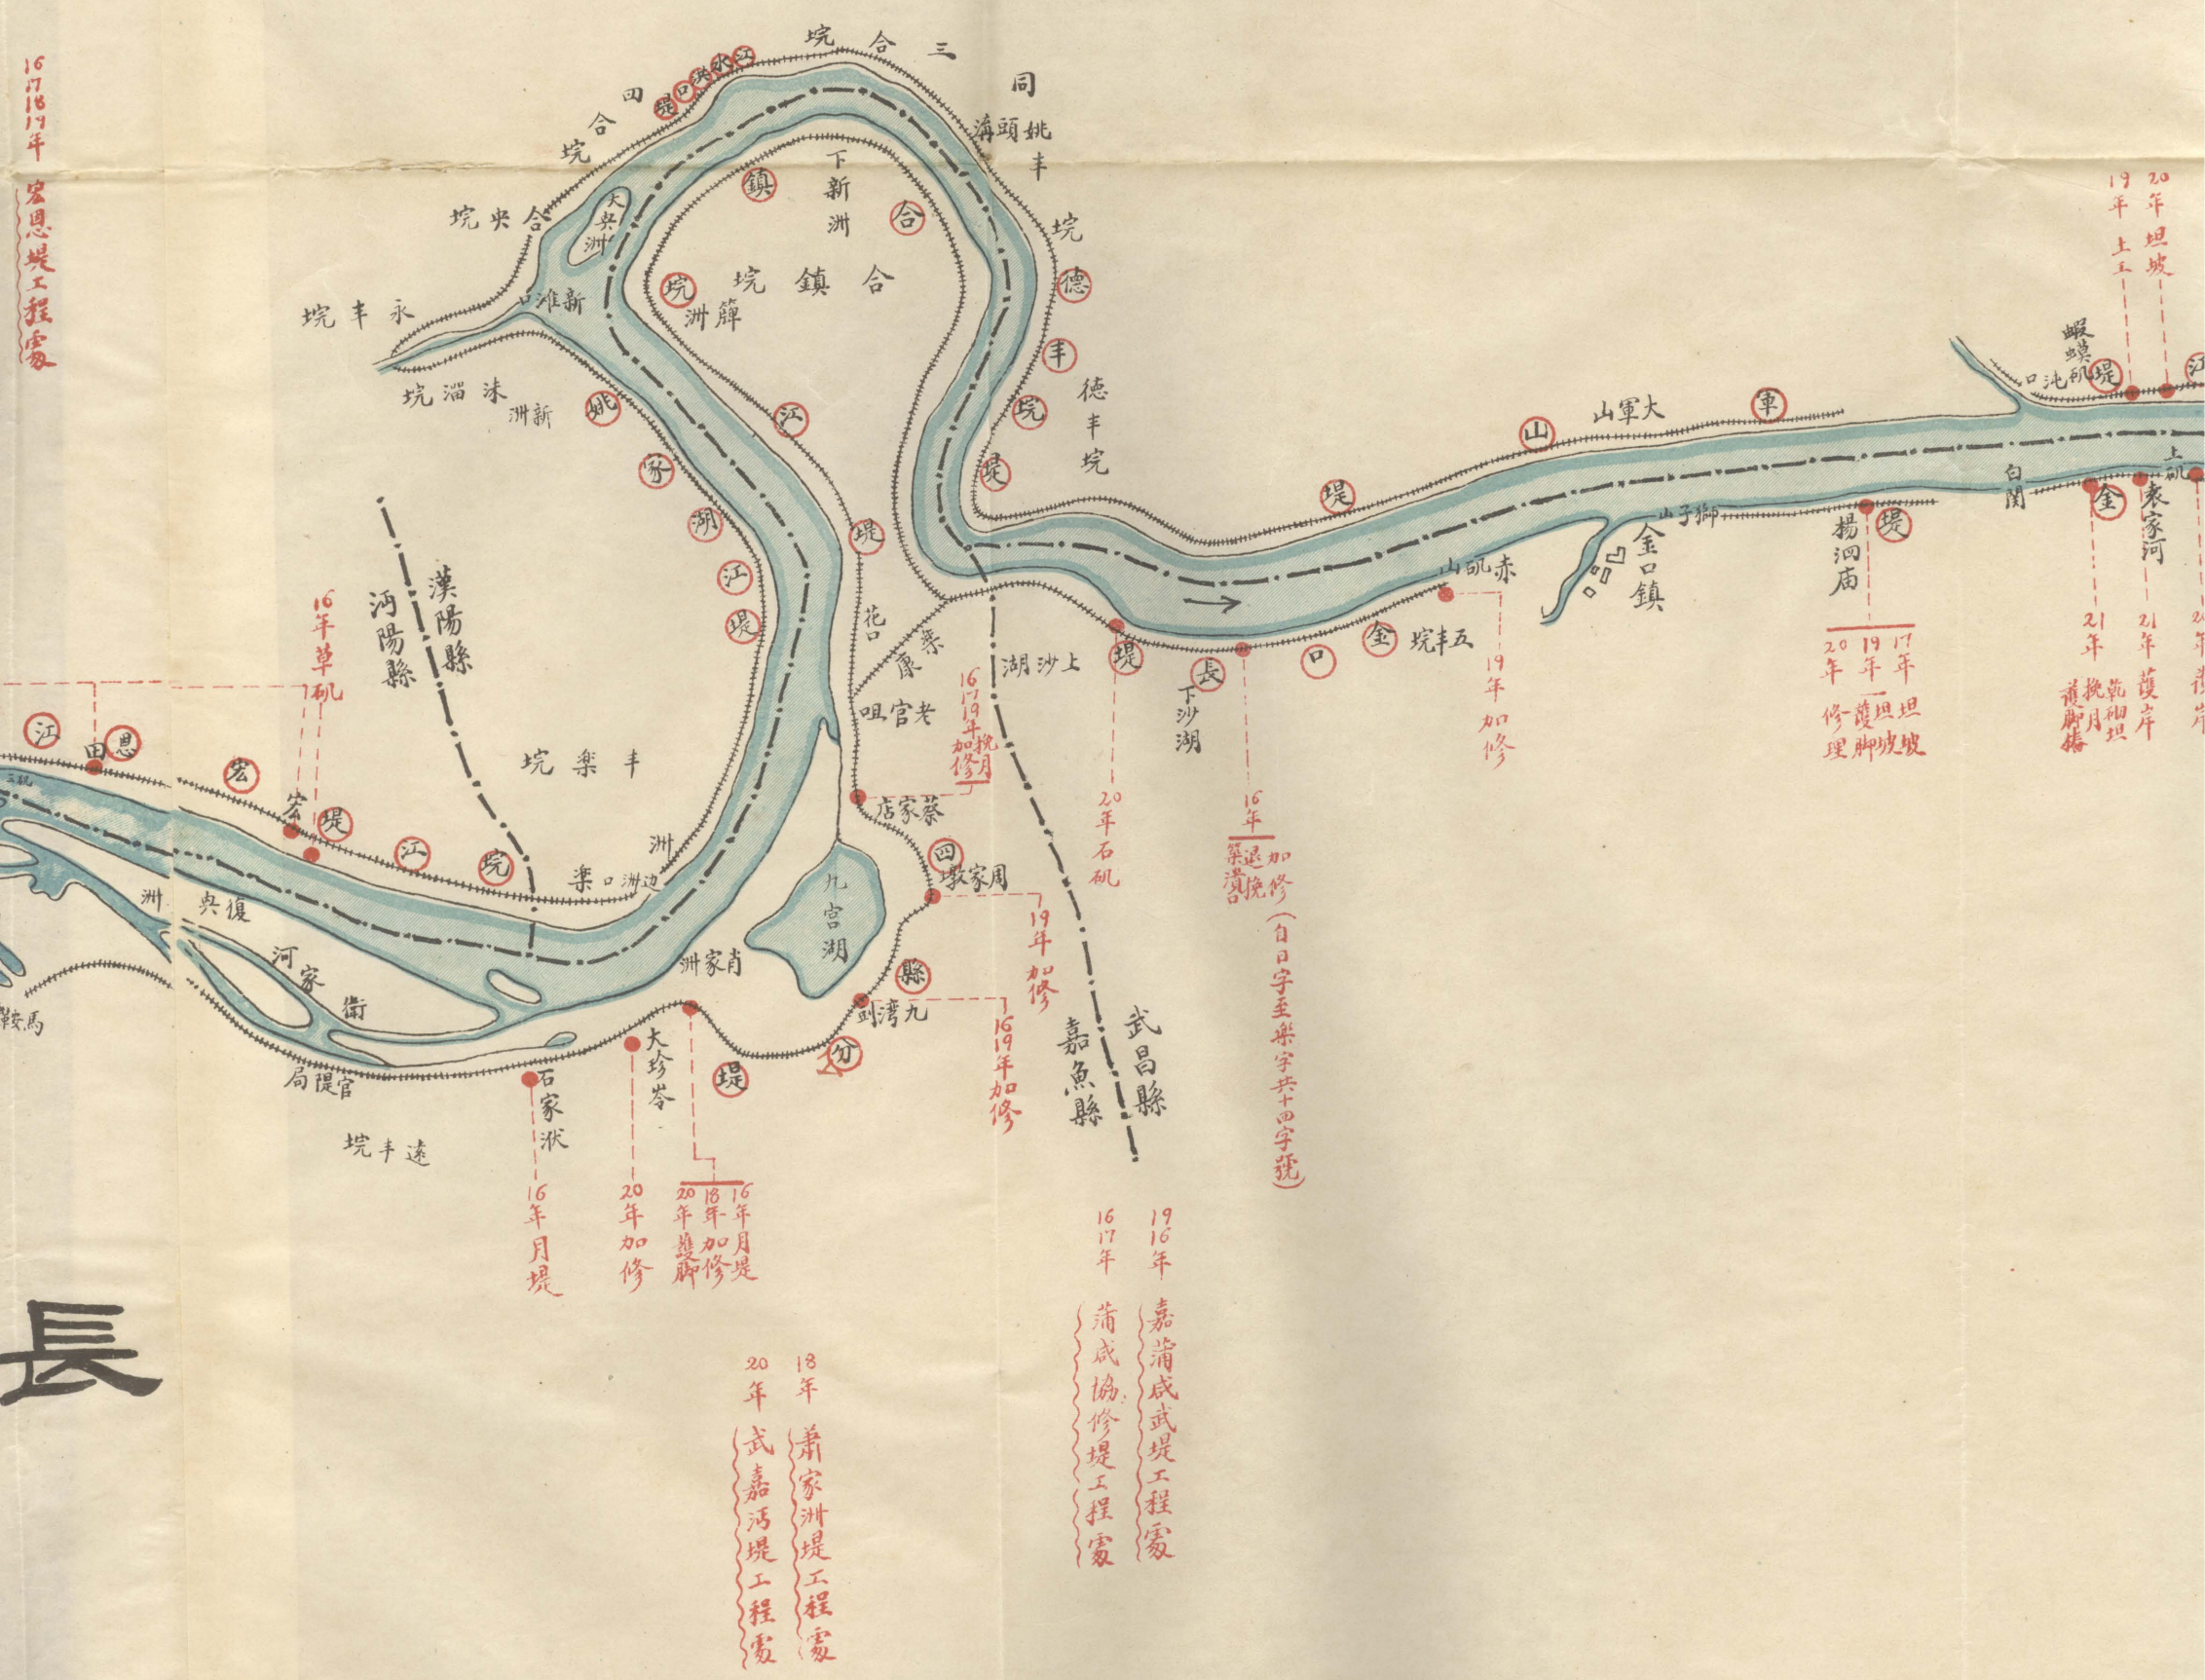
16 17 18 19年 宏恩堤工程處
三合坑
同合坑
四合坑
永丰坑
合坑
淮口
新淮洲
大夾洲
下新洲
合鎮
坑鎮
簰洲
淋洲
新洲
姚穿湖江堤
江堤
丰乘坑
徳丰坑
徳丰坑堤
漢陽縣
沔陽縣
16年草矶
宏恩堤
江田
洲
與復河
家衛
局
官
馬鞍
遠丰坑
石家洲
16年月堤
大珍岑
20年加修
18年加修
20年整脚
16年月堤
肖家洲
九宮湖
九湾
蔡家周
四墩
19年加修
蔡家店
老官咀
花口
16 19年挽月加修
上沙湖
下沙湖
長堤
20年石矶
丰五坑
赤山矶
19年加修
16年築遺退挽加修（自日字至樂字共十四字號）
金口鎮
獅子山
大軍山
山
車
楊泗廟
堤
17年坦坡
19年護脚坦坡
20年修理
白關
金
蝦蟆口
沌口
堤
20年坦坡
19年土工
21年乾砌坦挽月護脚
21年護岸
20年護脚
上矶
袁家河
嘉魚縣
武昌縣
19 16年 嘉蒲咸武堤工程處
16 17年 蒲咸協修堤工程處
18年 蕭家洲堤工程處
20年 武嘉沔堤工程處
長

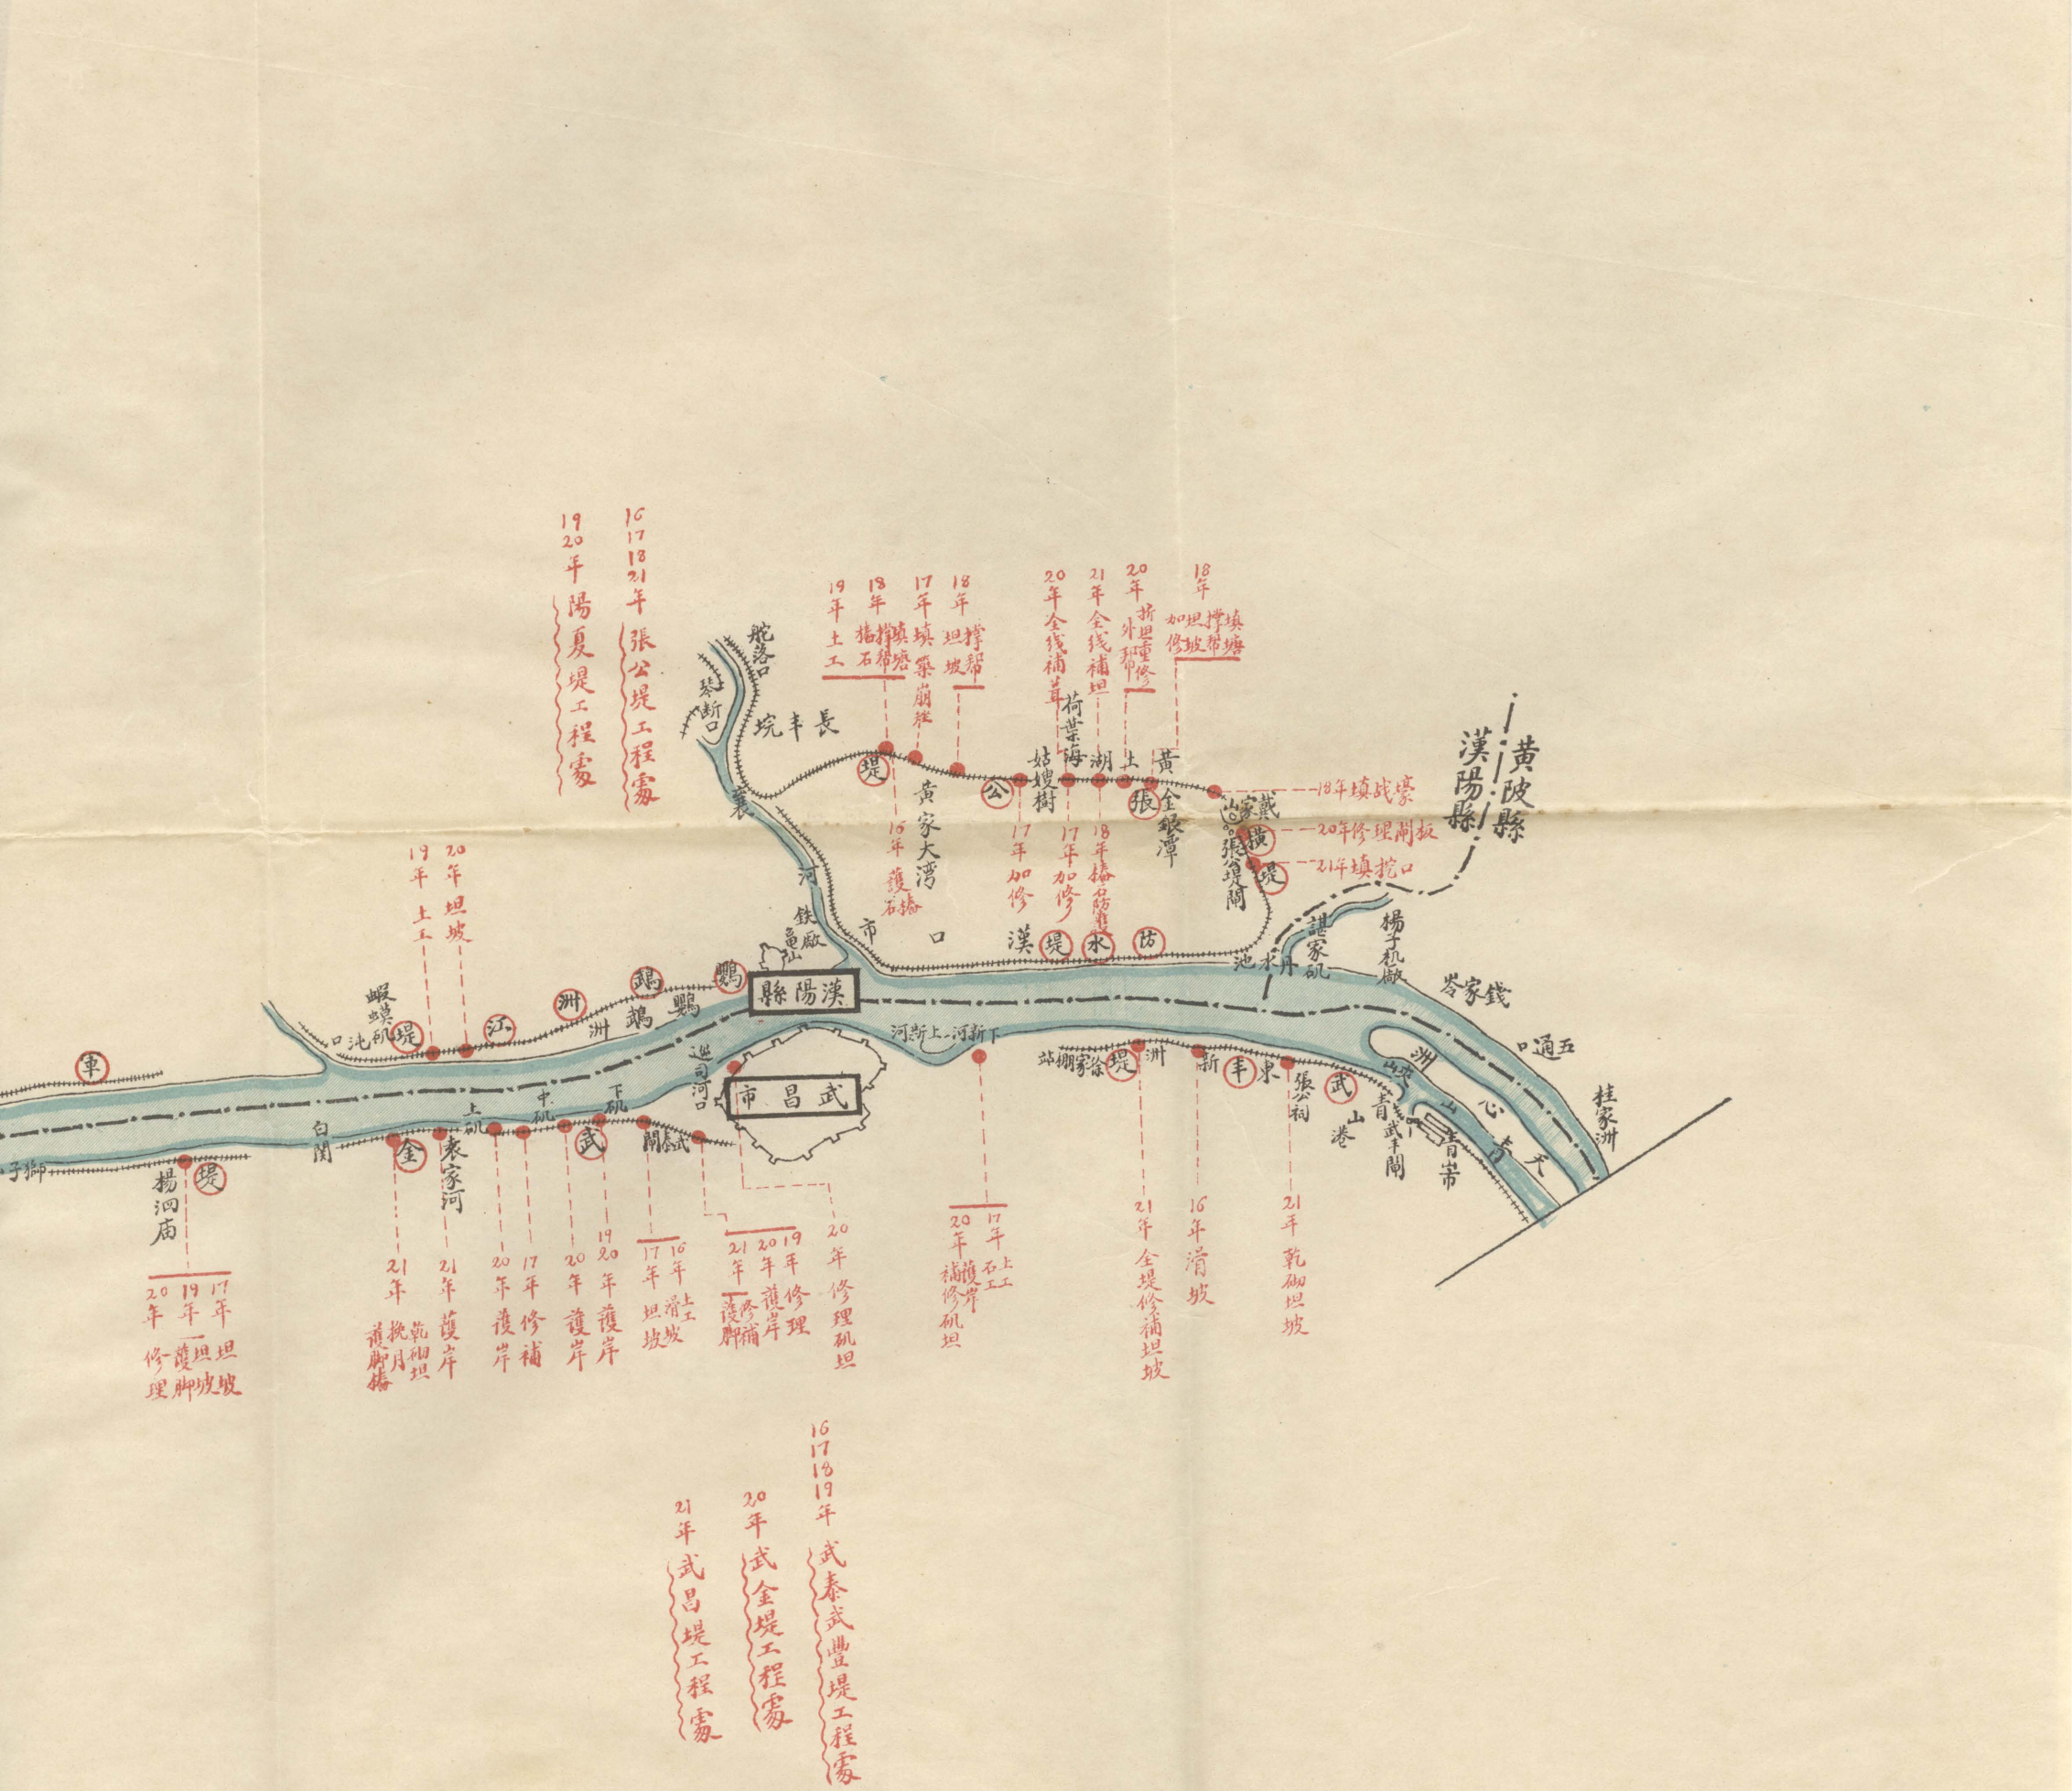
黃陂縣
漢陽縣
武昌市
漢陽縣
長丰坑
舵落口
琴斷口
黃家大灣
荷葉海
姑嫂樹
湖
黃金張潭
戴家山
張家墩閘
謝家矶
楊子机廠
錢家岑
五通口
桂家洲
心大洲
青山港
青武丰閘
青帝
張祠
新丰東
徐家棚站
新上河
新下河
巡司河口
武泰閘
下矶
中矶
上矶
白鶴
鸚鵡洲
汉洲
蝦蟆矶
蝦蟆口
白閘
楊泗廟
獅子
車
堤
公
張
堤
汉
水
坊
堤
武
堤
丰
武
金
堤
18年填战壕
20年修理閘板
21年填挖口
19年土工
20年坦坡
16年護橋石
17年填築崩岸
18年撑帮填塘
18年撑帮坦坡
20年折坦重修外帮
21年金钱補坦
20年金钱補坦
17年加修
17年加修
18年橋石防護
18年填塘撑帮坦坡加修
16 17 18 21年張公堤工程處
19 20年陽夏堤工程處
20年修理矶坦
19年修理護岸
21年修補護脚
17年上工石工護岸補修矶坦
16年上工滑坡
17年坦坡
20年護岸
19 20年護岸
20年護岸
17年修補
20年護岸
21年護岸
21年乾砌坦挽月護脚橋
21年全堤修補坦坡
16年滑坡
21年乾砌坦坡
17年坦坡
19年護脚坦坡
20年修理
16 17 18 19年武泰武豐堤工程處
20年武金堤工程處
21年武昌堤工程處

監利縣
上車湾
崇棣湖
蛮石堆
盤石坑
鳳皇堤
中
南新洲
大馬洲
白沙洲
楊家洲
吳家碼頭
黄公坑
新與坑
楊家台
艾家河
祖師洲
鵝毛洲
老淵堤
窰坵塔
湖市塔
史家坑
章華港
雁
江
頂
永
陳公東坑
青何湾
葉廟王
碼頭
安瀾月堤
史家花坑
中車湾
大定月堤
下車湾
銀杏月堤
腦家湾
萬耳月堤
陶家畈
新換坑
文固坑
趙家滩
孫家鋪
殷馬洲
順與
廣興洲市
下楊葉坑
鄉
沙城坑
荆河舊道
卜安洲
新閔河口
瓦子坑
江
白螺市
永石坑
殷公坑
青泥坑
李家月堤
道人矶
現音洲
荆河腦堤

17 18 19 20 21年 監利三帝廟堤工程處

17年 搶護
18年 三矶護岸 填土
18年 月堤 加修
19年 挽月 護岸
20年 護脚
21年 護岸

20年 護岸

20年 堆石

20年 護岸

16年 加修
17年 閘鎖口
19年 撑帮

17年 内帮
20年 護脚 加修
21年 拋護

19年 撑帮

16 17 18 19 20 21年 車湾堤工程處

20 19 16年 挽月
18 17年 石矶
21 20 19年 二矶護岸

20 19年 挽月

18年 月堤

17年 陳公東坑堤工處

17年 修補

長江堤防圖三

（東自監利縣境起西至江陵縣止）

縮尺二十萬分一

荆江大堤上起堆金台下迄拖茅埠計長二百餘里由荆江堤工局管理下設萬(城)李(家埠)江(陵)沙(市)登(南)馬(家嘴)郝(穴)金(果寺)拖(茅埠)九分局該堤在前清乾道年間曾經潰決由國帑修復至今百餘年迄未出險所有歷年工程皆屬歲修範圍經費由地方担任政府略有補助計十六年八千元十七九年各二萬元後因地方凋敝徵

20年填戗壕

20年拋石

21年拋石

20年拋石

20年拋石

20年拋石

20年拋石

20年填戗壕

21年拋石

21年拋石

21年培修

21年朱三弓堤工監修處

荆江大堤終點

21年石首縣繞池至公安西湖廟培修

21年公石堤工程處

19年挽月護岸

19年黃家拐堤工程處

17年陳公東坑堤工處

17年修補

21年護岸

21年填修潰口

監利縣

江陵縣

石首縣

公安縣

繞池口

拖茅埠

朱三弓

毛乃坑

馬鞍坑

良山坑

麻布拐

堤頭市

盂蘭坑

盂蘭市

盂江

黃洋洲

章華港

鵝毛洲

祖師洲

雁洲

永錫合北坑洲

頂江

陳公東坑

陳公西坑

公東

東坑

新錫坑

張智南坑

張智北坑

易家坑

葉家坑

東周坑

朱家湖

劉家濟

朱坊湖

萬

罗家湾

永定堤

盂家堤

金果寺城

衛國坑

巴坑

泥

張惠東坑

張惠北坑

新惠

三易坑

易家坑

張湖坑

大夾湖

同人坑

罗坑

上三合坑

下三合坑

城

梅肇坑

駝羊樹

張惠南坑

沙邱坑

墨良洲

黃家拐

橫堤

橫坑

平湖

天心洲

林揚市

護堤坑

太平坑

天與坑

天合坑

文昌坑

黃都坑

麻雀咀

姚公堤

柳梓洲

黃水套

石首縣

公安縣

下双渊

洪水渊

田家坊

范家坑

上下新塘

李家埠

郝

龍穴二渊

下泛孚湖

上泛湖子

双聖潭塘

祁家湖

中和垸

馬家咎塘

方家洲

升子洲

黃水套

黃家渡坊

郭市巷

涂

東大坑

潘家坑

朱湖

朱家湾

荆江大堤上起塘金台下迄拖茅埠
計長二百餘里由荆江堤工局管理下
設萬(城)李(家埠)江(陵)沙(市)登(南)馬
(家咀)郝(穴)金(果寺)拖(茅埠)九分局該
堤至前清乾道年間曾經潰決由
國帑修復至今百餘年迄未出險所
有歷年工程皆屬歲修範圍經費
由地方担任政府略有補助計十六年
八千元十七八九年各二萬元後因地方凋敝徵
費困難呈准增加補助費及特險工款
計廿年十萬元廿一年八萬餘元故圖
上標明工程種類自廿年始每該堤
土工全歲年有加培故除標明石工
外其土工地點概從略省

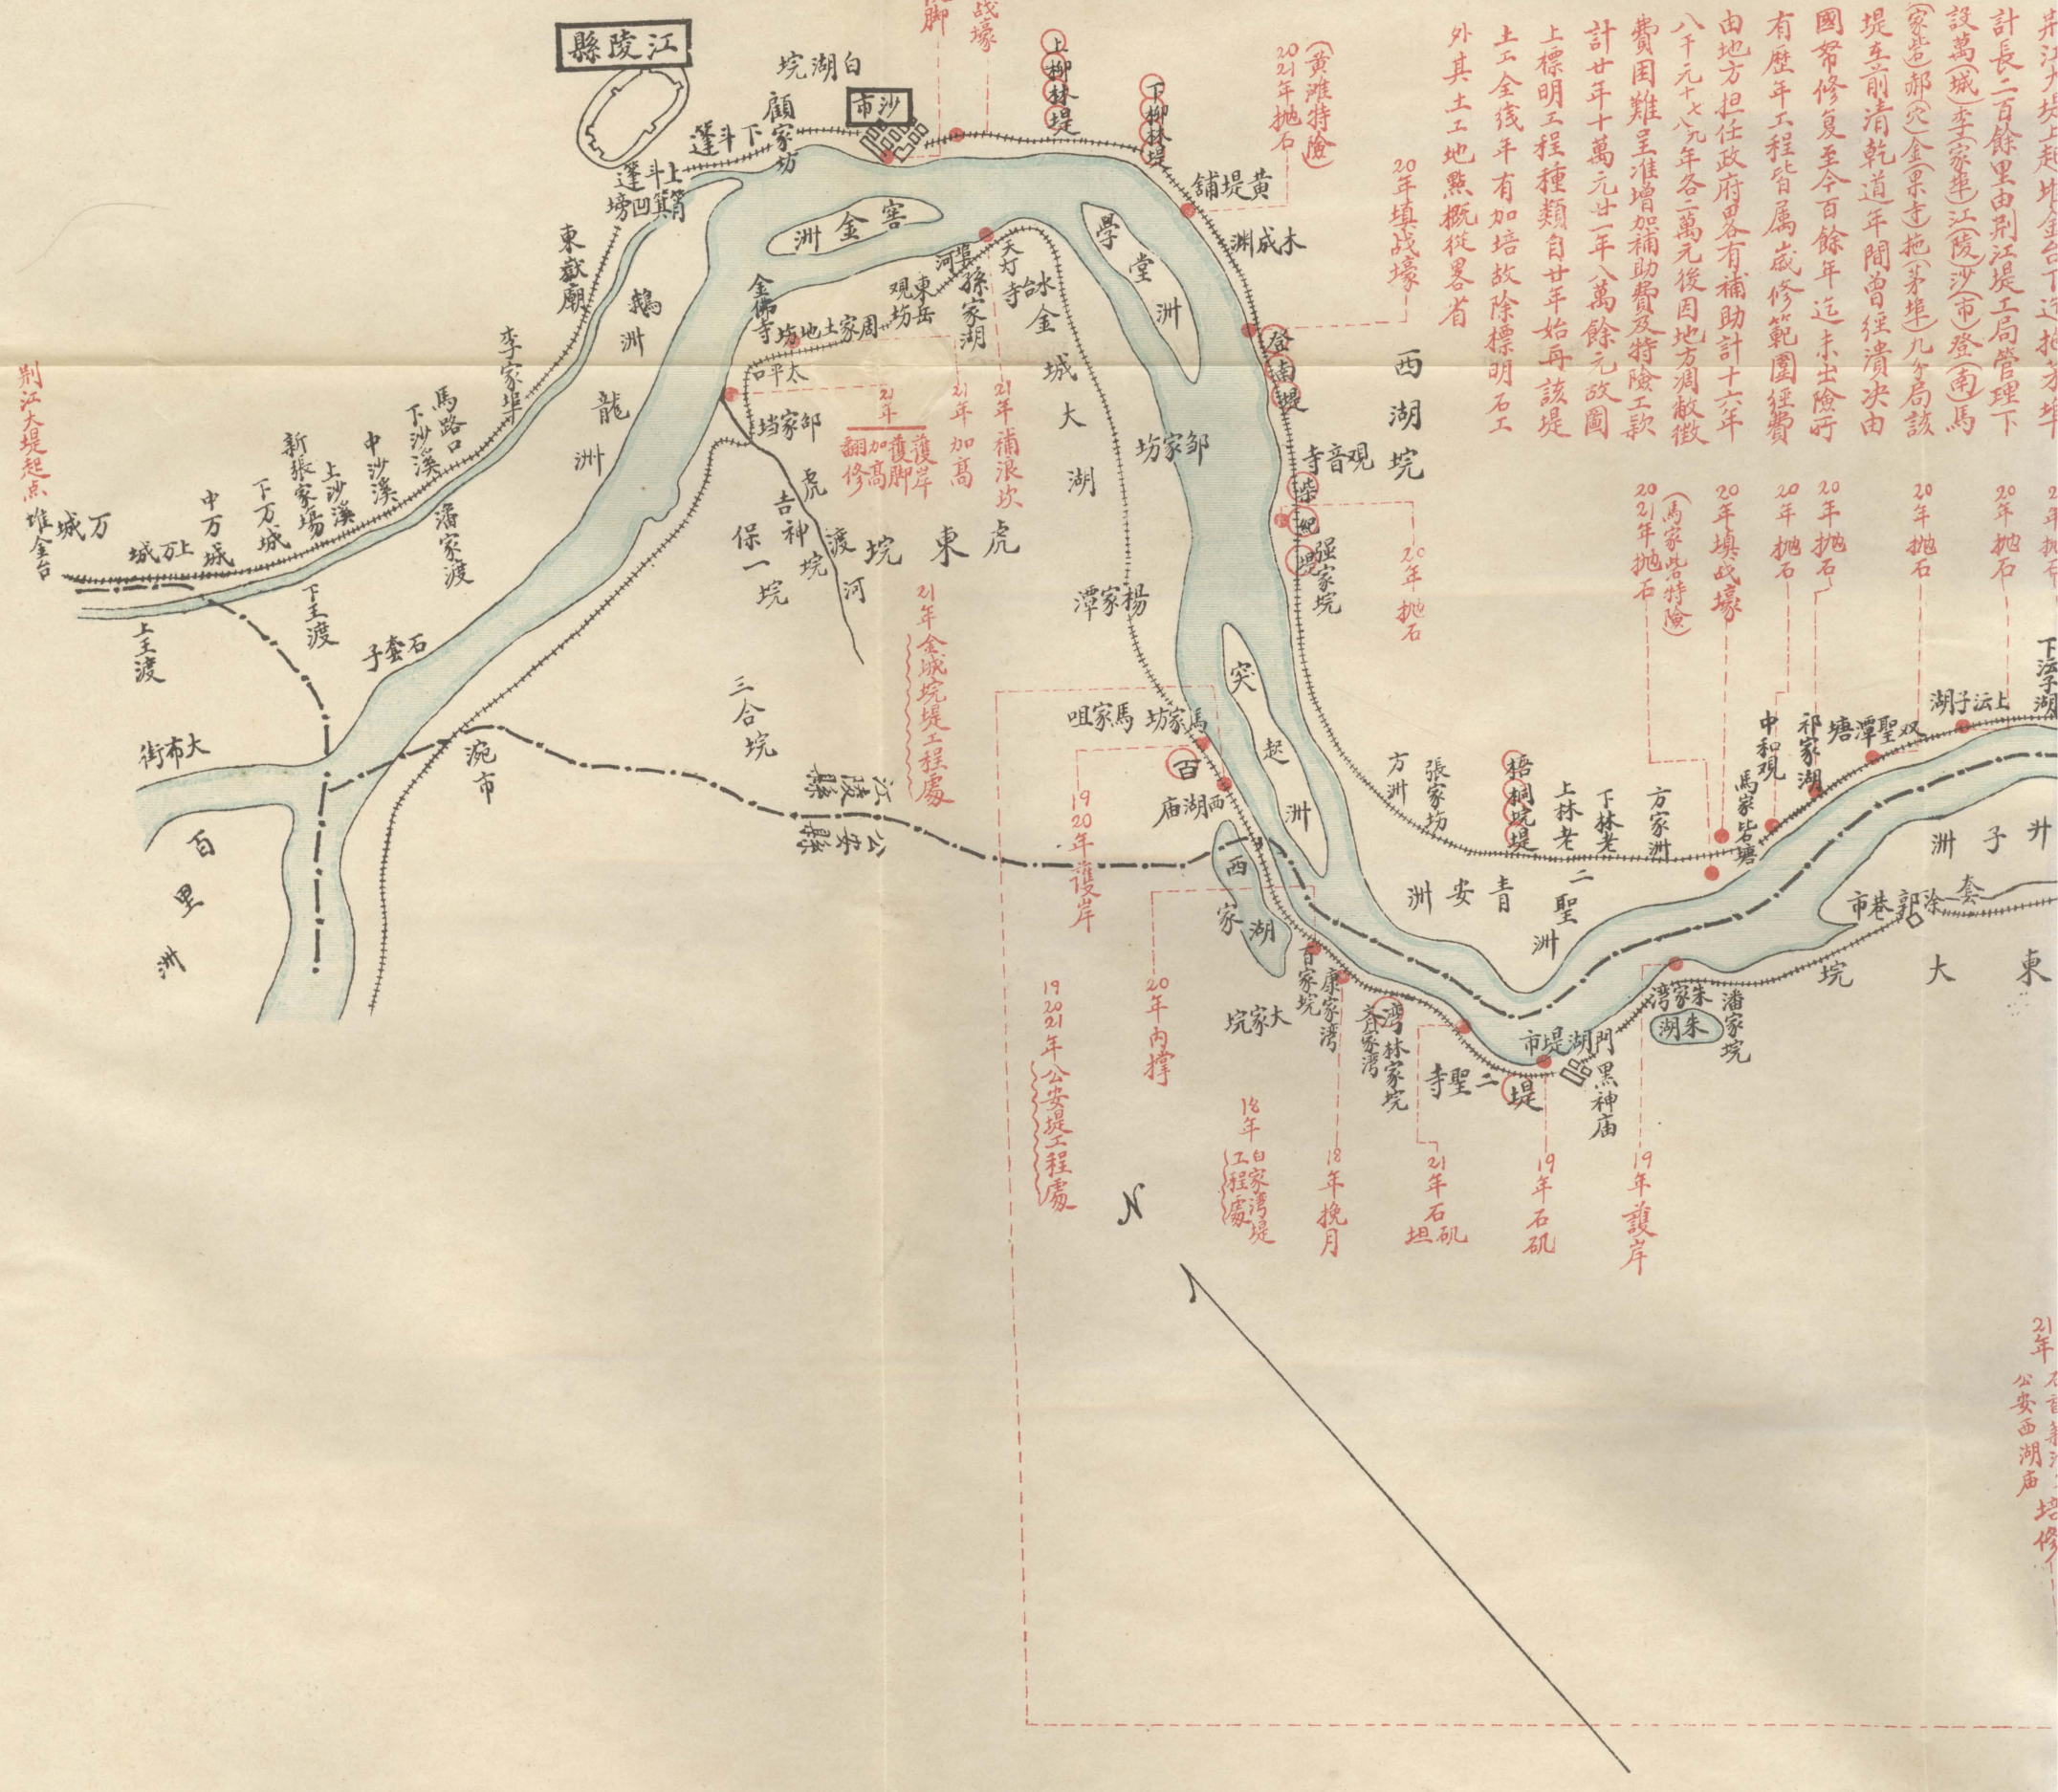

21年石首美洲公安西湖庙垸修

漢
石支墩
舵落口
山女仙
杜家祠
公
張
城
漢口
大
江

襄河堤防圖一

(自東漢口起西迄仙桃鎮止)

縮尺十萬分一

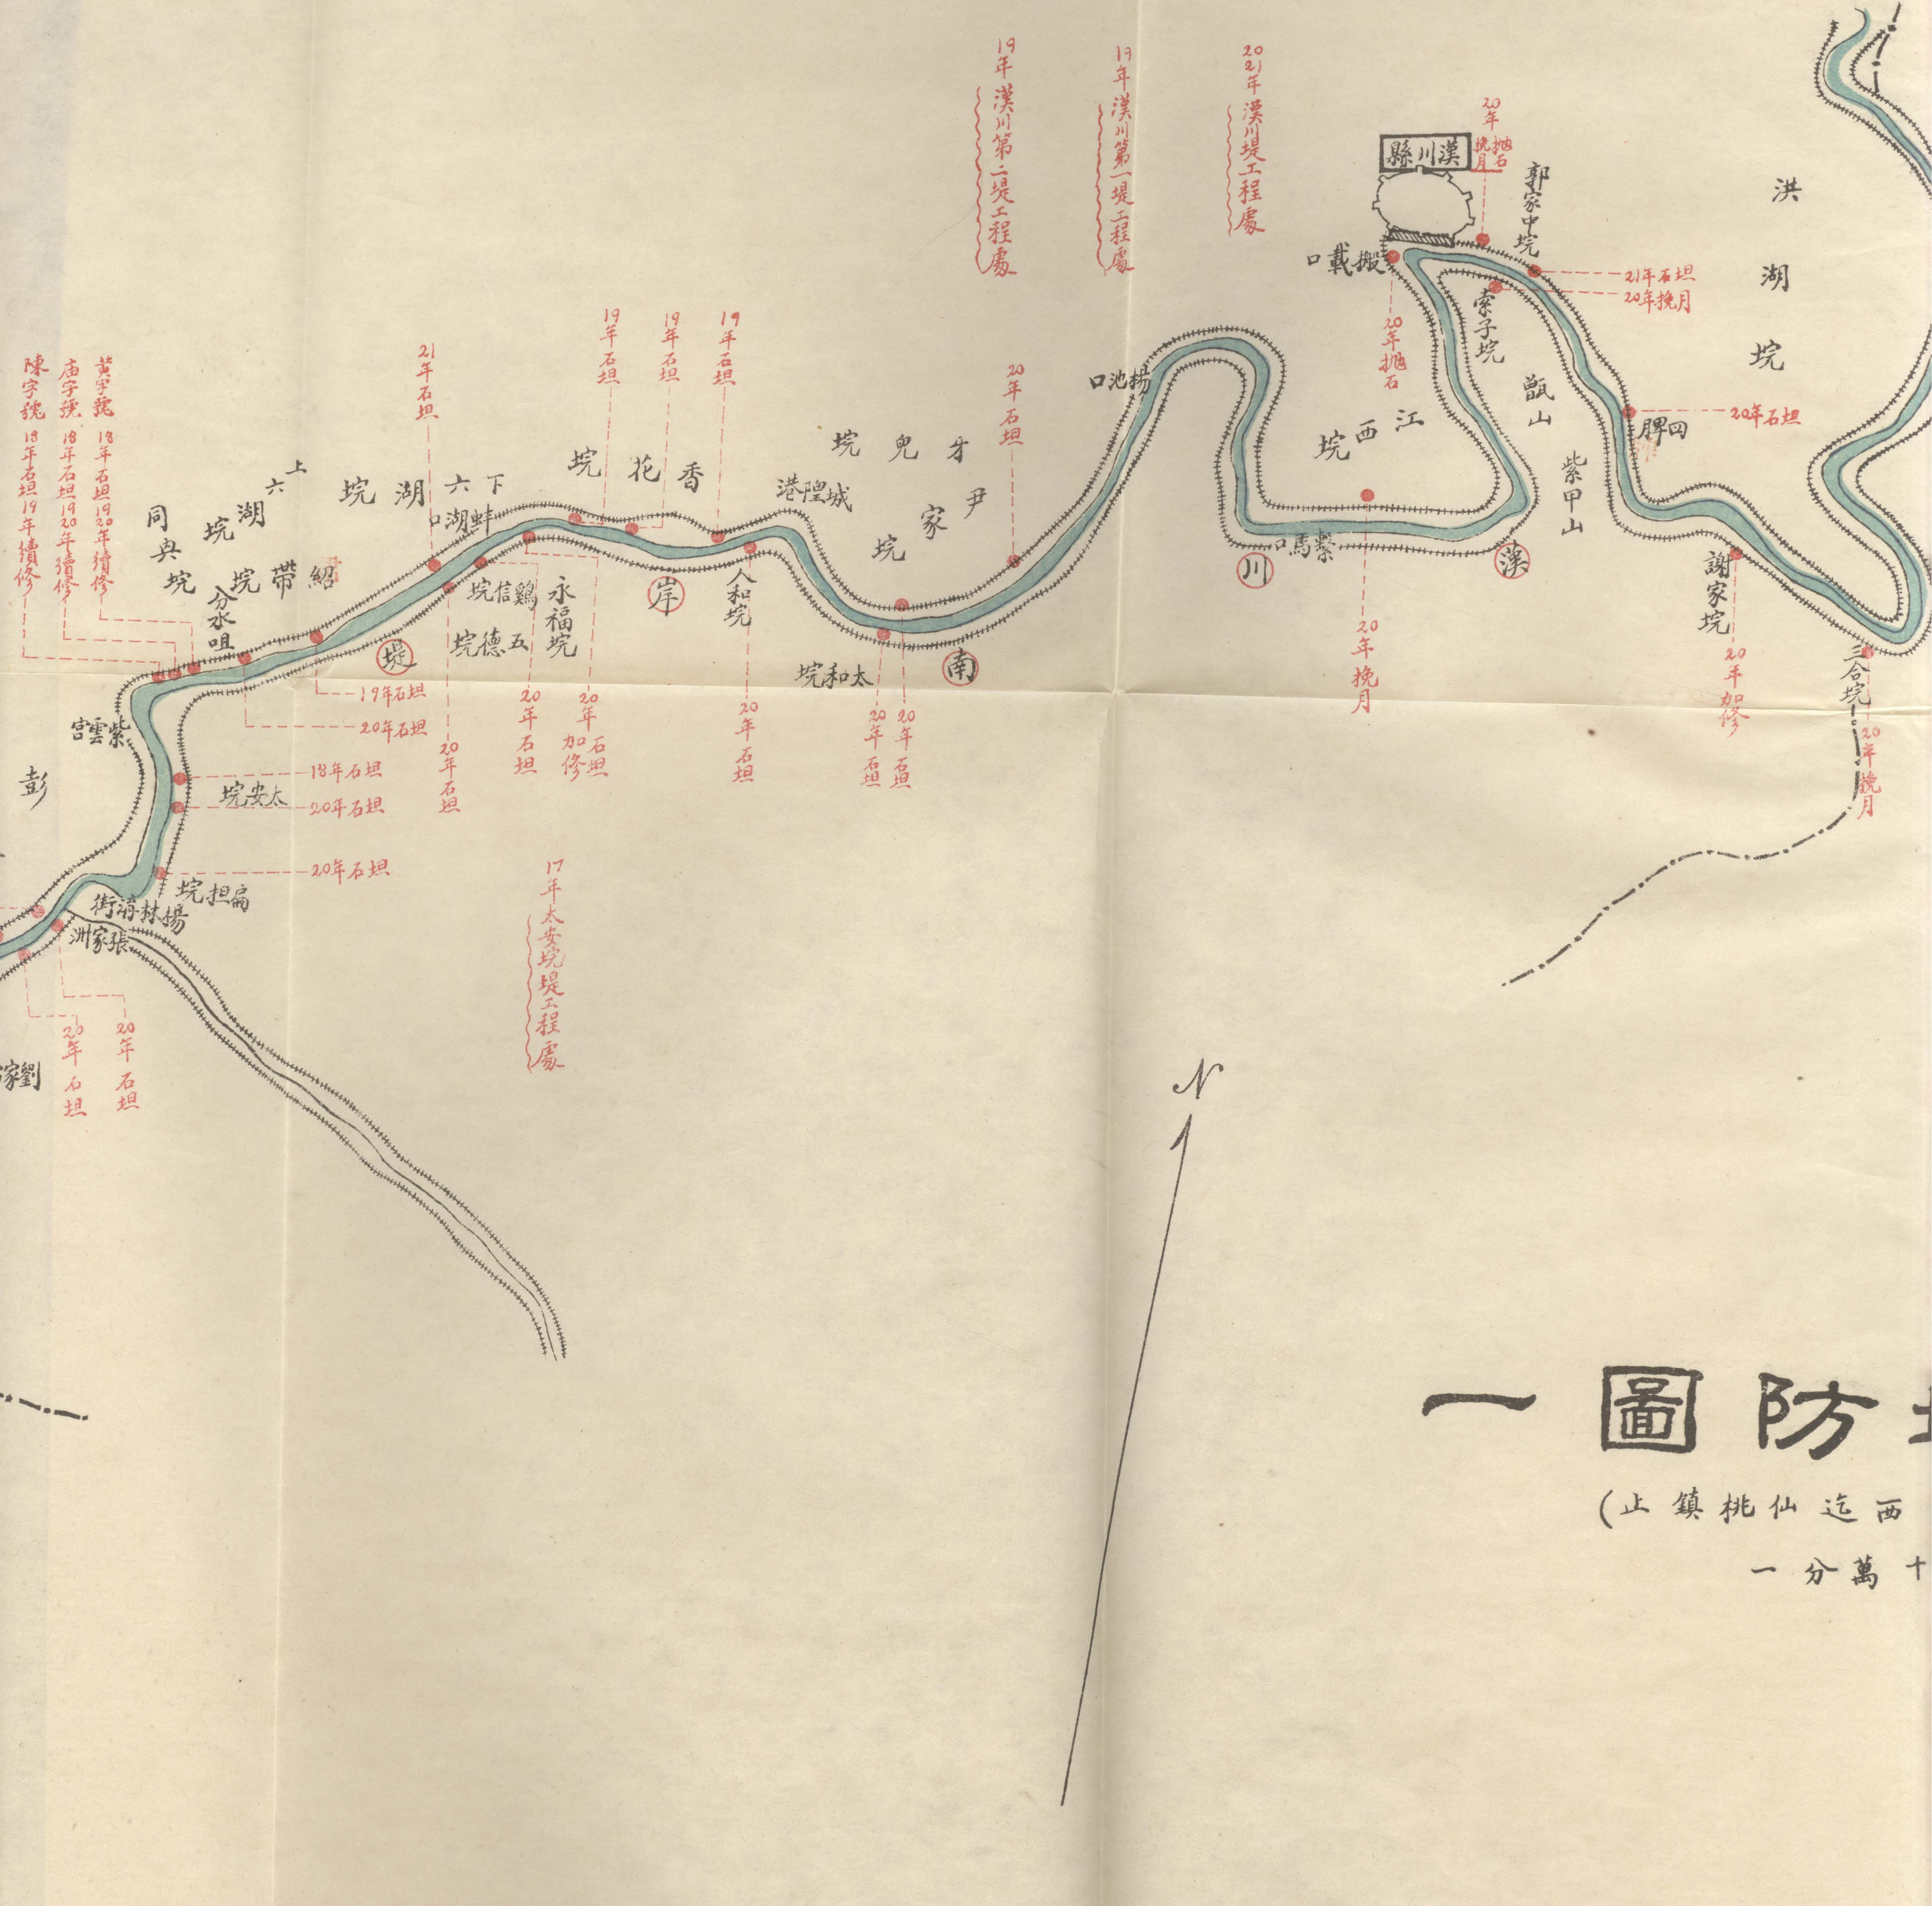
堤防圖一
(西迄仙桃鎮上
十萬分一
漢川縣
漢川第二堤工程處
漢川第一堤工程處
漢川堤工程處
太安垸堤工程處
洪湖垸
江西垸
甑山
紫甲山
尹家垸
香花垸
湖垸
同興垸
紫雲宮
太安垸
永福垸
太和垸
謝家垸
三合垸
張家洲
漢
川
南
岸
堤

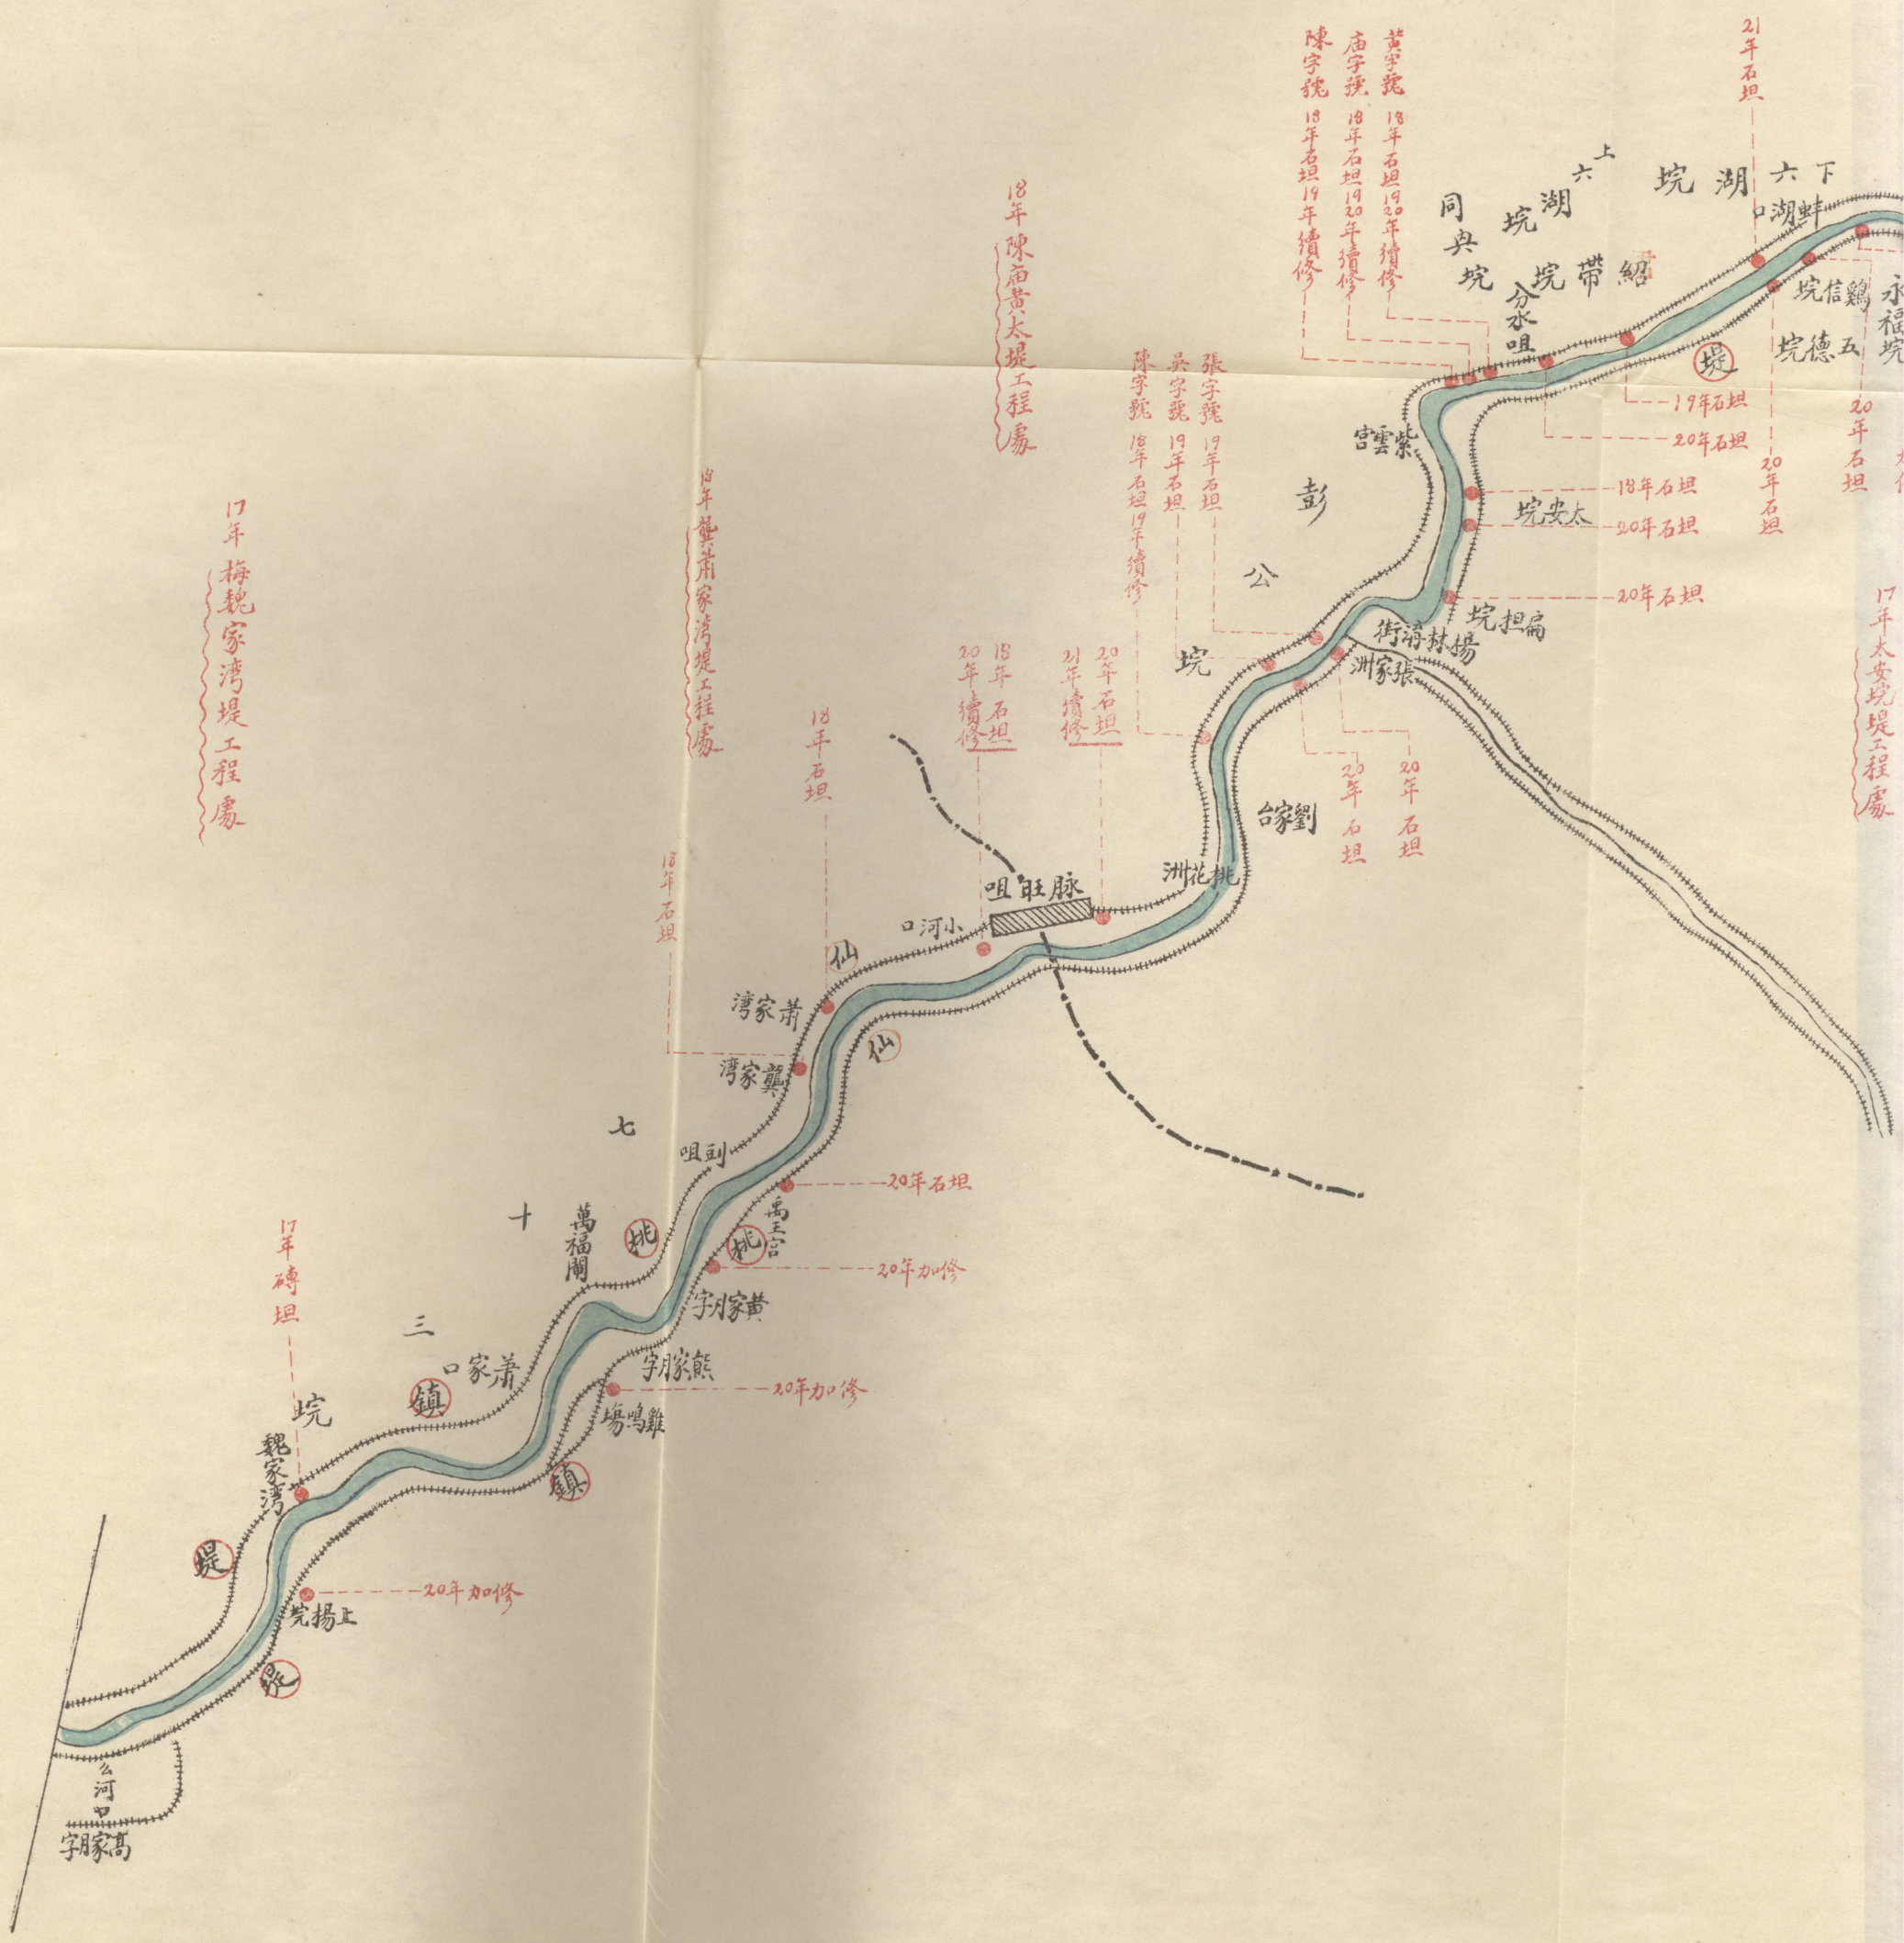
17年梅魏家湾堤工程處
18年龔萧家湾堤工程處
18年陳庙黄太堤工程處
黄字號 18年石坦19 20年續修
庙字號 18年石坦19 20年續修
陳字號 18年石坦19年續修
張字號 19年石坦
吳字號 19年石坦
陳字號 18年石坦19年續修
18年石坦 20年續修
20年石坦 21年續修
18年石坦
21年石坦
上六湖
下六湖
蚌口
鷄五
信德坑
永福坑
紹帶坑
同與坑
分水咀
堤
19年石坦
20年石坦
20年石坦
18年石坦
20年石坦
20年石坦
紫雲宮
彭公坑
太安坑
扁担坑
場材海
張家洲
劉家台
20年石坦
20年石坦
17年太安坑堤工程處
咀旺脉
小河口
洲花挑
仙
仙
萧家湾
龔家湾
七
十
三
咀到
萬福閘
挑
挑
20年石坦
禹王宮
20年加修
黄家字
熊家字
20年加修
萧家口
鎮
鎮
雞鳴場
魏家湾
坑
堤
堤
堤
17年磚坦
20年加修
扬子江
么河口
高家字

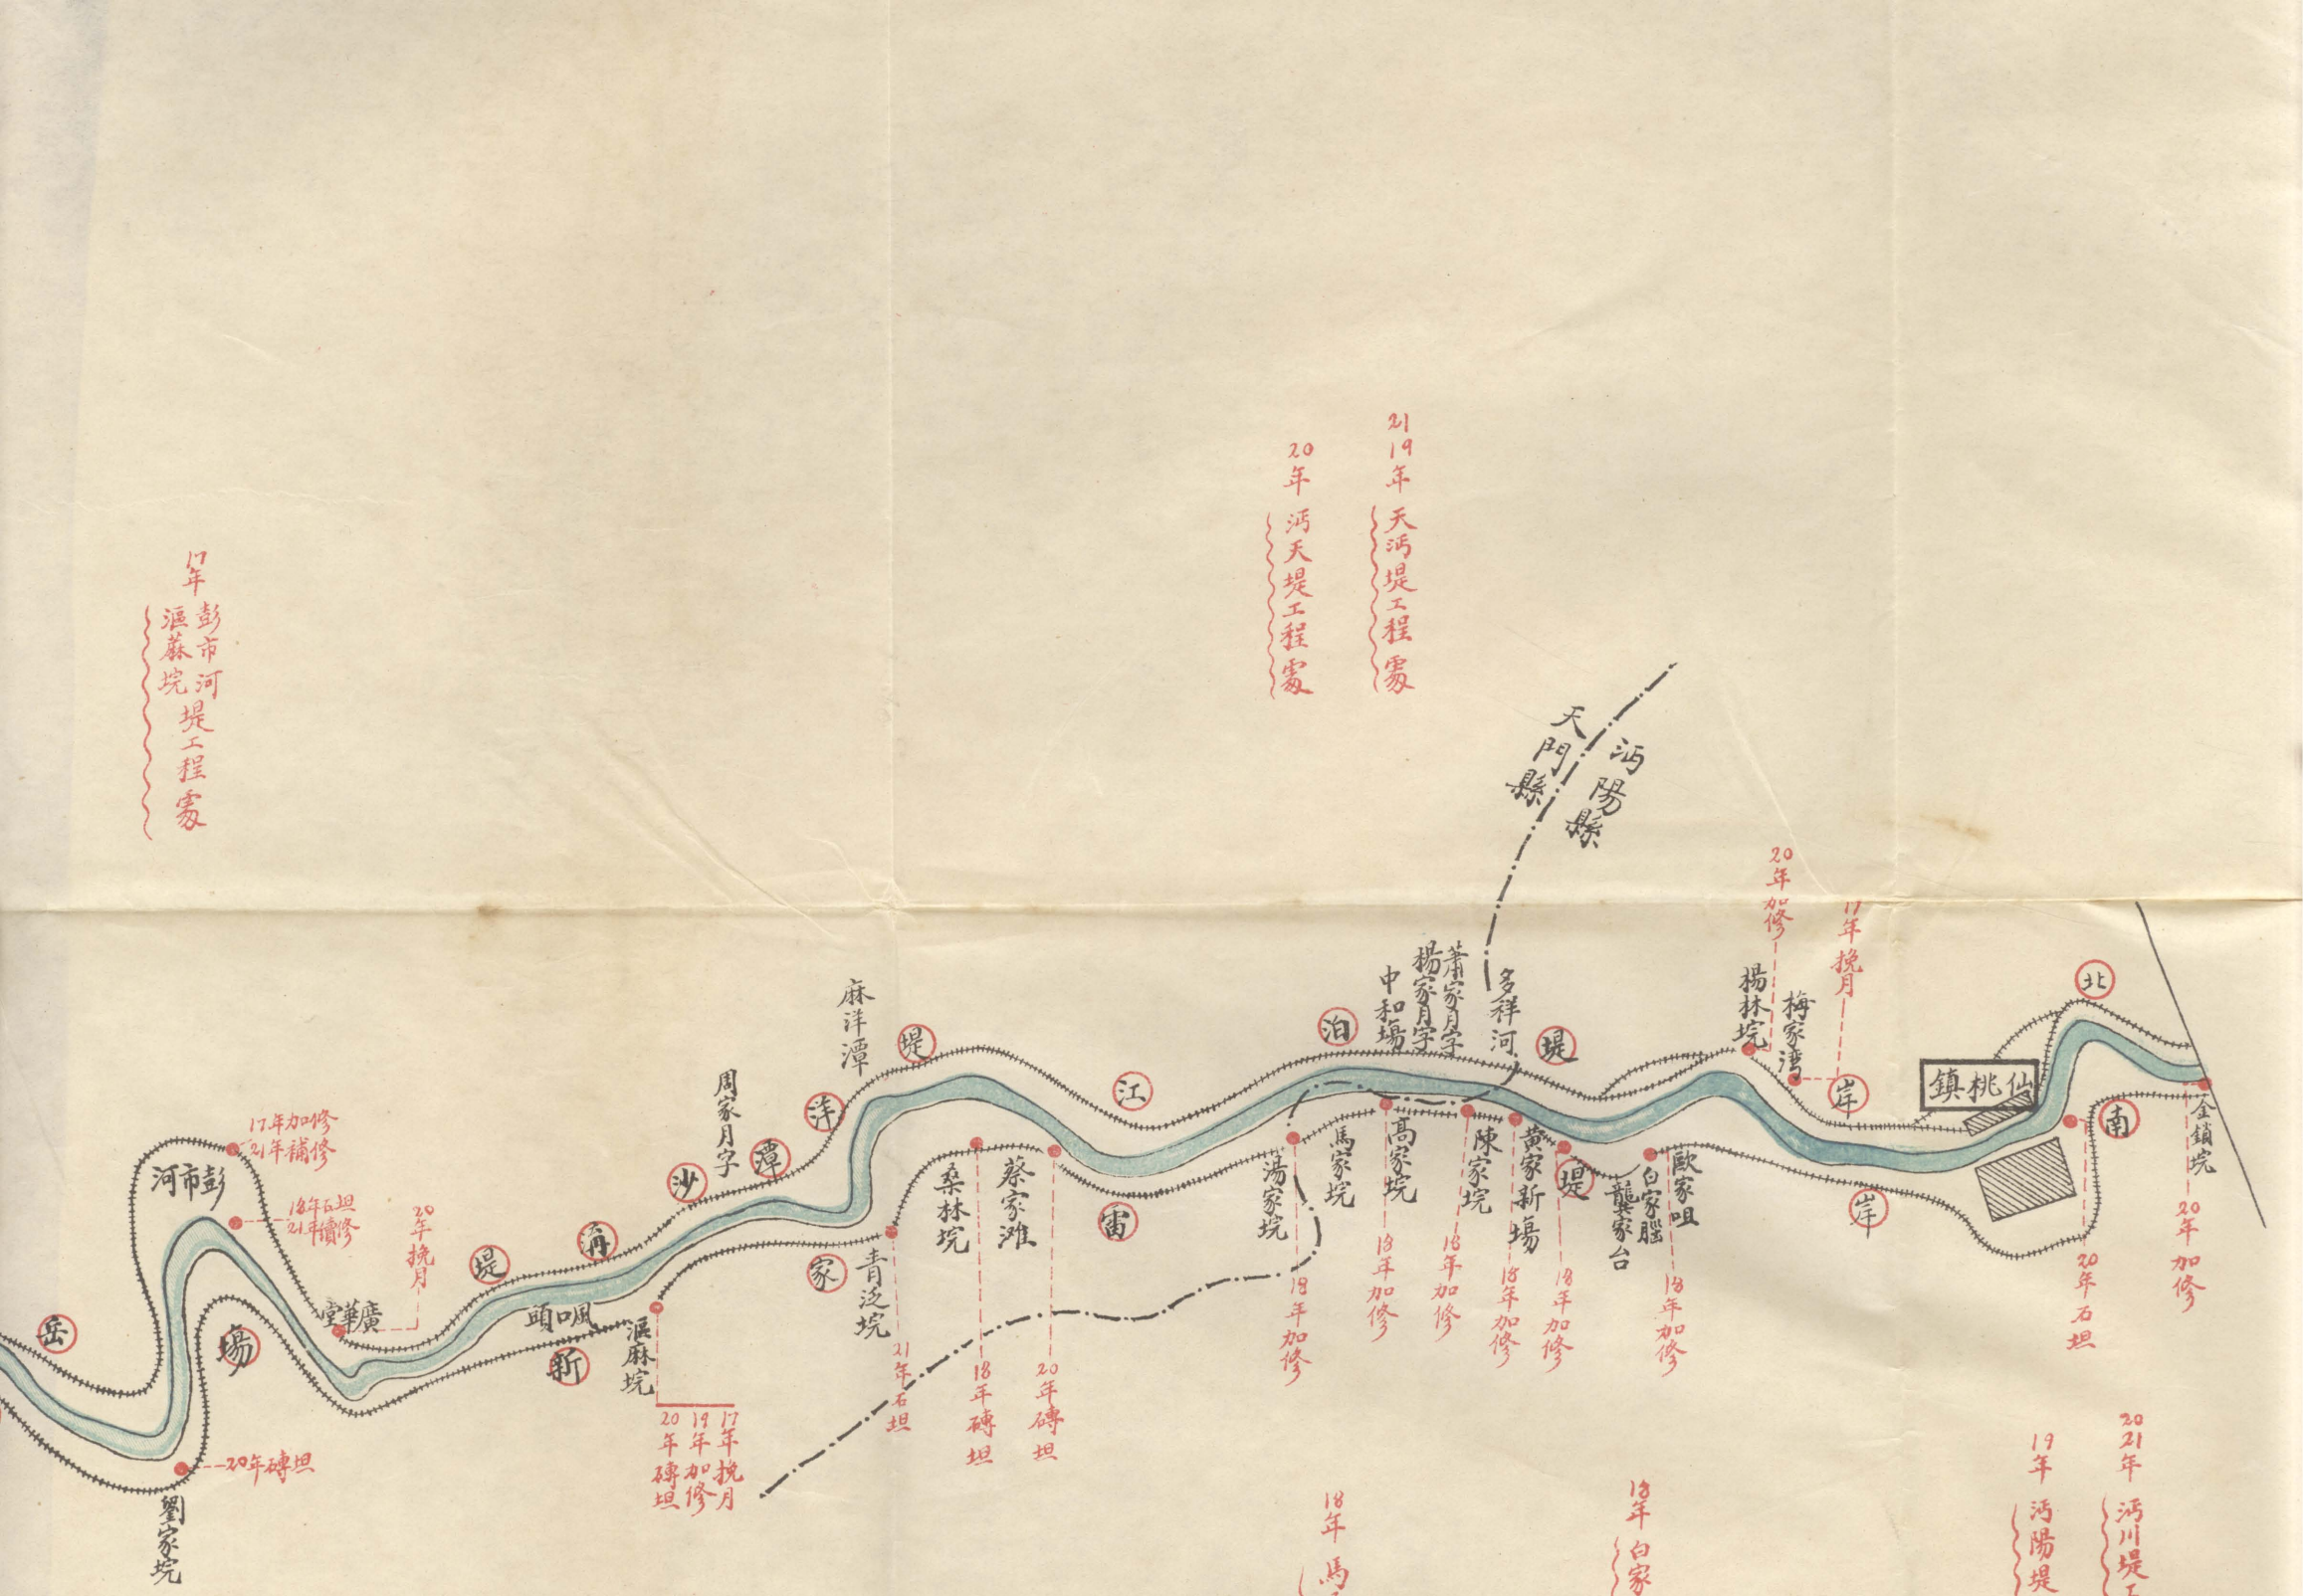

襄河堤防圖

(東自仙桃鎮起西迄京山縣止)

縮尺十萬分之一

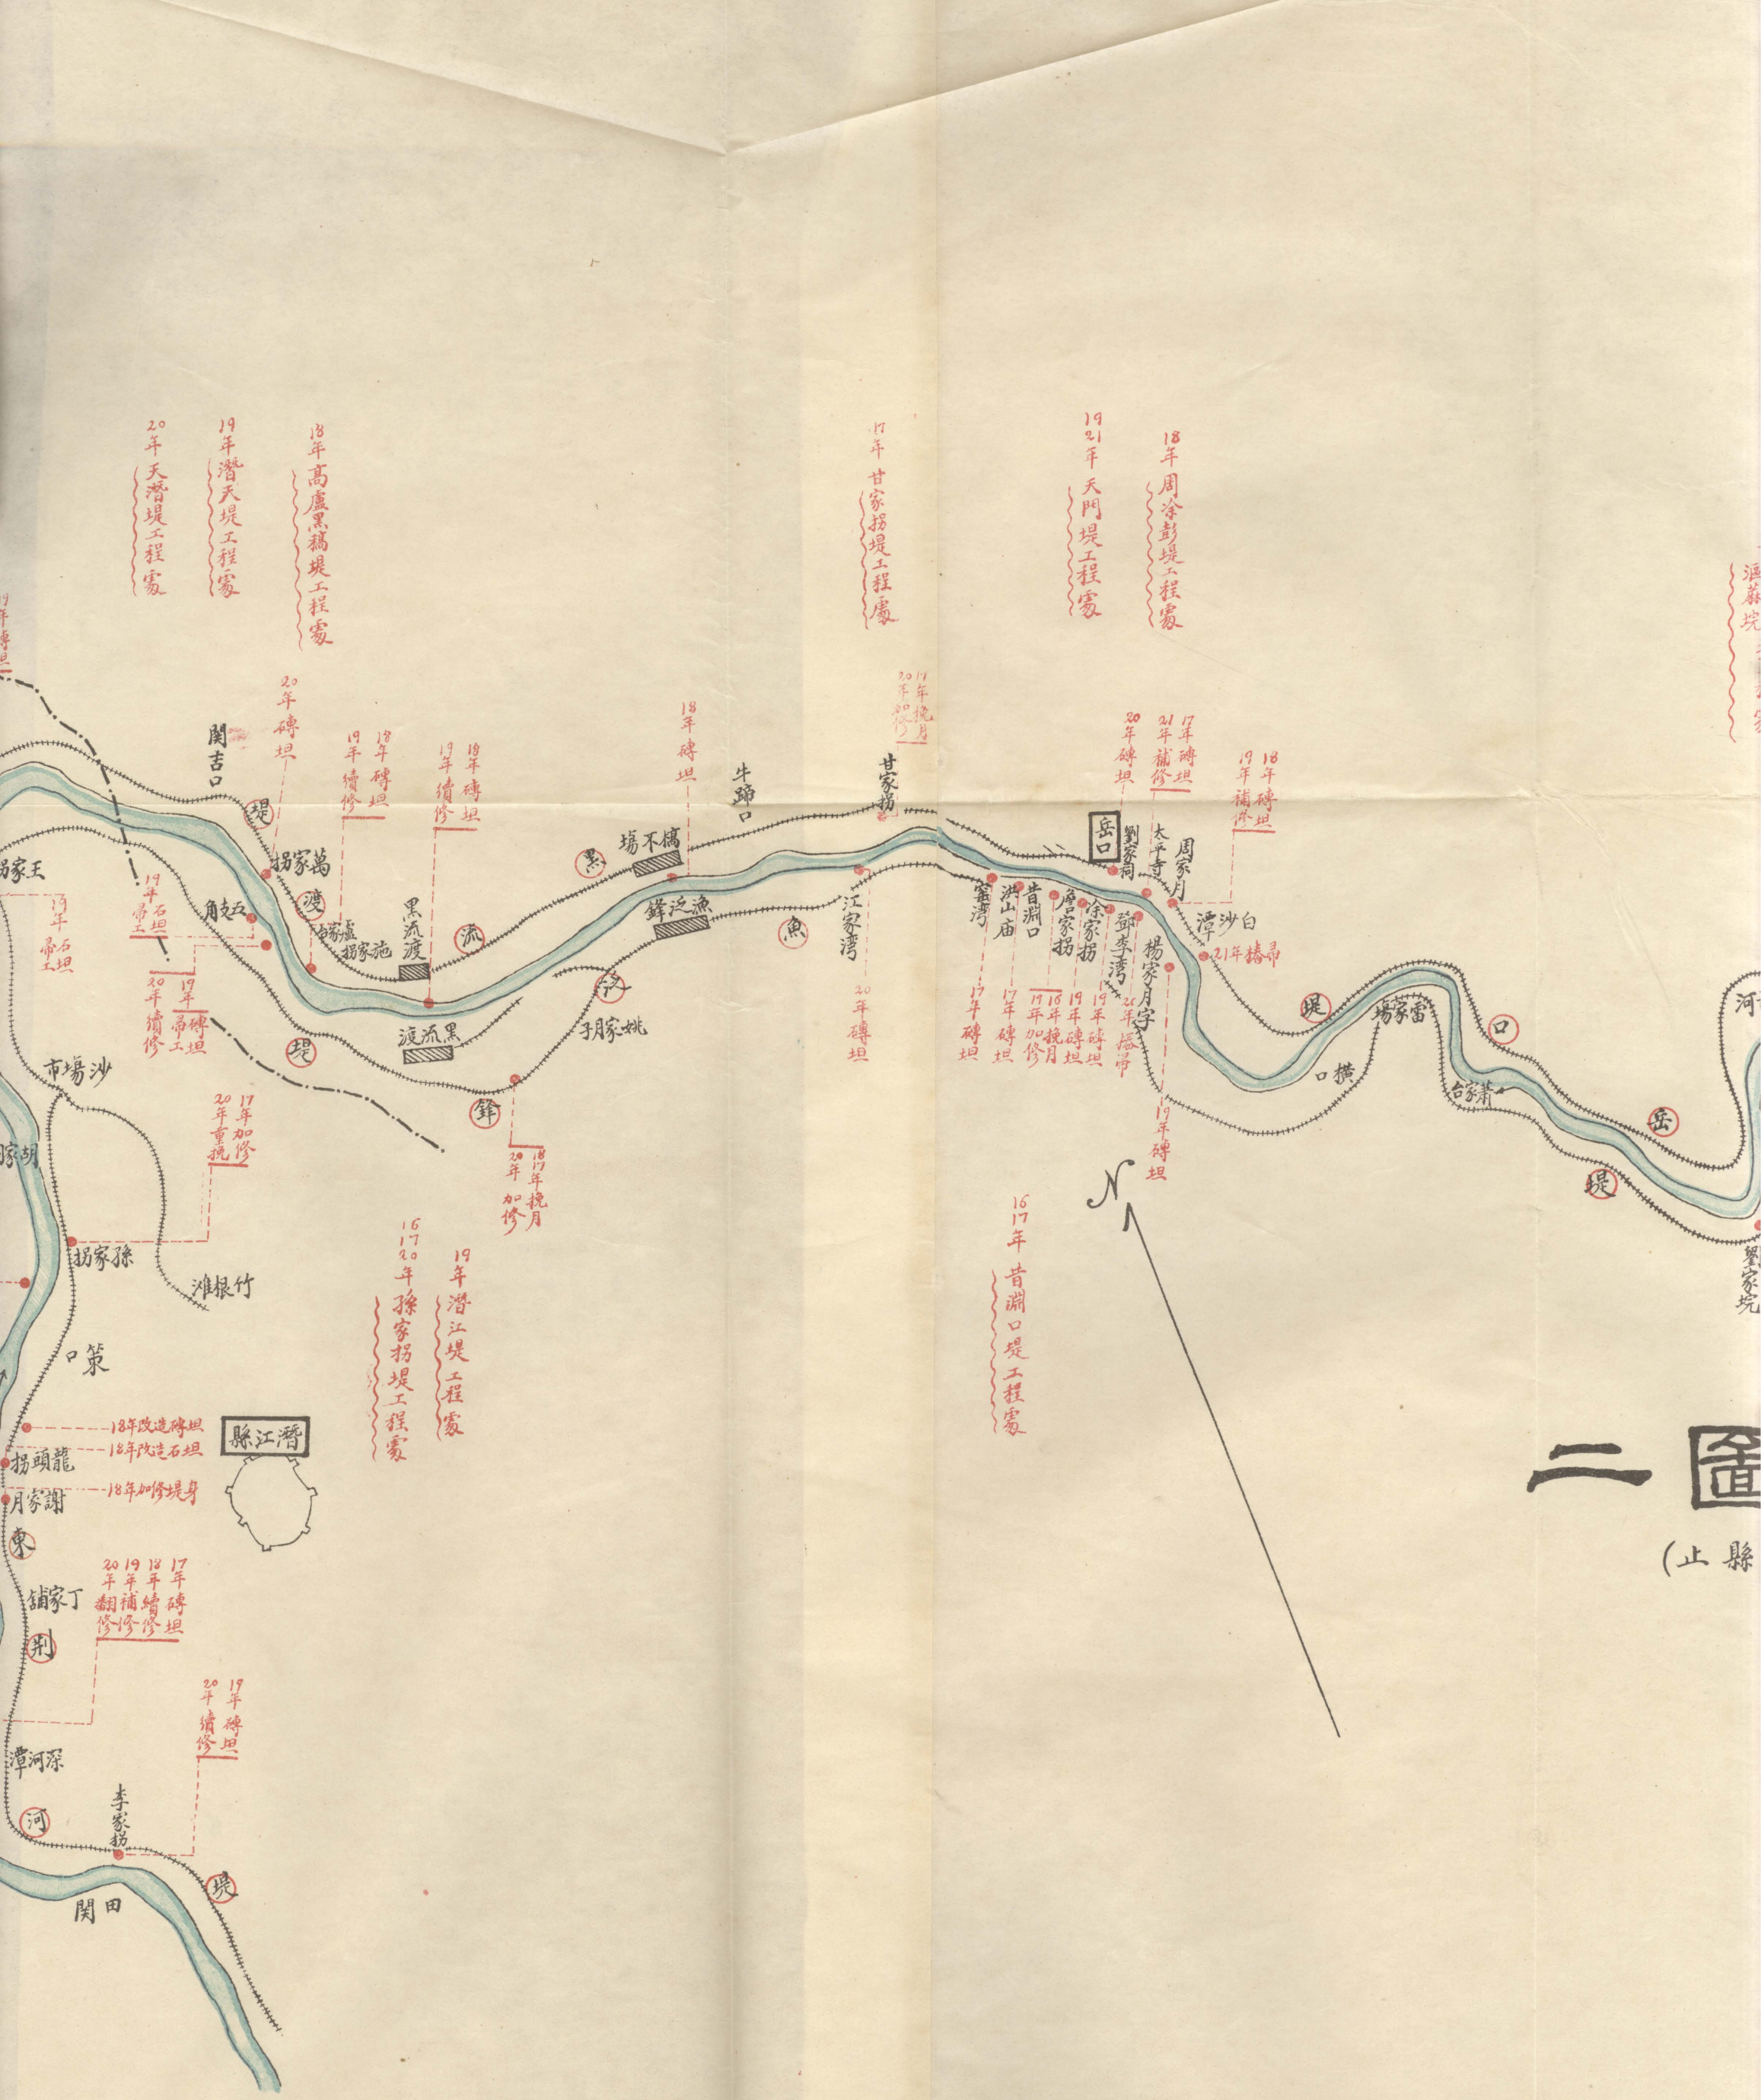
潛江縣
岳口
周家月
太平寺
劉家荷
鄧李湾
楊家月字
白沙潭
雷家場
蕭家台
橫口
望家垸
甘家拐
牛蹄口
江家湾
姚家子
漁鋒泛
橋不場
黑流渡
萬家拐渡
盧家台
施拐家
關吉口
王家拐
沙市場
胡家
孫家拐
竹根淮
策口
龍頭拐
謝家月
丁家鋪
荆
深河潭
李家拐
田關
河
堤
黑
流
魚
汉
鋒
口
岳
東
N
18年周涂彭堤工程處
19 21年天門堤工程處
17年甘家拐堤工程處
19年潛天堤工程處
20年天潛堤工程處
18年高盧黑橋堤工程處
16 17年昔淵口堤工程處
19年潛江堤工程處
16 17 20年孫家拐堤工程處
18年改造磚坦
18年改造石坦
18年加修堤身
17年磚坦 19年續修 20年翻修
19年磚坦 20年續修
19年石坦 帰工
19年磚坦 帰工 20年續修
17年加修 20年重挽
17年挽月 20年加修
18年磚坦 19年續修
20年磚坦
17年磚坦 21年補修
18年磚坦 19年補修
20年磚坦
17年挽月 20年加修
19年磚坦
16 17年磚坦
19年磚坦
17年磚坦
19年磚坦
20年磚坦
19年磚坦 20年橋帰
19年磚坦

圖二

(止縣)

天門縣
潛江縣
京山縣
18年賴謝深趙堤工程處
17年賴家集堤工程處
20年潛京堤工程處
20年高家揚堤工程處
17年石坦
21年補修
19年續修
18年磚坦
21年續修
19年加修
18年石坦
21年補修
18年磚坦
21年續修
19年加修
18年磚坦
21年補修
19年續修
20年補修
18年磚坦
21年護腳石
19年續修
20年補修
18年磚坦
17年青石砌
19年續修
20年補修
17年月堤
18年磚坦
19年續修
21年轉帚
19年磚坦
20年續修
19年合坦
帚工
黃富口
羅家台
竹根台
百心磨
上光澤洲
20年石坦
21年續修
21年石坦
19年加修
長腦坑
長腦市
19年加修
19年磚坦
19年八百八揚堤身加修
楊家灣堤
渡船口
呂家灘
聶家灘
聶家場
泗港
堤
賴家集
岸
灣家方
市
北
灌頭
同興場
邑
紅廟
南
灣家簡
岸
16年簡家灣堤工程處
16年挽月
17年加修
邑
黃家場
灣
吳家改口
趙
家
台
趙家台
台
趙家台
堤
17年深河潭趙家台堤工程處
17年加修
18年石坦
19年續修
東
荊
河
深河潭
河
荊
蚌湖
堤
張截港
王家揚
洪山寺
20年挽月
胡家祠堂
高家揚
灣
18年磚坦
龍頭揚
謝家月
東
鋪家
荊
19年磚坦
20年續修
李家咀

圖三

（自鍾祥縣至王家營大王廟統謂之鍾祥堤全堤計分十八工自民十六至今連年工程皆在三四工及十一工等處除圖上已標明者外尚有土工及其餘一切零星工程地點過多不及備註

19 20 21 鍾祥堤工程處

16 17 18 鍾祥三四工堤工程處

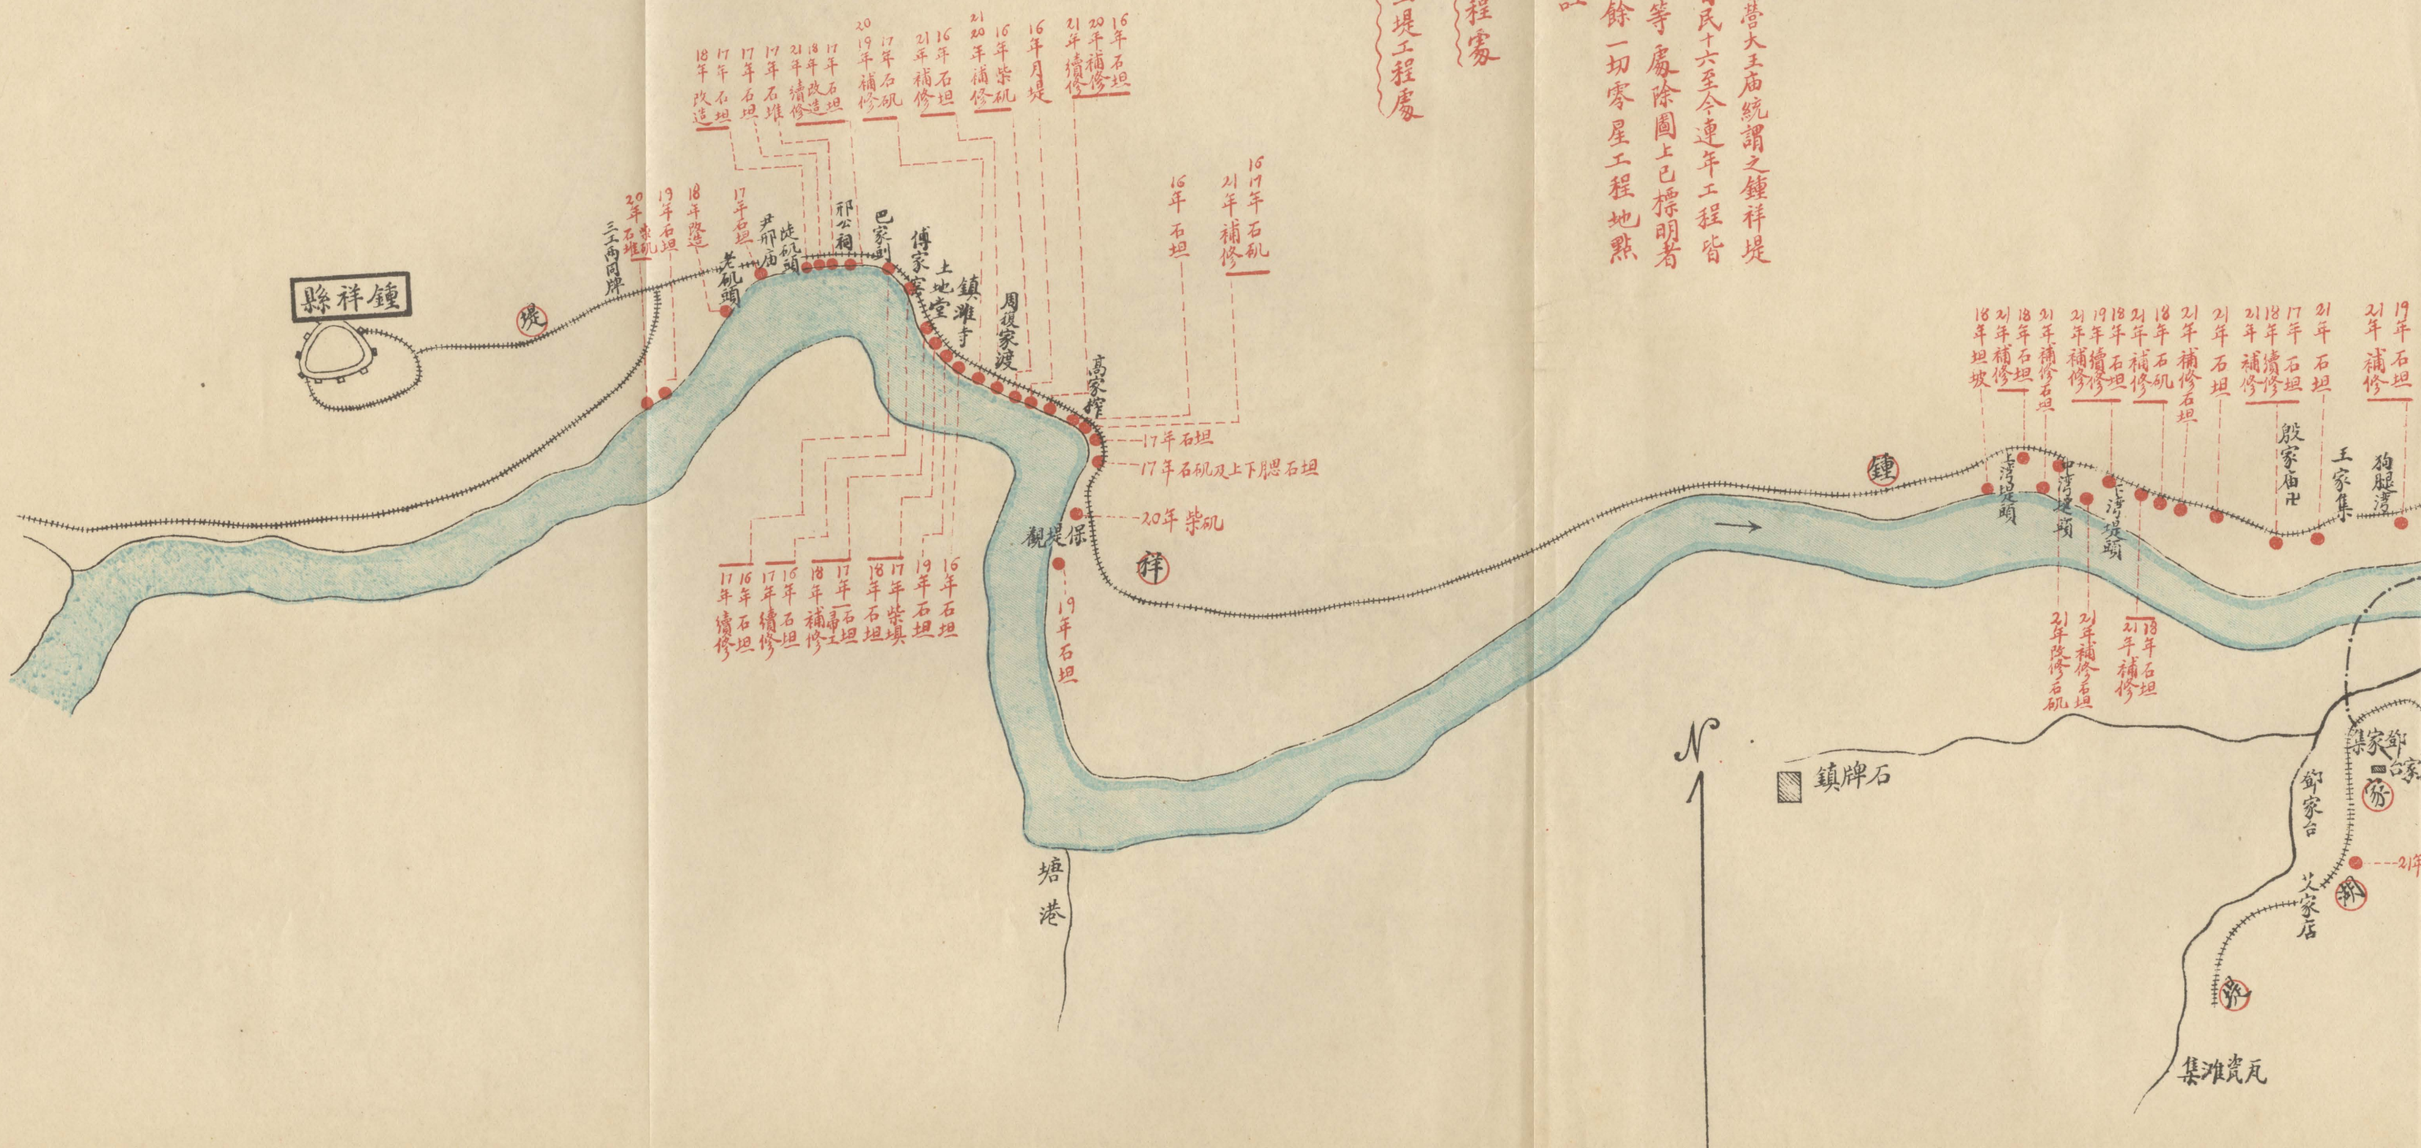

襄河堤防圖三

（東自京山多寶灣起西至鍾祥縣止）

縮尺十萬分一

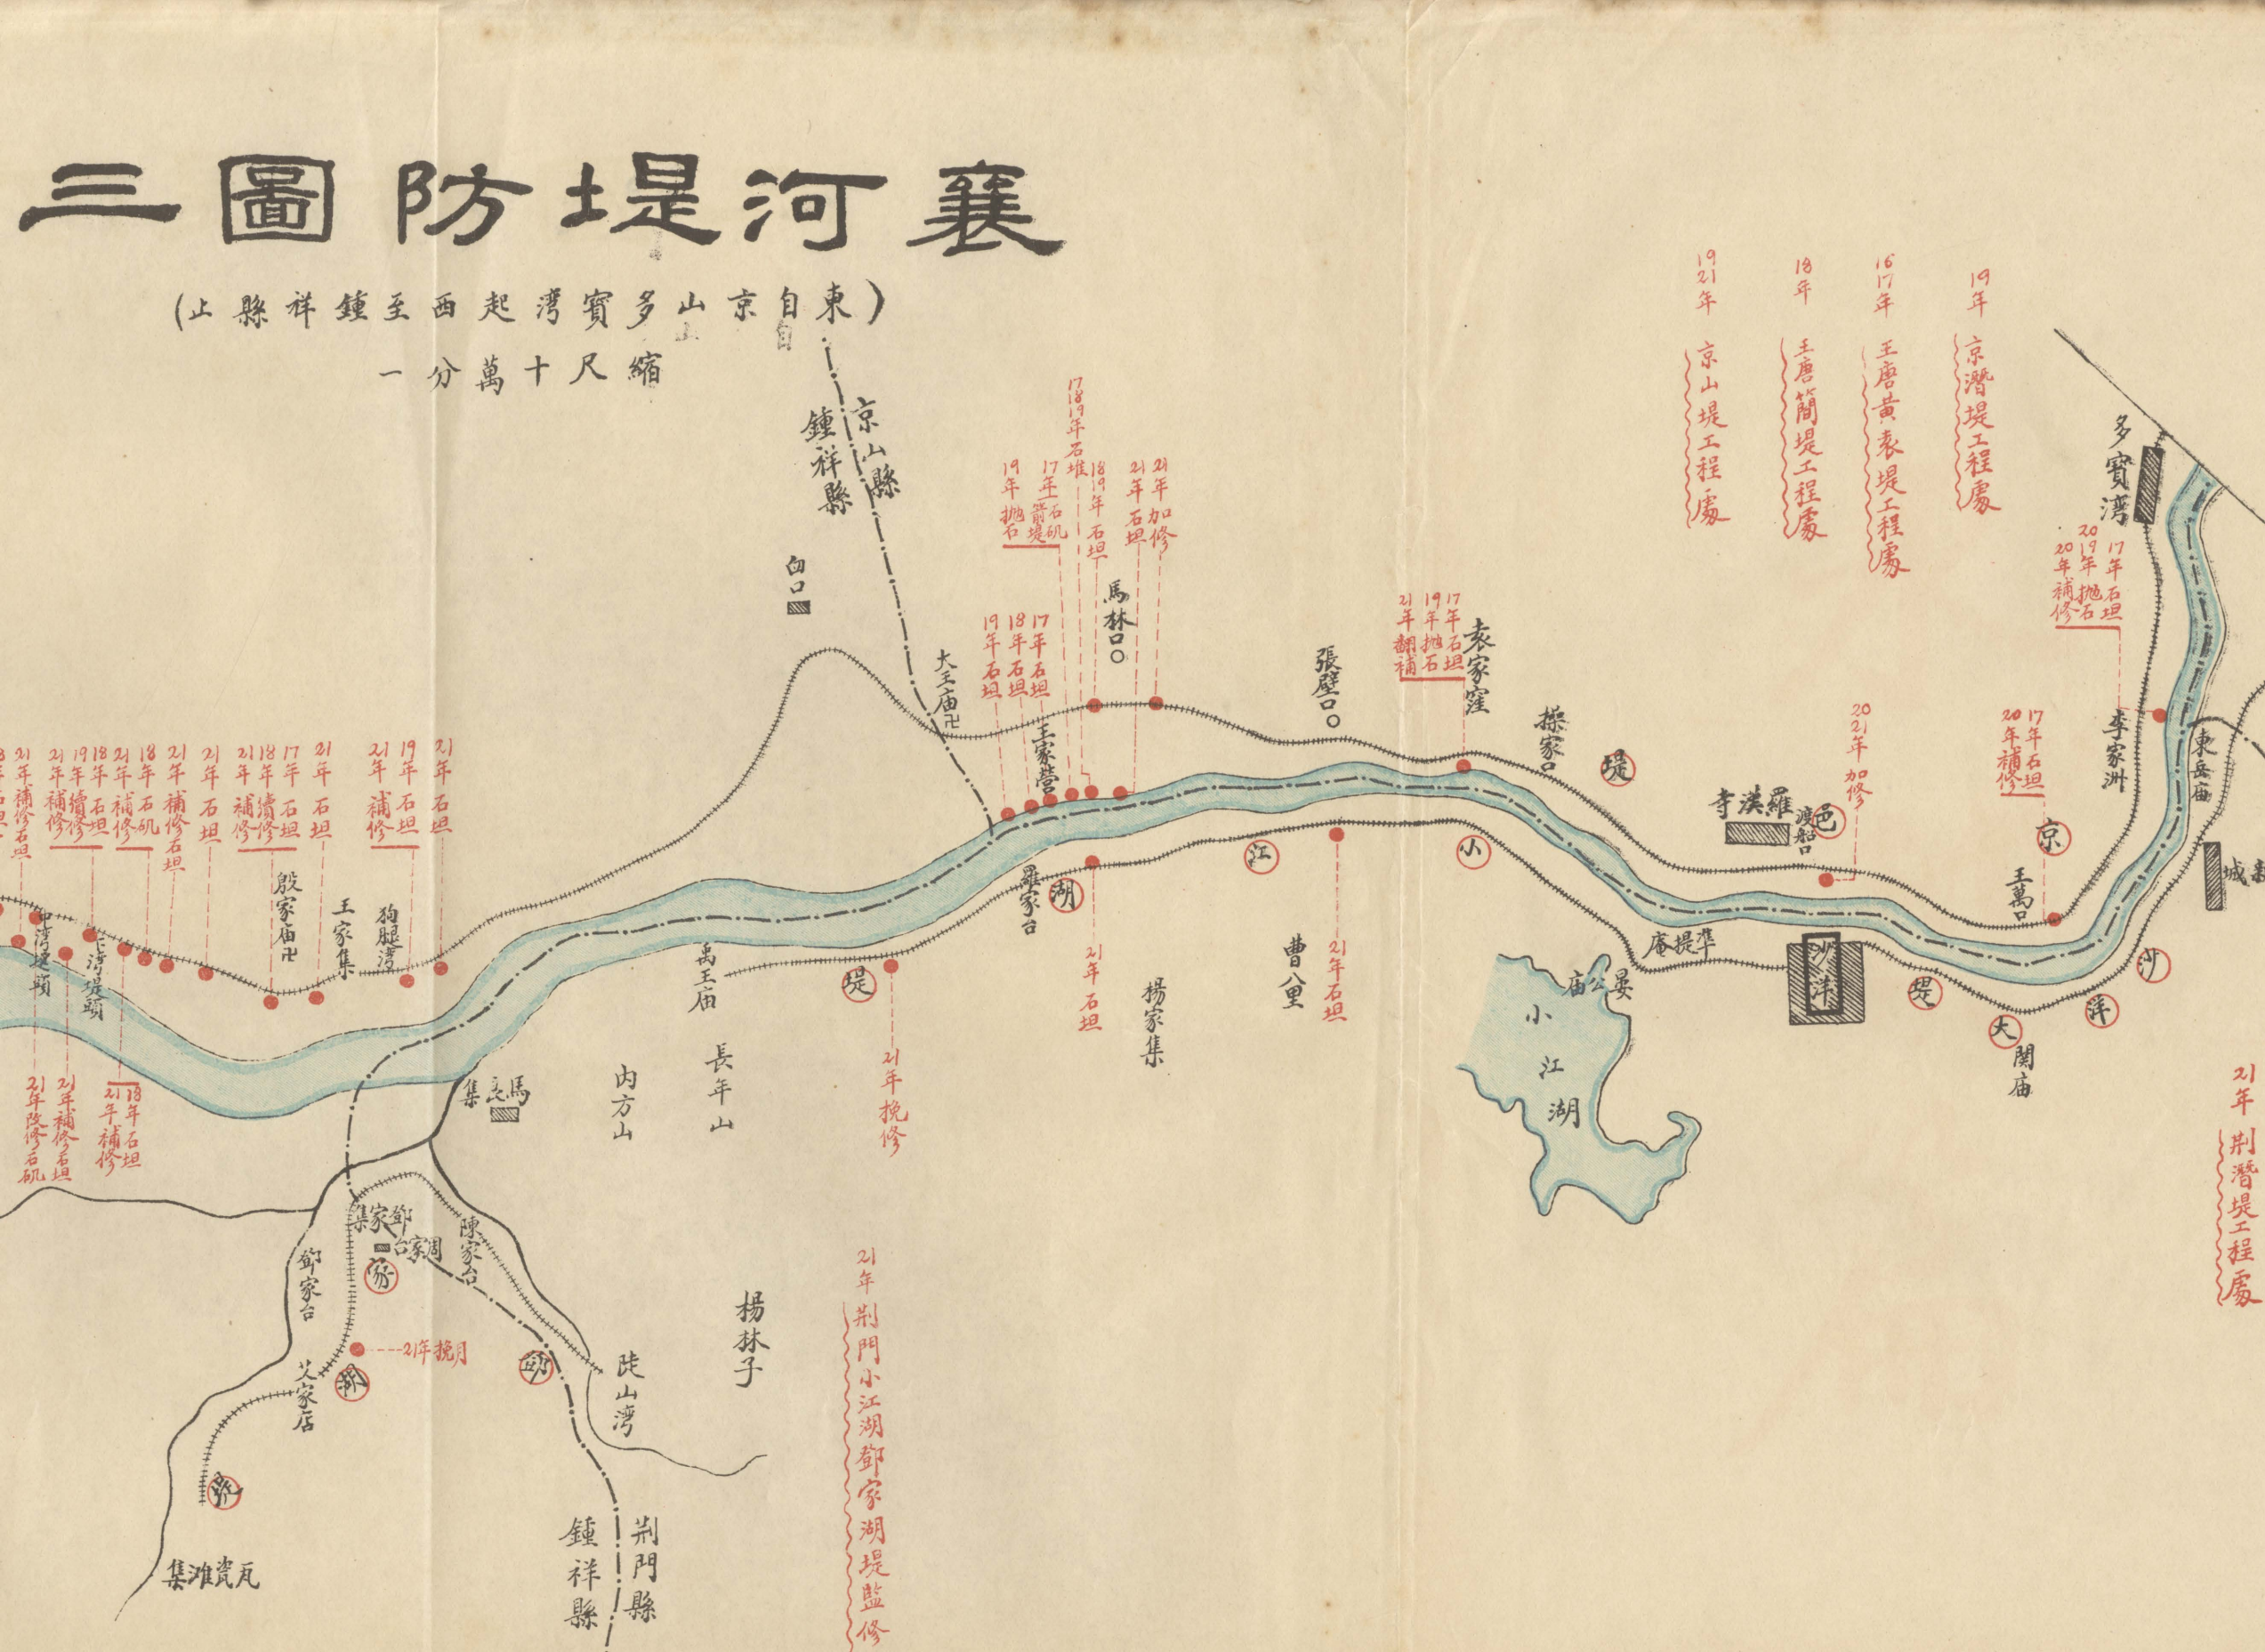

水利篇

清理水利事務報告

(一)水利測量之起源

本篇所謂水利乃別於堤工而言地形測量水文測量屬之在十六年以前水利無專欵應辦事業率難舉行迨十七年十一月建設廳提議組設水利工程處聘挪威人安利森爲工程師負責籌備翌年三月一日成立組織測量流量等隊分途勘測限期完成嗣後組織與計劃屢經改革其所辦事業要不外地形測量水文測量勘估測量三類茲將歷次變更計劃之概要及辦事之成績分述於后

(二)組織與計劃

十八年三月一日水利工程處組織成立以工程師一人主其事下分設計測繪流量三股測繪股轄野外組三實施時改爲測量隊流量股轄野外組六實施時改爲流量站分設於長江之枝江調關武穴襄河之襄陽沙洋澤口六處以江漢流域及河港湖沼一切平原低窪之處爲測區其任務爲考察水力水量水性及附近地勢與經濟狀況限四年至五年竣工此原定組織與計劃也(附表一)

同年九月省令撤銷水利工程處仍設水利局直隸省政府當以原定計劃需時過久另擬修正水利測量計劃呈准施行計分兩項(一)地形測量設測量隊三分漢黃荆河襄河東荆河四路沿河兩岸各測三公里其任務爲測量堤身橫直剖面及兩岸地形並調查土質又測量河身橫剖面及最高洪水位並

293185

洪水面之坡度限二十個月完成(二)水文測量將原設之六流量站悉改爲水文總站並將枝江調關雨站移駐監利武昌六總站下各設分站數處(附表二)其任務爲測量長江襄河及重要支流各段水位之漲落河槽之變遷並流速流量泥沙量等項研究各段水位與河流面積流速流量之關係測量各地之雨量蒸發量及其他氣候此第一次變更計劃也

十九年七月以地形測量須二十個月始克完成不能應當時各路堤防設計之需要乃調第二測量隊專測幹堤並將原定計劃測至距堤三千米改爲三百米比例尺一萬分一之地圖改爲五千分之一限期五個月完成其原有業務併歸第一隊担任俟工畢仍照原計劃進行此又一變更也

二十年三月以每年勘估堤工人員向係臨時委派流弊滋多復將水文測量與臨時勘估併改爲長江襄河兩常年勘測隊而以技正或工程師一人總其成(附表三)其任務爲(一)測量江漢河岸險要處及其附近處之河身剖面流向流速流量沙量並擇要考驗土質(二)辦理水文測量並校正水尺零點高度(三)辦理幹堤單薄部份之水平測量堤身橫剖面(四)決定堤岸防災工程之地點與種類編造工程圖表(五)編製勘測年報此最後之改革也

(三)辦理之成績

(甲)地形測量　十八年三月水利工程處初成立時測量隊僅組成第一隊九月始將第二隊組成截至翌年二月底止共測就漢口後湖至漢川一帶地形圖四十六幅其面積僅達預定計劃之七成至三

月第一次改組首將一二兩隊照修正計劃改編派測襄河路增設第三隊測量荊河路四月襄河匪擾又將一二兩隊均調漢黃路服務七月照變更辦法調第二隊測量幹堤分兩組由金口沌口兩處同時向下游測量至二十年四月僅完成漢黃一路五月實行常年測勘計劃遂停止進行復將一二兩隊併爲第一隊三隊改爲第二隊第一隊仍測漢黃路七月調省防水後勘估是年堤工十一月事竣再回漢黃路測勘翌年六月告成第二隊仍測荊河路旋因新堤匪警調測漢川一帶七月亦調省防水九月差竣派赴長江上游勘測甫達簰洲遇匪公物悉數被刼掠技士胡濟溪殉焉餘衆陸續逃回十二月繼續成立改由宜昌向下游測量廿一年九月調測襄河路十一月裁撤查地形測量照修正計劃原限二十個月測畢祇因防水勘堤匪刼等種種意外延誤致歷時十之七八而所測面積僅活原計劃五分之三

(附表四)

(乙)水文測量　查水利工程處時期六流量站雖均照章設立但以未頒詳細規程辦事漫無標準枝江調關兩站又因匪警迄未開辦故成績絕鮮十八年九月照修正計劃改設水文總站六分站二十八設備較周計劃較密又以翌年匪勢披猖干戈擾攘測船復時被駐軍徵調致各站時作時輟未能按日觀測且多無形停頓九月共匪陷沙洋十一月擾監利公私財物喪失殆盡因併裁撤殘留四站亦等虛設二十年二月底裁六總站各分站併歸常年勘測隊管轄改爲流動測量性質二十一年九月水利堤工兩局分立勘測隊遂專任勘估堤工隸堤工局復設水文站測量水文隸水利局十一月甫報成立而

兩局裁撤各站由江漢工程局接管

(丙)雨量觀測　查雨量觀測本係水文站應辦事業但此項工作期在普遍前水利工程處令各站辦理外復於十八年四月編製雨量計及雨量記載表雨量觀測法令發各縣遵辦規定每半月呈報記載表一次惟截至是年底止按期塡報者僅九縣十九年四月遂厘訂整頓辦法通令遵照規定雨量觀測員月支薪俸十元由該縣經征堤工經費項下撥給無堤捐各縣由局直發經茲整理各縣遵辦者雖較多然以交通阻匪郵筒不便仍多漏未塡報茲將水文測量各圖表足資永久參證者列表備查功用限於一時者弗錄(附表五)

(四)支用經費

查自水利工程處至水利堤工兩局裁撤測量計劃組織中間不無變更而經費亦隨有增減十九年二月以前各測量隊流量站經費在水利工程處預算內開支由水利局造報十九年三月以後各測量隊水文站單獨成立預算遂單獨造報二十年三月各水文站裁撤設常年勘測隊水文業務暨經費報銷均歸常年勘測隊辦理二十一年十月常年勘測隊裁撤各水文站恢復仍單獨報計至第一期測繪地形經費及各縣雨量觀測員薪資均由水利局直接支給造報計水利工程處支洋一八九・六二六元四三第一期測繪地形支洋一七。七四四元六七八各縣雨量觀測員共支洋九・七二五元各測量隊水文站勘測隊共支洋四六一・二九八元五七四(附表五)

水利工程處組織表（附表一）

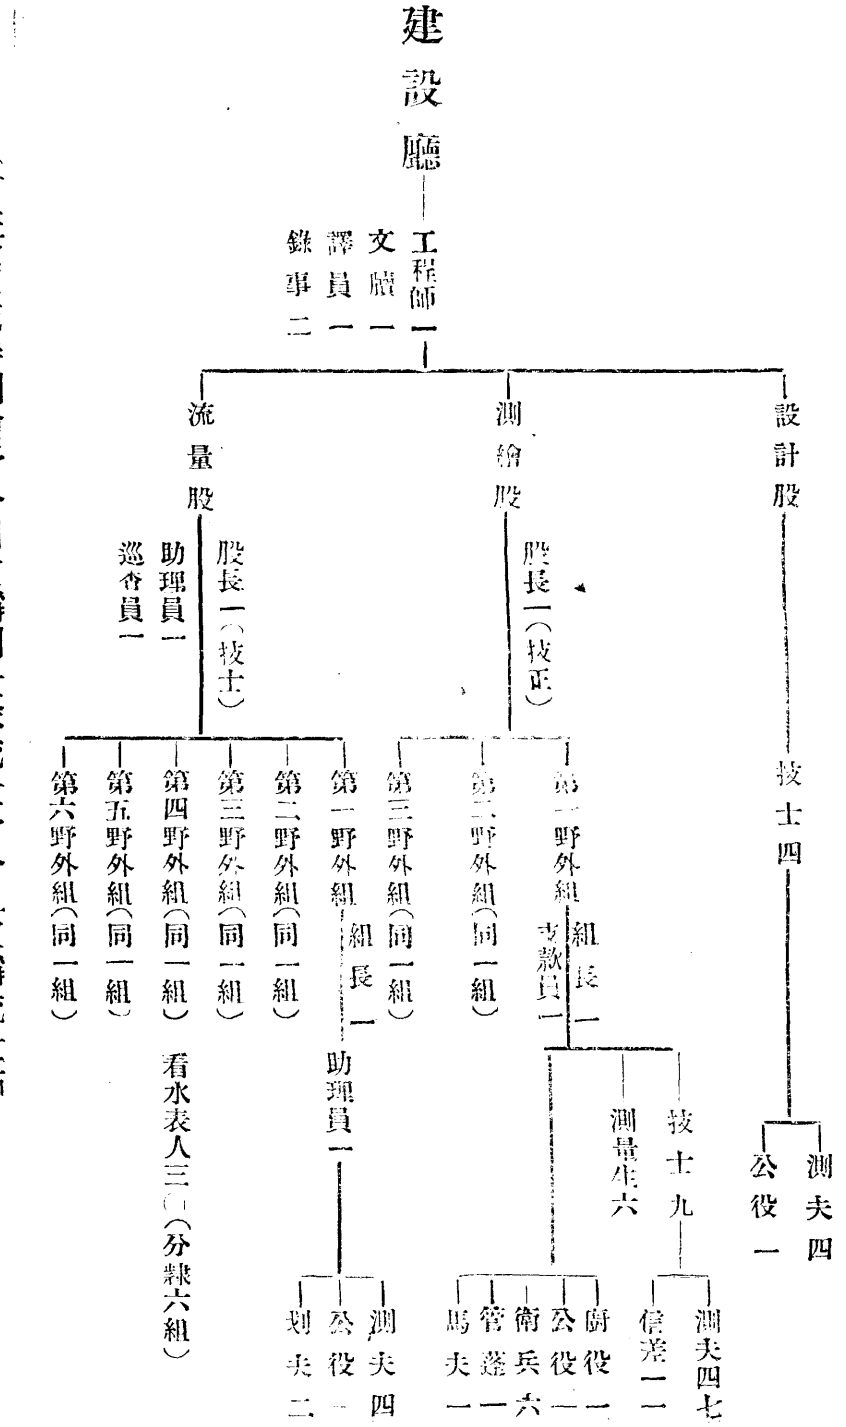

（附註）實施時測繪野外組改稱測量隊流量野外組改稱流量站

水文站組織表（附表二）

- 水利局
  - 水文科
    - 流量股
      - 監利站
        - 宜都　紅水港
        - 松滋　新堤
      - 武穴站
        - 巴河　富池口
        - 蘄春　軍山咀
      - 武漢站
        - 花口　沌口　禹觀山　諶家磯
        - 大咀　法泗洲　泥磯　舵落口　漢川
      - 澤口站
        - 脈旺嘴　陶朱埠
        - 麻陽潭　岳口　沔陽
      - 沙洋站
        - 興隆鎮　王家營
        - 馬良
      - 襄陽站
        - 皇庄廟
        - 流水溝

當年勘測隊組織表（附表三）

水利局—技術室—技正或工程師—
- 甲（長江）組 技佐二人（三）— 技士三人（四）
  - 觀測生一五（二〇）
  - 測夫十人（九）
  - 公役四
  - 船夫（不定數）
  - 事務員一人
- 乙（襄河）組（與甲組同）

（附註）表內有（　）記號者爲實施時改定名稱或人數及組長係由技士內指定

地形測量成績表（附表四）

區域	估計方杆	原計劃已完方杆	修正方杆	共測完方杆	備考
漢黃路	一七〇〇	四〇	二六二八	二六六八	此路測完較預計方數多九百餘杆
荆河路	三八〇〇	一五	二〇三〇 宜昌七五二	二七九七	
東荆河路	六九〇	三〇		三〇	
襄河路	二四〇〇	四一〇	三三〇	七四〇	尚有脉旺咀至沙洋一段未加入因成圖未繳到無從計算
漢口後湖至漢川一帶不濱江漢之中部低地		一二〇〇		一二〇〇	
共計		一六九五	五七四〇	七四三五	

(附表五)　水利測量成績總表

十八年至二十一年

圖類							
地形圖類		水文圖類		勘估圖類		表簿類	
一萬分一地形圖	二五五幅	揚子江水道詳圖	一	擬修江漢兩路工程圖	一	江漢一帶地形圖接合表	一
長江兩岸幹堤圖	一七五幅	襄河形勢圖	一	揚子江北岸幹堤沌口至小池口橫斷面圖	一冊	長江兩岸幹堤圖接合表	
長江兩岸堤線圖	九九幅	湖北全省雨量區域圖	一	揚子江南岸幹堤金口至石灰窰下橫斷面圖	一	三角 水準 測量成果表	四本 四本
襄河上游兩岸堤綫圖	三幅	揚子江河底高程圖	一	漢黃 荊河 襄河 幹堤潰決勘估圖	各一冊	測量三角網 經緯度計算表	一張 一本
揚子江北岸幹堤沌口至武穴圖	一張	監利 武漢 武穴 河底變遷圖	一	武昌環城水準顯示圖	一	水利調查表	二本
揚子江南岸幹堤金口至武太閘圖	一張	襄陽 沙洋 澤口 河底變遷圖	一	武昌環城剖面圖	一冊	各站應用流速儀器測算流量表	二本
揚子江南岸幹堤木鴨港至磯頭山圖	一張	河床斷面位置圖	二 二本	監利中汛濱江幹堤險要堤垸圖		各站應用公式測算流量表	二本
長江南岸支堤圖	一張	各站水位漲落曲綫圖	二二本	武昌 漢陽 防水堤路圖	二 四	各站泥沙流量表	十四本

擬修夏口全垸堤線及附近地形圖 一張	各站河流同速曲綫圖 二本	武金堤縱斷面圖 一	各站蒸發量表 一本
武金堤白沙洲浪坎圖 一張	各站泥沙流量漲落曲線圖 九本	武豐堤縱橫斷面圖 一六	河流面積表 一二本
武金堤平面圖 三〇張	武昌站十九二十年水位漲落曲線比較圖 廿一 一	張公堤縱橫斷面圖 三三	長江襄河流量總表 一本
武豐堤平面圖 一八張			最高水位比較表 十九二十年全省雨量記載一覽表 廿一 各一張
張公堤平面圖 三五張			

(五)結論

前水利工程處舉辦水利測量確立始基洵屬根本至計祇以事屬草創策劃容有未周客卿主持情形不無隔閡兼之歷時未久遂致成績未彰嗣經前水利局一再更張因革損益計劃較爲完備而常年勘測辦法尤增妥善果能循序以進不難依限完成乃因匪患頻仍軍事滋擾各隊站之被擄掠者至再至三輕則損失公物重則喪失生命干戈市地荆棘載塗致令在事人員未能安心供職時作時輟甚或無法進行形同虛設是以開辦四載糜欵鉅萬而地形測量僅達五分之三幹堤測量僅成漢黃一路水利測量亦多殘闕不完阻碍橫生禍變踵至以致全功未能告竣良法莫由推行是誠事之無可如何固未可盡責諸人謀之不臧也

附各隊站清理報告表十二份

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表（一）

湖北水利局第一測量隊　隊長雷仲榮易陳百齊　自十九年三月一日起至二十年四月十五日止

工作種類	每月預算	全年預算	實用款項				
地形測量	二・九三二〇〇〇	三五・一八四〇〇〇	經費報銷數				合計
			三四・三三五〇九四				三四・三三五〇九四

易隊長支洋二五六六元八一五雷隊長支二四七九元九五五陳隊長支二九二七八元三二四共如上數

經過事實

（一）沿革　該隊係在建設廳水利工程處時期於十八年四月成立測量漢口後湖一帶隊長陳炳乾十九年三月測次漢川縣前水利局令調陳充工程科長另以易榮爲隊長四月易又他調以雷仲榮爲隊長五月雷亦另有工作局令該隊技士陳百齊升充隊長按照修正水利測量計劃組織亦略有變更維時漢川匪警四起工作困難准調漢黃路測量二十年四月奉令一二兩隊合併改組新一隊仍在漢黃路工作

（二）組織　十九年三月改組後組織如次第一隊隊長一人技士六人技佐五人事務員一人傳達二人公役十二人測夫三十二人

(一)任務　照修正水利測量計劃之規定第一隊測區原爲襄河路自漢口沌鎮辦二十個月完竣嗣因匪警調赴漢黃路與第二隊協同工作其應測量地區規定兩岸幹堤內各距離三千米突爲止測量要點爲1.堤防兩岸地形2.堤身橫直剖面3.河身橫剖面4.最高洪水位及洪水面坡度5.河床狀況6.堤防兩岸建築物及堤身土質十九年七月施行幹堤測量奉中央建委會指令堤身河身剖面地形測量隊不兼測

(二)經費　每月薪勤一七六〇元工餉七九二元公費二〇〇元材料一五〇元船費(斷面用)三〇元共計每月預算洋二九三二元按修正計劃內各測量隊之經費預算每年二八兩月祇有薪餉開支但各隊實支雖係遵照規定而預算書仍照原額呈送應減各項並未扣除故本表所列全年預算亦未扣除

(三)成績　該隊自十九年五月調漢黃路起至二十一年五月停辦(連改組後新一隊在內)測完漢黃路二六二八平方公里比原估一七〇〇方公里溢出千餘方公里因沿江兩岸洲灘甚多故面積亦廣

清理情形

查該隊自十九年三月起至二十年四月十五日改組止共實支洋三四三二五元〇九四元逐月經費計算書類業經前水利局核轉此案了結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表（二）

湖北水利局第一測量隊　隊長陳百膺

自二十年四月十六日起至二十一年六月三十日止

工作種類	每月預算	全年預算	實用款項	
地形測量	五・四〇八〇〇〇	六一・七三六〇〇〇	經費報銷數	六六・五一四九六四
		二十一年折減爲五六九三〇元	合計	六六・五一四九六四

經過事實

(一)沿革　本隊二十年四月十六日成立係由原一二兩隊合併改組指定測區爲漢黃路卽漢口至九江之沿長江流域一帶

(一)組織　隊長一人技士十二人技佐十人辦事員一人傳達二人公役二十二人測夫六十四人

(一)任務　測量長江流域漢黃路應測地區兩岸幹堤內各距離三千米突1.幹堤兩岸地形2.堤身橫直剖面3.河身橫剖面4.最高洪水位及洪水面坡度5.河床狀況6.堤旁兩岸建築物及堤身土質以上任務係修正水利測量計劃內所規定之應辦事項但長江方面河床斷面測量該項計劃內規定由局內派員測量另有經費預算

(一)經費　新俸工餉共洋三八二八元出勤費八八〇元公費材料七〇〇元共計每月預算洋五四〇八元每年二八兩月扣除出勤費及辦公材料等費全年預算爲六一七三六元二十一年二月省令縮減經費該隊預算折減爲每月五〇〇八元二八兩月預算爲三四二五元

(一)成績　見本隊(一)表(第一〇頁)

清理情形

查該處自二十年四月十六日起至二十一年六月底止共計實支經費洋六六五一四元九六四二十一年五月以前逐月經費計算書類業經前水利局核轉二十一年六月份領支洋二七〇〇元因陳隊長病故無人造報經本會核銷轉賬此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局第二測量隊　隊長 李壯懷 顏守仁 牛騰 陳炳乾 王祥甫　自十九年三月一日起至二十年四月十五日止

工作種類	每月預算	全年預算	實用款項				
地形測量	二・九三二〇〇〇	三五・一八四〇〇〇	經費報銷數				合計
			三一・五三三九八四				三一・五三三九八四

李隊長支二六二三元八七九顏守仁支六七七四元二二八牛隊長陳隊長支一一八二七元八八王隊長支二〇二九七元九九七

經過事實

(一)沿革　該隊在建設廳水利工程處時期於十八年七月成立協同第一隊測量隊長章天鐸十九年三月按照修正水利測量計劃改組更委李壯懷爲隊長四月另委顏守仁繼任因襄河路匪警局令調測漢黃路七月局令調服幹堤測量任務改委牛騰爲隊長八月照例爲測量隊辦理內業之期適牛隊長辭職調陳炳乾爲隊長九月陳隊長辭職卽以該隊技士王祥甫升充隊長二十年四月測完幹堤計劃中之自金口至九江一部奉令合併第一隊

(一)組織　十九年三月改組後組織如次：隊長一人技士六人技佐五人事務員一人傳達二人公役十二人測夫三十二人

(一)任務　十九年七月以前任地形測量與第一隊同自九月起任幹堤測量其簡單之任務爲1.應各路堤防設計與勘估之需要2.短時期明瞭幹堤現實情形3.限期五個月江漢兩路測量完竣

(一)經費　每月薪勤工餉洋二五五二元公費材料三五〇元民船費三〇元共計每月預算洋二九三二元按修正計劃內二八兩月祇有薪餉開支但各隊實支雖係遵照規定數而預算書仍係照原額呈送其應減各項並未扣除故本表所列全年預算亦未扣除又該隊任幹堤測量時以搬運較多曾呈准「如公費不足准在以前結存項下開支」

(一)成績　長江北岸沌口至小池口南岸金口至石灰窰幹堤斷面圖各一冊自金口以下至小池口九江地形圖一七五幅

清理情形

該隊自十九年三月至二十年四月十五日止共實支洋三一五二三元九八四李顏牛陳王各任逐月經費計算書類業經前水利局核轉王任二十年四月上半月份書表經本會核轉王任經費內剔除洋三元結存洋一七九元〇四二准扣抵十九年十一月份公費溢支洋一四元〇六八外其餘一六七元九七四已繳本會核收此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局第三測量隊　隊長張靖　自十九年三月十一日起至二十一年十一月三十日止

工作種類	每月預算	全年預算	實用款項	
地形測量	五・四〇八〇〇〇	六一・七三六〇〇〇	經費報銷數	一四六・四三三七八五
			臨時費報銷數	八・〇〇一〇八五
			合計	一五四・四三四八七〇

十九年三月至二十年四月支洋六七〇一九元二四七二十年五月至二十一年十一月支洋七九四一四元五三八

被匪擄損失洋二七五〇元被擄船戶津貼一〇〇元購儀器洋五一五一元〇八五

經過事實

(一)沿革　該隊於十九年三月按照前水利局修正測量計劃組織成立隊長張靖担任測區爲荆河路自武漢起至宜昌止沿江一帶地域二十年四月局令一二兩隊合併爲第一隊改該隊爲第二隊至二十一年十一月水利堤工兩局裁撤該隊移交江漢工程局繼續辦理

(一)組織　隊長一人技士十二人技佐十人辦事員一人傳達二人公役二十二人測夫六十四人

(一)任務　測量長江流域荆河路應測範圍爲兩岸幹堤內各距離三千米達1.幹堤兩岸地形2.堤身橫直剖面3.河身橫剖面4.

河身橫剖面4.最高洪水位及洪水面坡度5.河床狀況6.堤防兩岸建築物及堤身土質以上任務係修正水利測量計劃內所規定之應辦事項但長江方面河身剖面測量該項計劃內規定由局內派員辦理另支經費

又十九年七月奉中央建設委員會令地形測量隊不兼測堤身河身剖面

(一)經費　薪俸工餉共洋三八二八元出勒費八八〇元公費材料七〇〇元共計每月預算洋五四〇八元每年二八兩月祇支薪餉預算洋三八二八元全年預算洋六一七三六元二十一年二月遵奉省政府縮減經費通令縮減爲每月五〇〇八元二八兩月每月三四二五元該隊在第三隊時期實支經費六七〇一九元二四七在第二隊時期實支經費七九四一四元五三八又簰洲被匪刦擄損失公欵洋二七五〇元連同損失儀器公物一併呈由省府核銷又二十一年六月呈准簰洲被擄案內船戶程澤民津貼洋一〇〇元補購儀器工具洋五一五一元〇八五均作該隊用款列支

(二)成績　自白沙洲至新堤已測完二〇三〇平方公里自宜昌至沙市下郝穴測完七五二方公里新堤郝穴之間因匪未清調襄河路漢川縣繼續前第一隊成圖進行測量至十一月水利局裁撤止測至沙洋圖尚未完成

清理情形

查該隊自成立至水利局裁撤止共實支經臨各費洋一五四四三四元八七二十年十二月以前逐月經費計算書類業經前水利局核轉二十一年各月份計算因剔除未繳暨各種手續未補完全或存前堤委會或存前堤工局經本會令據遵繳剔除各欵補完手續當即分別核收審轉此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局襄陽水文站

技士 徐旭初 劉先炳

自十九年三月一日起至二十一年十一月底止

工作種類	實用款項	
水文測量	經費報銷數	五・一八四五七八
	徐劉兩任經費共數	
	合計	五・一八四五七八

經過事實

（一）沿革　該站在建設廳水利工程處時期原名襄陽流量站十八年九月水利局成立各站直隸水文科十九年三月按修正水利測量計劃更名襄陽水文站辦理襄陽至皇庄廟之水文測量計轄宜城流水溝皇庄廟等水尺站二十年三月各水文站裁撤所有任務併入常年勘測隊辦理二十一年九月水利局分爲水利堤工兩局各水文站一律恢復該站於十一月一日成立至月底水利局裁撤止

（一）組織　技士一人技佐一人測夫四人公役一人划夫二人水尺站各設觀測生一人

（一）任務　技士辦理各站之河床斷面測量及流速流量含沙量蒸發量並按期繪成各種曲線圖又管理各分站校正水尺高度審查紀錄等事項技佐助理一切任務觀測生任察看水尺報告水位等工作

（一）經費　該站及所轄各水尺站全月薪勤工餉公費材料等預算洋四二三元伏汛期（七八九月）每月每水尺站加夜間看表僱工洋四元月共十二元連同原預算每月四二三元共四三五元全年預算洋五一一二元十九年三月以前在水利工程處預算內開支另表塡列自十九年三月至二十年二月止技士徐旭初實支洋四九三九元五三八自二十一年十一月恢復技士劉先炳月支經費預算四三一元實支洋二五五元另四分共計如前數

（一）成績　水文測量記載具長期不可間斷之性質非同限期辦理完竣之工程故不能具工作進度報告只按期呈覽圖表記錄由水利局彙核統計

清理情形

徐劉兩任共支洋五一八四元五七八徐任逐月經費計算書類業經前水利局核轉劉任支用經費計算係由本會核轉此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局沙洋水文站

技士 朱友椿 魏國楷

自十九年三月一日起至廿一年十一月三十日止

工作種類	實用款項	
水文測量	經費報銷數	三。三八二八六四
	特支報銷數	一七九〇〇〇
		兩次被匪損失數
	合計	三。五六一八六四
		每月預算四五三元

經過事實

（一）沿革　該站在建設廳水利工程處時期原名沙洋流量站十八年九月水利局成立各站直隸水文科十九年三月按修正水利測量計劃更名沙洋水文站辦理皇庄廟至興隆鎮間之水文測量計轄馬王家營興隆鎮等水尺站八月二十八日共匪陷沙洋公物儀器損失一空工作無形停頓二十年三月各水文站裁撤原有任務併入常年勘測隊辦理二十一年九月水利局分爲水利堤工兩局各水文站一律恢復該站於十一月一日成立至月底水利局裁撤止

（二）組織　技士一人技佐一人測夫四人公役一人划夫二人水尺站各設觀測生一人

（一）任務　技士辦理各站之河床斷面測量及流速流量含沙量蒸發量並按期繪成各種曲綫圖又管理各分站校正水尺審查記錄等事項技佐助理一切任務觀測生任察看水尺報告水位等工作

（一）經費　本站及所轄各水尺站全月薪勤工餉公費材料等預算洋四五三元伏汛期（七八九月）每月每水尺站加夜間看表僱工洋四元共一二元連同原預算每月四五三元共四六五元全年預算洋五四七二元十九年三月以前在水利工程處預算內開支另表填列自十九年三月至六月技士朱友椿支洋一七三二元二三六伏汛期七八兩月支洋九三〇元一三八九月支洋四六五元又支三月份李鳳三匪陷沙洋損失洋四二元九月共匪陷沙洋損失洋一三七元至二十一年十一月該站恢復技士魏國楷月支經費預算四三一元實支二五五元四九共計如前數

（一）成績　水文記載具長期不可間斷之性質非同限期辦理完竣之工程不能具工作進度報告只按期呈費圖表記錄由水利局內技術室彙核統計

清理情形

查朱魏兩任共支洋三五六一元八六四朱任六月以前逐月計算書類業經前水利局核轉又李匪及共匪前後陷沙洋損失公欵及七八兩月單據均呈經省政府核銷朱任九月份經費暨魏任支用經費經本會分別令據造送計算核轉此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局澤口水文站

技士王範 劉先炳 崔鶴峯

自十九年三月一日起至二十一年十一月底止

工作種類	實用款項			
水文測量	經費報銷數	五・八九五八六五	王劉崔三任經費共數	合計 五・八九五八六五
			每月預算四九三元	

經過事實

（一）沿革　該站在建設廳水利工程處時期原名澤口流量站十八年九月水利局成立各站直隸水文科十九年三月按修正水利測量計劃更名澤口水文站辦理興隆鎮至脈旺嘴間之水文測量計轄陶朱埠岳口麻洋潭沔陽脈旺嘴等水尺站二十年三月各水文站裁撤所有任務併入常年勘測隊辦理二十一年九月水利局分爲水利堤工南局各水文站一律恢復該站於十一月一日成立至月底水利局裁撤止

（一）組織　技士一人技佐一人測夫四人公役一人划夫二人水尺站各設觀測生一人

（一）任務　技士辦理各站之河床斷面測量及流量流速含沙量蒸發量并按期繪成各種曲線圖又管理各分站校正水尺審查記錄等事項技佐助理一切任務觀測生任察看水尺報告水位等工作

（一）經費　該站及所轄各水尺站全月薪勤工餉公費材料等預算洋四九三元伏汛期（七八九月）每月每水尺站加夜間看表雇工洋四元共一〇元連同原預算每月四九三元共五一三元全年預算洋五九七六元十九年三月以前在水利工程處預算內開支另表填列自十九年三月至四月技士王範實支洋九四三元八二自五月至二十年二月裁撤止技士劉先炳實支洋四六六六元五四五至二十一年十一月該站恢復技士崔鶴峯月支經費預算四七一元實支二八五元五角共如前數

（一）成績　水文記載具長期不可間斷之性質非同限期辦理完竣之工程故不能具工作進度報告只按期呈覽圖表記錄由水利局內技術室彙核統計

清理情形

查王劉崔三任共支洋五八九五元八六五王劉兩任逐月經費計算書類業經前水利局核轉崔任支用經費計算係由本會核轉此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局監利水文站　技士 龔維祥 蔡增祚　自十九年三月一日起至二十一年十一月底止

工作種類	實用款項		
水文測量	經費報銷數	七・八〇〇二五一	龔蔡兩任經費及水利局直放工餉共數
	特支報銷數	三九九二〇〇	損失公欵三一五元二郵金八四元
	合計	八・一九九四五一	每月預算六九六元

經過事實

(一)沿革　該站在建設廳水利工程處時期原名調關流量站繼改爲監利流量站十八年九月水利局成立各站直隸水文科十九年三月按修正水利測量計劃更名監利水文站辦理宜昌至新隄間之水文測量計轄宜都松滋紅水港城陵磯新隄等水尺站九月二十二日共匪陷監利技士龔維祥隻身逃省十一月委充武穴站技士令結束監利站至十二月上半月止原設各分站由局直轄照舊工作另編五分站觀測生工餉預算每月一百元二十年三月各水文站裁撤所有一切任務併入常年勘測隊辦理二十一年九月水利局分爲水利堤工兩局各水文站一律恢復該站十一月一日成立至月底水利局裁撤止

(一)組織　技士一人幫辦技士一人技佐一人測夫四人公役一人划夫二人水尺站各設觀測生一人

(一)任務　技士一人負本站及各分站之河床斷面測量及流速流量含沙量蒸發量並按期繪成各種曲綫圖又管理各分站校正水尺高度暨查水標記錄等事項幫辦技士及技佐助理一切任務觀測生任察看水尺報告水位等工作

(一)經費　該站及所轄各水尺站全月薪勤工餉公費材料等預算洋六九六元洪水期(七八九月)每月另加輪租煤費洋一二〇〇元連同原預算每月六九六元共計月支洋一八九六元全年預算一一九五二元十九年三月以前在水利工程處預算內開支另表塡列自十九年三月至十二月上半月停辦止技士龔維祥支經費洋七一二五元八九一共匪陷監時損失公欵洋三一五元二測夫姜尙池遇害郵金八四元(三帝廟堤工處長張鳳樓領發)十二月下半月至二十年二月各分站觀測生工餉洋二五〇元由水利局直放二十一年十一月技士蔡增祥月支經費預算六四九元實支四二四元三六合計如前數

(一)成績　水文測量爲長久不斷之工作其圖表由技術室彙核統計無工作進度報告

清理情形

查龔蔡兩任共支洋八一九九元四五一龔任逐月經費計算書類實由前水利局核轉損失公欵及測夫郵金呈奉省政府分別核准核銷水利局直放工餉由局編造預計算函送財廳核轉至蔡任經費計算係由本會核轉此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局武漢水文站

技士 黃秉政 柳維華

自十九年三月一日起至廿一年十一月底日止

工作種類	實用款項			
水文測量	經費報銷數			合計
	一〇・四六六三九七			一〇・四六六三九七
	黃柳兩任經費共數			

經過事實

(一)沿革　該站在前建設廳水利工程處時期原名武漢流量站十八年九月水利局成立各站直隸水文科十九年三月按修正水利測量計劃更名武漢水文站辦理新堤至泥磯及漢口至漢川之水文測量計轄花口大咀沃洲洲禹觀山沌口諶家磯泥磯舵落口漢川等水尺站二十年三月各水文站裁撤所有一切任務併入常年勘測隊辦理二十一年九月水利局分爲水利堤工兩局十一月各水文站一律恢復至十一月底水利局裁撤止

(二)組織　技士一人技佐一人測夫四人公役一人划夫二人水尺站各設觀測生一人

(一)任務　技士担任本站及各分站之河床斷面測量流速測量及計算流量泥沙量蒸發量並按期繪成曲線圖又管理各分站校正各水尺零點高度審查水標記錄等事項技佐助理一切任務觀測生任察看水尺報告水位等工作

(二)經費　全站及各水尺站薪勤工餉公費材料共月支五三〇元五月增爲五六五元六月增爲六〇〇元洪水期(七八九月)每月另加租輪費煤費一二〇〇元連同原預算六〇〇元共月支一八〇〇元全年預算洋一〇一七〇元十九年三月以前在水利工程處預算內開支另表塡列自十九年三月起至二十年二月底該站裁撤止技士黃秉政共支洋一〇〇五二元七二七至二十一年十一月技士柳維華月支經費預算五〇五元實支四一三元六七合計如前數

(三)成績　水文測量爲不可間斷之工作非如他種工程可以限期辦理完竣其各種水文圖表呈由水利局內技術室審核統計故水文站除呈覽圖表外無工作進度之報告

清理情形

查黃柳兩任共支洋一〇四六六元三九七黃任逐月經費計算書類業經前水利局核轉柳任支用經費計算係由本會核轉此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局武穴水文站　技士　楊保身　龔維祥　黃秉政　自十九年三月一日起至二十一年十一月底止

工作種類	實用款項	
水文測量	經費報銷數	八・五二八八六三
	合計	八・五二八八六三
		楊龔黃三任經費共數
		每月預算四九八元

經過事實

(一)沿革　該站在建設廳水利工程處時期原名武穴流量站十八年九月水利局成立各站直隸水文科十九年三月按修正水利測量計劃更名武穴水文站辦理泥磯至武穴間之水文測量計轄巴河蘄春富池口軍山咀等水尺站二十年三月各水文站裁撤所有一切任務併入常年勘測隊辦理二十一年九月水利局分爲水利堤工兩局各水文站一律恢復該站自十一月一日成立至月底水利局裁撤止

(二)組織　技士一人技佐一人測夫四人公役一人划夫二人水尺站各設觀測生一人

(一)任務　技士担任本站及各分站之河床斷面測量及流速流量泥沙量蒸發量並按期繪成各種曲綫圖又管理各分站校正水尺審查水標等事項技佐助理一切任務觀測生任察看水尺報告水位等工作

(一)經費　本站及各水尺站全月薪勤工餉公費材料預算洋四九八元洪水期內(七八月)每月另加租輪媒費洋一二〇〇元連同原預算每月四九八元計月支一六九八元全年預算九五七六元十九年三月以前在水利工程處預算內開支另表塡列自十九年三月至十月技士楊保身支洋六二五八元三〇八十一月至二十年二月技士龔維祥支洋一九二八元五九五二十一年十一月技士黃秉政月支經費預算四九三元實支三四一元九六共支如前數

(一)成績　水文測量爲長期不可間斷之工作非如他種工程可以限期辦理完竣其水文圖表呈由水利局內技術室審核統計彙集比較故水文站除按期呈覆圖表外不能有工作進度之報告

清理情形

查楊龔黃三任共支洋八五二八元八六三楊龔兩任逐月經費計算書類業經前水利局核轉黃任支用經費計算係由本會核轉此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局常年勘測隊長江組　組長 黎其位 李錫爵　自二十年三月二日起至二十一年十月三十一止

工作種類	實用款項		
勘估水文測量	經費報銷數	五六・九四〇〇一五	兩次開辦費六六三元七六在內
	特支報銷數	二四・五一五一一五	購船費及被擄損失醫藥郵金等費均在內
	水尺費報銷數	七七三一三	
	合計	八一・五三二四四三	

經過事實

(一)沿革　二十年二月前水利局組織常年勘測隊分長江襄河爲兩組委黎其位爲長江組組長曾祥俊爲襄河組組長長江組於三月二日成立九月舟次鐘洲遇匪自組長以下所有員工全體被擄工作停頓至十一月組長及員工漸逃出十二月奉令繼續組織成立二十一年五月被擄員工始陸續脫險回省結果技士技佐測夫划夫慘死者共八人二十一年八月組長黎其位辭職局令以技士李錫爵繼任嗣因水利堤工兩局分立該組奉令於十月底裁撤

(二)任務1.自宜昌至九江爲該組勘測範圍2.查勘堤防兩岸險夷情形3.勘估應修工程並核計應需工款4.管理兩岸各水尺站5.水文站裁撤後之一切水文測量任務6.每年在宜昌九江間往返復測三次

（一）組織、技士四人指定高級技士一人爲組長技佐三人事務員一人觀測生二十人測夫九人公役四人划夫二人（輪船工人組織在外）

（一）經費 1.預算 二十年三四兩月用局中原有之水利輪每月預算洋二四四九元五六兩月因購用辛壬輪另加輪工薪餉及煤費每月預算洋三二四一元七月以後經財政廳覈去住船租金八〇元每月預算洋三一六一・元十二月再組織成立因辛壬輪被匪刦去租輪應用另加租輪費每月預算洋三九八一元二十一年二月以後折減預算爲三八五四元 2。實支 a 經常費二十年三月至十一月實支洋二四七九九元九七五十二月至二十一年八月實支洋二五三〇〇元七九九月至十月實支洋六一七五元四九 b 開辦費二十年三月組織常年勘測隊時該組實支開辦費洋三四一元九二十一年元月該組脫險後再組織成立時實支開辦費洋三二一元八六 c 購船費二十年四月辛壬輪購價洋一八五〇〇元修理費洋二〇〇〇元添購零件洋二六四元〇四 d 特支費二十年九月簿洲被擄損失公欵一七八〇元四七五損失開辦費結存洋八二元損失四站觀測生工餉洋八〇元二十年十二月至二十一年五月被擄員工工餉洋共六六〇元二十年十一月被擄技佐汪如洋醫藥洋三一元五二十一年三月鎗傷輪工醫藥洋六三元二十年十二月殉難見習生詹耀宅測夫龔塘卿王世如刦失劉萬田埋葬費洋三二八元二十一年元月技士駱家本龔維祥朱重安技佐沈開源郵金洋八〇〇元二十一年建修謙家磯固定水尺經費洋七七元三一三元（張公堤工程處經辦）共合如前數

（一）成績 該組成立不久適值本年大水又遭匪刦故勘估成績不著或不適用二十一年勘估圖表堤工局及江漢局多採用再水文成績另詳水文站表

清理情形

查該組黎李兩任經臨特支各費共支出洋八一五三二元四四三二十年三月至八月及二十一年七月經常費支出計算書類經前水利局核轉二十年六・七・八・九等月及二十一年元二・三・四・五・六・八・九・十等月經費支出計算書類由本會核轉其開辦費及特支各費經前水利局及本會先後核轉至損失各欵亦經前水利局呈奉湖北省政府准予核銷各在案此案完結

湖北水利堤工事務清理委員會清理水利報告表

湖北水利局常年勘測隊襄河組　組長曾祥俊　自二十年三月二日起至二十一年十月三十一日止

工作種類	實用款項		
勘估測量水文	經費報銷數	四六・四九五四〇九	開辦費三四八元六在內
	特支報銷數	三・八六九六八〇	購輪船費三五八三元六八輪船零件費二八六元共如上數
	水尺費報銷數	七六五一一三	舵落口二四〇元六九二漢川一六三元四五仙桃鎮三六〇元九七
	合計	五一・一三〇三〇一	

經過事實

(一)沿革　二十年三月成立組長曾祥俊至二十一年十月水利堤工兩局分立該隊奉令裁撤

(二)任務　1.自漢口至鍾祥爲該組勘測範圍2.查勘兩岸堤防險夷情形3.勘測應修工程及核計應需工款4.管理兩岸各水尺站5.水文站裁撤後之一切水文測量任務6.每年往返漢口鍾祥間覆勘三次

(三)經費　二十年三四兩月無汽輪每月預算洋一九〇九元自五月起因購用癸甲輪另加輪工暨汽油費每月預算洋二五〇〇元二十一年二月以後折減預算每月爲二三七三元又舵落口水尺費二四〇元六九二漢川水尺費一六三元四五仙桃鎮水尺費

三六〇元九七（均由附近各工程處經辦）

（一）組織　技士四人（指定高級技士一人爲組長）技佐三人事務員一人觀測生十五人測夫九人公役四人划夫二人汽輪職工在外

（二）成績　二十年因成立伊始襄河一帶匪共騷擾復遭本年大水以致勘估成績不著或不適用二十一年勘估圖表堤工局及江漢局多採用再水文成績另詳水文站表

清理情形

查該組實支經臨各費共洋五一一三〇元二〇一二十年三月至二十一年七月份經費支出計算書類經前水利局核轉開辦費及二十一年八九十月經費又各處水尺費各計算書類由本會轉送財政廳此案完結

雜案彙編

清理雜案彙編

本會奉令清理前湖北水利堤工兩局暨堤工經費管理委員會歷年積案分堤欵堤工水利三部分所有經過情形已於前三篇述其概要此外尚有不屬於前數篇範圍如水利堤工兩局歷任由本局直接支出各出差委員旅費各縣雨量觀測員薪俸各堤工程處結束津貼各項雜支暨水利工程測量隊流量站等經臨費用以及堤工經費管理委員會懸而未決如川江龍公司倒塌堤欵長岳關監督毛鍾才侵蝕堤欵鍾祥船捐處欠領經費各案情節特殊性質各別經本會逐案清理核擬辦法呈奉總司部核准施行有案已解決者有尚待核辦者均本會清理工作之重要部分茲將各該案情形及有關係公牘分錄於後

(一)清理前水利堤工兩局暨建設廳歷年支付各縣雨量觀測員薪俸各堤工處結束津貼及各項雜費懸案

(甲)呈　總司令部請示文：呈爲呈請示遵事竊本會清查湖北前水利局暨建設廳兼辦水利事業時歷任支付各縣雨量觀測員薪俸並各堤工程處辦理結束津貼及經支各項雜費共計洋三萬二千四百五十九元四角一分七厘均未編造計算書呈報核銷謹別爲三項情形臚列於後

1. 各縣雨量觀測員薪俸　查各縣雨量觀測員一職係於十九年七月由前水利局呈准設立由縣政府錄事兼充每縣月支薪俸洋一十元有堤各縣在徵獲田賦附加堤捐項下坐支抵解無堤各縣由局直發自十九年七月份成立起截至二十一年十一月底裁局止共支洋七千四百九十五元因歷任水利局長每屆移交各縣單據不能到齊歷未造報

2. 各堤工程處辦理結束津貼　查此案係於十七年二月由前水利局長胡忠民呈准各堤工程處於辦理結束時每月支給津貼洋四十元當日定此辦法原爲便利事實俾得迅速結束起見詎料實行後各處反故意拖延希圖多領津貼迨彭局長介石到任遂通

令撤銷祇准未經領過津貼者支給兩個月之數計洋八十元除自十八年起歷屆各堤工程處對於此項費用已遵局令另案造報外其在十八年以前各堤工程處收領此項津貼未經造報者共計洋六千九百另九元一角三分七厘

3. 經支各項雜費　查歷任雜支共計洋一萬八千另五十五元二角八分內以購辦儀器爲數最鉅其未造報原因在前水利局胡局長呈准所購一批單據完全未報計算爲手續欠缺在建設廳石廳長所購者（水利事務建設廳辦）因彼時尚未取得正式收據在復設水利局彭局長（由建設廳劃出設局）則因照原案核定應購之件當時貨尚未到未經購齊不能報計次則水利工程師安利森及其所屬人員俸給並防汛視察員俸給等項支數較多（十七年建設廳石廳長於廳內設立水利工程處聘安利森爲水利工程師其下設技士等員該工程師及各員俸給由水利局照案撥付）當時漏未報計其餘各項雜支亦均有案可查

以上三項在前水利局暨建設廳辦理水利事業時歷任均有支用類皆於交卸時將單據移交卽爲畢事而後任接收單據後亦復逐任遞交遂懸擱至今論其手續未備各任均應負責但補報計算因前後任套搭關係旣未能指定應歸某任辦理而本會又未便爲之代編可否仰懇

鈞部俯念困難情形且款係照案開支予以通融准免造報計算卽由本會將接收上列各項單據分案查敘情形呈覆核銷以了懸案理合錄同經支各項雜費明細表具文呈請

鈞部鑒核伏乞

令示祇遵謹呈

豫鄂皖三省剿匪總司令蔣

湖北水利堤工事務清理委員會　主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

附前水利局建設廳歷任經支各堤工程處結束津貼洋數表

任別	經支洋數	備考
前水利局長胡忠民任內	一、七八七九八四	嘉蒲咸武支四〇〇元蒲咸協修支一六〇元漢黃一段支五二〇元漢黃二段支一二〇元太安垸支四〇元彭市河漚蔴垸支一五四元六五八深河潭趙家台支一二六元六六賴家集支一二〇元張公堤支一〇六元六六六武泰武豐支四〇元
前建設廳長石　瑛任內	三、一六三八五	張公堤支四〇元蒲咸協修支二一八元六二昔淵口支二三七元三二漢黃一段支二〇〇元漢黃一段支四〇〇元孫家拐支三二〇元荊唐五支二一四元六六三賴家集支一九七元二三深河潭趙家台支一六〇元王唐黃袁支二一二元宏恩堤支三二〇元梅魏家灣支一八五元三三武泰武豐支一三八元六六二昌大支一六〇元彭市河漚蔴垸支一六〇元
前建設廳長蕭　萱任內	一、五一七三八	梅魏家灣支三六元昌大支一四一元三二八王唐黃袁支二〇〇元昔淵口支一六〇元蒲咸協修支一二〇元張公堤支二八〇元漢黃三段支二四〇元大安垸支二四〇元
前水利局長彭介石任內	三〇〇〇〇〇	蒲咸協修支二〇〇元鍾祥三四工支八〇元昔淵口姚家月支八〇元
前水利局長姜明經任內	八〇〇〇〇	簡家灣支八〇元
合計	六、九〇九、三七	

附湖北建設廳暨前湖北水利局經支雜欵未經造報明細表

款別	經支數	備考
漢口張公隄防汛材料保管費	二九一〇〇〇	十六年十二月至十七年二月共洋一六〇元（胡任）又自十七年十一月分起至二十一年三月分止每月三元共洋一百二十三元又搬運費

八元（蕭彭方彭陳姜各任）三項計支如上數

購辦儀器	九五七二一四〇		建設廳石廳長水利局彭胡兩局長各任經購
局員獎金	二四〇〇〇〇		水利局胡局長任內呈准有案
兌換損失	六〇三六六六		水利局胡局長任內中央銀行漢口分行撥還堤欵內有銅元一萬〇一百六十五串八百六十文每三千文合洋一元計合洋三千六百二十一元九角六分經胡局長派員會同隄費保管處丁委員按照市價三六合洋三千〇十八元二角九分四厘計貼水洋六百〇三元六角六分六厘
武泰武豐隄防守處被刦損失	八九五七八		
購置保險櫃	三一〇二〇〇		水利局胡局長任內
漢口張公隄啟閘閉閘費	三五二二〇〇		彭復任一七五元陳初任三八元六姜任一〇〇元陳復任三八元六共支如上數
鍾祥護城堤補助費	一九四四四四		彭復任九四元四四四（十八年及十九年歲修補助）由鍾祥船捐撥付二十年歲修補助）又陳任一〇〇元
郵電費	一二九六〇〇		建設廳十八年電請重慶關稅務司逐日電告水位匯寄電費六十三元又水利局陳任寄發水災救濟會各項圖表航空郵費六十六元六角
防汛雜支	一〇一四二五二		水利局胡局長任內
水利工程師安利森及其所屬人員俸給	二〇〇〇〇〇〇		水利局胡局長任內
驗收測估人員俸給	七一五二〇〇		水利局胡局長任內
防汛視察員俸給	一一三〇〇〇〇		建設廳蕭廳長任內
驗收測估人員俸給	六八〇〇〇〇		水利局陳姜兩局長任內
故員郵金	七三三〇〇〇		水利局方陳兩局長任內

合　計　一八〇五五二八〇

豫鄂皖三省勦匪總司令部指令　（秘財鄂字第五三二號）

令湖北水利堤工事務清理委員會主任委員李書城副主任委員朱玖瑩

呈一件爲湖北前水利局及建設廳歷任支付各縣雨量觀測員薪俸並各堤工程處辦理結束津貼及經支各項雜費可否准免造報計算及由本會將接收單據呈責核銷以了懸案請核示祇遵由

呈件均悉所陳尙屬實在姑准免造計算卽由該會將接收單據呈送本部暫送全國經濟委員會核銷可也此令表存

（乙）清檢各項單據覆請核轉呈文：呈爲呈請事案查前湖北水利局及建設廳歷任支付各縣雨量員薪俸並各堤工程處辦理結束津貼及經支各項雜費可否准予免造計算及由本會將接收單據呈覆核銷一案於四月十八日奉

鈞部秘財鄂字第五三二號指令開呈件均悉所陳尙屬實在姑准免造計算卽由該會將接收單據呈送本部轉送全國經濟委員會核銷可也此令等因奉此自應遵辦查此案原報之數爲三萬二千四百五十元四角一分七釐嗣因

全國經濟委員會湖北堤工專款保管委員會先後函送二十一年十一月底以前有堤各縣雨量員薪俸收據到會經查照原案分別轉帳者計洋一千五百一十元亦經呈奉

鈞部秘財鄂字第七三三號指令准予備案彙覆核銷在案以上兩項總共洋三萬三千九百六十九元四角一分七厘正副單據一千另八十九號除函湖北省政府查照外理合清檢單據分項粘存並編製明細表呈覆

鈞部鑒核轉送

全國經濟委員會核銷再各項單據間有未貼印花現無從追飭補完手續合併呈明謹呈

豫鄂皖三省剿匪總司令蔣

計呈賫表三份　單據粘存簿四本

湖北水利堤工事務清理委員會主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

豫鄂皖三省剿匪總司令部指令

（秘財鄂字第七九二號）

令湖北水利堤工事務清理委員會主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

呈一件爲奉令清檢湖北前水利局及建設廳歷任支付各縣雨量員薪俸並各堤工程處辦理結束津貼及經支各項雜費單據編造細明表祈鑒核存轉示遵由

呈件均悉已予轉送全國經濟委員會核銷矣仰卽知照此令

（丙）清理前湖北水利局支付各項雜欵縣案續請核銷呈文

呈爲呈請事查本會清理前湖北水利堤工兩局經支各縣雨量觀測員薪水各堤工程處結束津貼及各項雜支等費均未造報計算一案曾遵令將接收各項單據呈奉

鈞部秘財鄂字第七九二號指令轉送全國經濟委員會核銷在案旋陸續清理其他縣案又查得前水利局經支各項雜欵尙有未造報計算者五起謹分案臚陳於後

（一）前湖北水利局技士王秉衡二十年七月份經支地形測量抽查出勤費洋一百二十九元另三分一案

查技士王秉衡在前水利局具領二十年七月份抽查地形測量出勤費一百二十九元另三分已據造具清冊並檢同單據三十張呈局經局查核單據支款與冊列相符惟單據手續欠缺發還更正詎王秉衡卽返原籍河北至今尙未遵辦前水利局卽無從

造報計算現本會擬照數轉帳惟欵未核銷謹將支欵清冊檢送

鈞部可否俯念該欵開支屬實准其免造計算逕予核銷

(二)前京潛堤工處長楊烜經支贖取沙洋水文站經緯儀雜費一百九十一元一角四分一厘

查十九年九月沙洋水文站被匪搶刦損失儀器圖表等件經派員赴鄉探查經緯儀一架尚存民間須洋一百六十元贖取水利局遂飭京潛堤工處長楊烜就近照數墊付旋據楊烜將贖欵及往返用費單據十四件共支洋一百九十一元一角四分一厘連同日記等件呈覆到局經呈奉湖北省政府指令准在測繪地形特別費結存項下開支前水利局擱置未辦以致該欵虛懸未結本會現擬照數分別轉帳謹將原覆單據暨清冊日記一併檢呈

鈞部可否俯准免造計算逕予核銷

(三)前湖北水利局第二測量隊隊長張靖經支補給程澤民損失洋一百元一案

卷前查水利局第一測量隊及常年勘測隊長江組於二十年九月行至嘉魚縣屬簰洲地方被匪擄劫一案據該隊雇用之帆船船戶程澤民具稟船被匪擄懇補償損失等情經局令據第二測量隊隊長張靖查復屬實復由局呈奉省政府指令准給程澤民損失洋一百元又由局令據該隊長呈送預算書單轉函前湖北堤工經費管理委員會如數撥欵令發該隊長轉給具領在案但計算迄未造報補辦實感困難本會擬照數轉帳謹檢呈領款總收據敬乞

鈞部俯准免造計算逕予核銷

(四)前監利三帝廟堤工程處長張鳳樓經支監利水文站測夫姜尚池恤金八十四元一案

卷查十九年九月二十二日監利水文站遭共匪刦掠測夫姜尚池被戕由該站技士龔維祥呈請撫恤經局令派技士黃秉政查復屬實復經依照修改湖北堤工獎懲暫行章程之規定給予姜尚池撫卹洋八十四元由湖北堤工經費項下開支呈奉湖北省政府指令照准並以該水文站已經裁撤由局令飭監利三帝廟堤工處長張鳳樓先就該處工欵項下挪撥給領呈核旋據該處

長呈報前項撫郵洋八十四元已如數墊給姜余氏母子親領取具領狀保結呈請核發歸墊又經局指令照准復因張鳳樓交卸由繼任處長王祥甫出具領據赴局如數領去歸墊但未造報計算呈請核銷本會擬照數轉帳謹檢呈原覆各據擬懇

鈞部垂念欵係呈准開支俯准免造計算逕予核銷

(五)前武泰武豐堤閘防守局局長王克創經支開放武豐閘用費洋四十八元二角三分八厘又繼任局長蔡美章經支關閉武泰武豐兩閘用費洋一百二十元另二角七分一案

卷查十五年十一月三十日武泰閘防守局局長王克創以開放武豐閘估計需費三十元呈經前水利局令准照發旋據該局長呈報共用洋三十三元三角二分八厘除已領外其餘三元二角二分八厘請補給附呈帳目一紙單據七紙經局令換具總印領來局領取十六年二月二十四日據該局長呈報該閘再開一日計用錢五十串另七百文合洋十四九角一分附呈單據二紙復經局令准核銷具印領來局領取又繼任武泰武豐隄閘防守局局長蔡美章十六年六月十三日呈報該局閉閘洋六十九元八角二分公安局代清閘板及閘板搬移費洋十元另四角五分武豐分局閉閘費洋四十元請併發給附呈清冊一份單據十三帋經前水利局令仰出具印領來局領取各等因在卷但均未造辦計算轉帳核銷茲檢齊各項單據連同原報帳單清冊呈乞

鈞部鑒核擬懇俯准免造計算逕予核銷

以上係水利局雜項用費未了舊案五起本會於清理他案在卷中陸續檢出核閱各欵領據均屬相符帳目亦照數列支但均係暫記科目未便正式列報惟各有特殊情形實難完成計算手續爲結清懸案起見似應分別照數轉帳可否援照前案照數核銷之處理合分別錄敘各原案概要情形並檢同證件彙案具文呈報

鈞部鑒核示遵謹呈

豫鄂皖三省剿匪總司令蔣

計檢覆

(一)王秉衡經支抽查費案內支出清冊一份
(二)贖取經緯儀案內單據十四紙雜費清單旅費日記各一份
(三)補給程澤民損失案內領款總收據一帋
(四)姜尙池郵金案內領款總收據一帋領狀保結各一帋
(五)武泰武豐閘開閉費案內領據四紙單據二十二紙(內開閘費九紙閉閘費十三紙)
武泰武豐閘開閉費案內帳單一份支出清冊一份

湖北水利隄工事通理委員會主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

豫鄂皖三省剿匪總司令部指令

(秘財鄂字第一〇二〇號)

令湖北水利隄工事務清理委員會主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

呈一件爲查得前湖北水利局經支各項雜款尙有未經造報計算者五起謹分案臚列概要情形檢同各案原賫單據呈請鑒核由

呈件均悉姑准核銷以清積案仰卽知照此令附件存

(二)清理前水利堤工兩局暨建設廳歷年經支堤防出差人員旅費懸案

(甲)呈　總司令部請准核銷文：呈爲呈報清理前湖北水利隄工兩局暨建設廳歷年經支出差委員旅費懸未報銷各案經過情形謹分類造表並檢單據賫請
鑒准核銷指令祇遵事案查前水利隄工兩局暨建設廳管理水利事務期間支用隄款辦法向係呈准湖北省政府事先給領數萬元

或數十萬元不等事後按支欵性質分別補送預計算書呈請核銷關於隨時支給勘估驗收調查各委員出差旅費亦係照例辦理按月報銷其有出差人員未回主官交替或移轉管轄暫不能確定支數及出差人報銷手續未完局廳不能按時彙送湖北省政府核銷者歷任均有同樣之暫記欵項懸而未結共計七十七件懸欵一萬二千二百二十三元八角八分四厘本會澈底清理核其懸案原因有前任出差人在本任繳領尾數造報局廳尚未轉審者有業已造報出差人因他案關係或結餘未繳其報銷未轉者有領欵後從未造報者有計算發還更正延未呈復者情節各異懸帳莫結本會會列名登報限各出差人投會了結並分令嚴催在卷數月以來各出差人將報銷呈送本會者即根據審計法規分別准駁如旅費尚有結餘即令照數繳還不敷即彙案呈請

鈞部核發轉飭補領如該欵領欵人另案有款項繳領關係亦分別照案抵撥截至現在止所有核辦情形分列於後

(一)令據陸續造報核准者計三十七案前帳列暫支旅費洋四千四百七十七元六角二分審核准支洋三千八百一十四元八角九分六厘相差之數已分飭繳領或照數抵撥詳後表

(二)案情特殊經本會第十六次會議議決照原支領洋數特予核銷轉帳者計十六案共洋二千六百六十元零零四釐

(三)經前水利局核准未轉現應彙報者計有十案前帳列載暫支旅費洋二千三百七十五元三角審核准支洋二千二百零四元六角五分二厘餘數分飭繳還或補發詳後表

此外尚有已送計算發還更正未復及從未報計或欠欵未繳者計十四案共尚懸旅費洋二千七百一十元零九角六分

以上(一)(二)(三)各項經本會暨前水利局核准旅費合計洋八千六百七十九元五角五分二厘應屬於未經呈准之開支欵項雖經審查開支屬實究未便率爾正式列帳擬請

鈞部准予核銷俾了懸案至尚未報銷及尚未結案旅費洋二千七百一十元零九角六分暨報經本會或前水利局核准尚欠繳餘款洋三百八十一元四角二分各該領欵人員或因事隔數年踪跡不明或係有意玩忽置若罔聞以致未能全部清結亦惟有彙案移交接辦本會之機關分別陸續查催俾資了結而重公欵所有清理前水利隄工兩局暨建設廳管理水利事務歷年旅費懸案經過情形

并懇予核銷及續催各緣由理合分項繕具表冊連同各該員報銷原件一併備文呈請

鈞部伏乞

鑒核援照上次呈准核銷前水利局支給各縣雨量員薪俸結束津貼及雜支共洋三三九六九元四一七前例（奉秘財鄂字五三二號指令）准予核銷將附件函轉全國經濟委員會核辦並乞

指令祇遵實為公便謹呈

豫鄂皖三省剿匪總司令蔣

附賣呈

A核准前水利隄工兩局暨建設廳歷年出差人員旅費報銷各案一覽表一份

B代轉前水利局核准尚未轉報歷年出差人員旅費報銷各案一覽表一份

C令催前水利局建設廳歷年出差人員造辦報銷繳還欠款未結各案一覽表一份

D呈賣歷年出差人員旅費報銷附件清冊一本（附旅費計算書四十一紙單據簿三十三本又單據三十二張旅費日記三十九紙工作日記二十三紙旅費清單三紙）

湖北水利隄工事務清理委員會主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

（A）

核准前水利局隄工局暨建設廳歷年出差人員旅費報銷各案一覽表

長官任別	出差人員姓名	出差事由	預支洋數（單位元）	核定報銷洋數	繳還洋數	補發洋數	懸欠洋數	備考
水利局王任	劉邦傑	驗收漢黃一段堤工	四五〇〇	四五〇〇				該員會同建設廳委員吳大璋驗收于十六年七月二日具領旅費如上

劉邦傑	同上	九〇〇〇	九〇〇〇				數本表所列王任經支旅費計洋八〇二元二俱未造報計算本會以當時政局粗定局定報計手續不以現今完備且該局自胡任起始規定正式報計現事隔數年人事多各變遷不能催報齊全亦屬事實關係本會特於第十六次會議第三案議決將王任經支旅費八〇二元二角特予核銷分別轉賬以了懸案並呈報總司令部備案
劉邦傑 吳大璋	會領弓手劉覺三王子卿隨同驗收漢黃一段出差三五天工餉	四〇〇〇	四〇〇〇				
田蔚光	驗收武泰武豐隄閘	二〇〇〇	二〇〇〇				
唐虞	驗收嘉蒲咸武隄	五〇〇〇	五〇〇〇				
張鳳樓	驗收張公隄	一四四〇	一四四〇〇				
賀學海	赴武泰閘監視啟閘并點驗材料	三六〇〇	三六〇〇				
李以寧	查驗襄河各隄料具及王唐黃袁工程并鍾祥三四工丁專員控案	二九六〇〇	二九六〇〇				
譚聲濤 千天民	驗收簡家灣昔淵口隄工	二六〇〇〇	二六〇〇〇				
劉榮夏	查驗荊河各隄料具	一二六〇〇	一二六〇〇				
蔡美章	查驗漢黃各隄料具	九〇〇〇	九〇〇〇				
胡任 劉昇恒	驗收漢黃三段隄工	七〇〇〇	八八二六五			一八二六五	

劉昇恆	驗收宏恩隄工	三〇〇〇〇	三六〇六一				八〇六一		該員係局內職員十七年三月二十四日具領出差費如上數其支用旅費細數於領款收據上曾經註明本會曾通令補報迄未遵辦經第十六次會議第三案議決特予核銷轉賬併呈報　總司令部備案
杜逢康	驗收武泰武豐防守局屋	一六七四	一六七四						
譚佩蓀	驗收鍾祥三四工及該隄工處損失案	一五二〇〇	一三五二〇〇	一六二〇〇					
陳億龍	驗收漢黃二段隄工	四〇〇〇	三九九〇〇	〇一〇〇					
吳煥章 劉萬選	驗收宏恩隄及蒲咸協修隄	一六二九〇	一七二五四〇	二三七五〇					
曾祥俊	第一次勘估襄河路隄工	一〇〇〇〇	一〇一三七五		七三七五				
曾祥俊	第二次勘估襄河路隄工	一〇〇〇〇	一五二六五〇		五三六五〇				
葉萬青	復估漢黃路隄	一〇〇〇〇	一三六〇〇		三六〇〇				
建設廳 石任	王家重赴嘉魚密查宏恩隄包工誤工案	四〇〇〇	四〇〇〇						
水利局 王任	建設廳局奉廳令照解三路石任廳委復估費	一〇四一三〇	一〇四一三〇						上列水利局王任三次撥付建設廳石任派員勘驗隄工出差旅費計洋一六六六元一三均有案可稽賬內列爲暫記由王任轉交胡任胡任再轉交石任本會以當時建設廳委員姓名各員支領旅費數目及已否報銷均屬無從查考經第十六次會議第三案議決即以建設廳名義付帳正式轉賬銷案並呈報　總部備案
同上	局照付廳委技士吳大璋驗收漢黃一段旅費	一三五〇〇〇	一三五〇〇〇						
同上	局准建廳一科函知照解廳委驗收各隄旅費	五〇〇〇〇	五〇〇〇〇						

建設廳任	王家重	調查樊口隄閘湖荒糾紛案	五〇〇〇	五〇〇〇				
	李賓澤 李藝奇	調查車灣隄工處失慎情形	二二〇〇〇	二二〇〇〇				
	高崇芝	測量嘉魚馬鞍山蠻石	四〇〇〇	八四八七〇		四四八七〇		
	王祥甫 徐家鎮	驗收三帝廟堤工程處堤工	一〇一〇〇〇	二〇一〇〇〇				
水利局任	彭周	查勘樊口堤閘及湖荒事宜	六五〇〇〇	六一八〇〇	三二〇〇			
	劉昇恒	調查武陽夏堤	一六〇〇〇	三八三二〇		三三三二〇		
	左叔平	赴監利密查案件	五〇〇〇〇	四八一〇〇	一八〇〇			
方任	楊聲溢	驗收宏恩堤	一〇〇〇〇〇	八二二四〇	一八一六〇			
彭復任	楊受慶 程屏藩	測估長江十一區	三〇〇〇〇〇	二三四七七〇	六五二三〇			
	潘晦根	督查鍾京潛各堤	三〇〇〇〇〇	一六二一〇〇	三八六〇			
	潘晦根	驗收蕭家洲蠻石	四〇〇〇	四二六〇〇		二六〇〇		
	張水如 宋國輝	測估長江十二區	三〇〇〇〇〇	二六八三四〇			三二六六〇	
陳任	朱重安	督查沔陽堤	一九〇〇〇〇	一九〇〇〇〇				該員二十年七月奉派督查沔陽隄工程嗣被匪慘害曾經前水利局撫恤有案所領旅費洋一九〇元無從造報本會第十六次會議第三案決議特予轉賬核銷並呈報總部備案
姜任	趙敢 孫衛伯	勘估堵龍堤	六〇〇〇〇	五九八四〇	〇二六〇			

	過錫祺	會同常年勘測險要河組建築永固水尺	八〇〇〇〇	五六五五〇			二三四五〇
	王兆虎	督視朱三弓蘇布拐工程	一〇〇〇〇〇	九一一〇〇	八九〇〇		
	黃秉政	測量武昌防水隄	三三六〇〇	三三六〇〇			
	萬煜斌	會勘同仁堤	二〇〇〇〇〇	一七三八〇	二四五〇		二六一七〇
	袁繩武	勘估樊口閘及滑坡事宜	三七五三〇	三一九〇〇	五六三〇		
	楊煒 盧立羣	督收武金及陽夏兩隄工程	一〇〇〇〇〇	一一九二八五		一九三八五	
	張岳鍾	調查荊門馬良山蠻石採運情形	一五〇〇〇	一三八八一〇	一一一八〇		
	張鵬心	勘估荊河南岸一帶險工	三〇〇〇〇〇	四三四六〇			二五六五四〇
	陳英	勘估荊河南岸一帶隄工	七〇〇〇〇	七〇〇〇〇			
	孫衛伯	勘估嘉魚西塍至金口隄工	三〇〇〇〇	三〇〇〇〇			
	張國旺 熊錦福	偵查水利局辛千輪下落及失陷員工消息	四〇〇〇〇	四〇〇〇〇			
	鄭梅軒	驗收漢川隄工程	八〇〇〇〇	一〇一九三〇		二三九三〇	
	游學博 羅錦潭	測量張公隄及金銀險工	四三〇〇〇	四〇四〇〇	二六〇〇		
	佘憲田	催辦長江上游各縣修防事宜	七〇五〇〇〇	三六〇〇〇〇			三四五〇〇〇
隄工局陳任	彭逸騫	調查嘉魚馬鞍山蠻石處丁主任病故不報案	四〇〇〇〇	三一五〇〇	七五〇〇		

合計	七一三七六二四	六四七四九〇〇	二〇四一六〇	二三四三五六	六八二八二〇

說明

一．表本列案五十三件計前暫支洋七一三七元六二四內（一）根據報銷核定者計三十七案准支洋三八一四元八九六計前領暫支洋四四七七元六二（二）提經本會第十六次會議議決因案情特殊特予核銷轉賬者計十六案准支洋二六六〇元〇〇四即前領暫支洋數

一．本表合計欄懸欠洋六八二元八二其中余蕙田名下懸欠洋三四五元係該員應發之薪餉因未能彙造專案計算報銷之故暫作懸欠列載既無追繳關係應即除外故合計欄懸欠應追還之欵實爲三三七元八二特此聲明

(B) 代轉前水利局核准尚未轉報歷年出差人員旅費報銷各案一覽表

長官任別	出差人員姓名	出差事由	預支洋數（單位元）	核定報銷洋數	繳還洋數	補發洋數	懸欠洋數	備考
王任	徐心武	查漢黃第二段隄工糾紛暨會勘羅城梅濟等隄	八四五〇〇	八四五〇〇				
	徐心武	調查長江上下游隄工	四六八〇〇	四六八〇〇				
	徐心武	查漢黃隄第二段工首控郭專員案暨圻水西陽河潰口情形	二四〇〇〇	二四〇〇〇				
彭任	劉盛德	測夫測量費	二〇〇〇〇〇	一八七三五〇	三二七五〇			
方任	陳秉乾	測估夏口全垸	六〇〇〇〇〇	六〇〇〇〇〇				

姜任	王兆虎 黃守楷	測估襄河七區	一〇〇〇〇〇	二六〇七〇二	三九二九八		
陳任	潘晦根 張泉鳴	驗收鍾祥襄陽隄工	四〇〇〇〇〇	四二一七八〇		一一七八〇	
	熊佐周 傅作楫	勘估襄河八區隄工	三〇〇〇〇〇	二五六四〇〇			四三六〇〇
	張書鈞	驗收嘉魚邱家灣蠻石	一〇〇〇〇〇	四〇八九〇		一〇八九〇	
	何浩 梁繼頌	驗收襄河三段隄工	四〇〇〇〇〇	二九二三三〇	一〇七六七〇		
建設廳 蕭任	許汝霖 李文瀾	驗收嘉潛咸武隄	一五五〇〇〇	一五五〇〇〇			
合計			二五三〇三〇〇	二三五九六五二	一五九七一八	三一六七〇	四三六〇〇

說明

本表列案計十一件係經前水利局核准者本會將各案報銷原件代爲呈報彙轉並分別轉賬以資清結惟熊佐周傅作楫二員尚欠繳結存洋四三元六角仍待繼續追繳張書鈞一員欠領旅費尾欵二〇元八九分仍待查案補發特此聲明

(C) 令催水利局建設廳歷年出差人員造辦報銷繳還公欵未結各案一覽表

長官任別	出差人員姓名	出差事由	預支旅費洋數	懸欠洋數	備考
水利局胡任	胡良恕	查勘襄河路隄工	一五〇〇〇〇	一五〇〇〇〇	
建設廳蕭任	葉國隄	送圖至車灣隄	一五〇〇〇	一五〇〇〇	
水利局彭任	蕭履和	赴監利流量站到差	一〇〇〇〇	一〇〇〇〇	

陳任	楊百康	調查襄陽老龍隄	一〇〇〇〇	一〇〇〇〇
	王璋 陳任	勘估長江二區	四〇〇〇〇	四〇〇〇〇
	劉長慶	調查嘉魚刘案	五〇〇〇	五〇〇〇
姜任	張國旺 熊錦福	交涉辛壬輪案	四〇〇〇	四〇〇〇
陳任	楊百康 張叔遠	勘估襄河二區	一〇〇〇〇	一〇〇〇〇
	張書鈞 王今白	勘估襄河四區	三五〇〇〇	三五〇〇〇
姜任	唐炎	勘估大成五豐垸	七〇〇〇	七〇〇〇
	姚德安	督查岳三弓防汛	一〇〇〇〇	一〇〇〇〇
陳任	任匡華 余西萬	勘估荆河八區	一六〇九〇	一六〇九〇
姜任	胡侶農	催辦長江下游各縣修防事宜	四〇五〇〇〇	四〇五〇〇〇
	馬鮮鳴	催辦襄河各縣修防事宜	七〇四八七〇	七〇四八七〇
合計			二七一〇九六〇	二七一〇九六〇

說明

本表列案計十四件共洋二七一〇元九六或係從未造報或係造報發還延不呈復或因欠款未繳尚未結案應分別繼續催報繳款特此聲明（已移交江漢工程局追究）

豫鄂皖三省剿匪總司令部指令　（秘財鄂字第九二二號）

令湖北水利隄工事務清理委員會主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

呈一件呈報清理前水利隄工兩局及建設廳歷年經支出差委員旅費懸案經過情形賫同表冊附件祈鑒核由

呈件均悉所請照准已轉送全國經濟委員會核辦矣仰即知照此令

（乙）清理前建設廳經支隄防人員旅費補請核銷呈文：呈爲補報前建設廳經管水利事務時支用驗收隄工委員旅費檢同清摺

仰祈

鑒准核銷指令祇遵事案查本會清理前水利局隄工局及建設廳歷年經支出差委員旅費懸案經過情形曾經造具表冊檢同附件

呈奉

鈞部秘財鄂字第九二二號指令轉送全國經濟委員會核辦在案現本會趕辦結束澈底檢卷發現前建設廳肅任十八年六月曾委派許汝霖李文瀾驗收嘉蒲咸武四縣隄工飭領旅費洋一百六十元該員等於呈報驗收工程圖表案內附有支洋一百五十五元繳還結餘五元清摺一件在卷及十八年九月水利局成立祇核辦該案之工程部分對於旅費報銷幷未核飭該清摺遂存留卷內未經轉報本會核對帳目收支各欵尚相符合惟均以暫記科目列載尚未正式收付本應飭令造報計算呈請核銷祇以事隔數年該員等踪跡不明無從飭令遵辦擬即照數分別轉帳援照前案請准免造計算權予核銷以了懸案是否有當理合檢同原摺備文呈賫

鈞部敬祈

鑒核指令祇遵實爲公便謹呈

豫鄂皖三省剿匪總司令部

附呈賫旅費清摺一件　附測夫收據一紙

湖北水利堤工事務清理委員會主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

豫鄂皖三省剿匪總司令指令　（秘財鄂字第一〇一九號）

令湖北水利堤工事務清理委員會主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

呈一件爲補報前建設廳經支驗收嘉蒲咸武隄工委員許汝霖李文楠旅費一百五十五元一案緣由檢同清摺仰祈鑒核由

呈暨清摺均悉姑准核銷以結懸案仰卽知照此令附件存

（三）清理水利工程測量隊流量站等經臨費案

查十八年三月水利工程處測量隊流量站相繼成立其經臨各費例由各隊站每月將各項單據賫局彙報至十九年三月各隊站改組單獨成立預算分別造報由局核轉惟自十八年三月至九月份各隊站賫送經臨費單據已由前水利局彙編計算函送財政廳有案其十八年十月至十九年二月份各隊站賫送經臨費單據經前水利局編造計算書表存檔未轉本會檢出復加詳核散總各數與案相符始將書表單據函送財政廳核轉并分別登記該項支欵方告結束

（四）川江龍公司倒塌堤款案

查前隄工經費保管委員會會計劉文藎與川江龍公司經理查閘渠勾結將所收隄欵私擅存放該公司及蓄成錢莊（該錢莊亦查閘渠所開）生息圖利至倒塌三十五萬二千零二元九角一分之多經湖北省政府查究在該公司該錢莊抄獲現欵及變賣存貨傢具作抵并據該公司錢莊欠戶繳到之欵共洋十六萬二千一百九十七元五角一分後據查閘渠繳還一千三百元其生財特業稅專業照售出實繳洋九千元欠戶李文豹等繳一四六六元二三又劉文藎原籍田產變賣匯寄價洋三二八〇元共洋一五〇四六元二

三合計共收洋十七萬七千二百四十三元七角四分尚倒欠洋十七萬四千七百五十九元一角七分該公司尚有漢口鳳翔里地皮一段柏家港房屋二棟約值洋一萬元有另湖北省政府曾先後將劉文藎收押并懸賞五千元將查問渠拿獲押究旋查問渠於二十一年三月呈奉湖北省政府准予保釋并繳四月二十三日期票二紙計洋一萬元其餘之欵限三個月內掃數繳清迨至免期前三日查問渠潛逃湖北省政府飭漢口公安局將具保人童源泰厚記公記三家商號查封並將其經理童鴻卿余厚安陳仲培及與查問渠有密切關係之熊蘭亭李潤生卜筱安等先後拿獲送武漢警備司令部管押着交而劉文藎於二十一年十月十二日經總司令部軍法處訊明槍決並懸賞緝拿查問渠至該公司所置柏家捲房屋二棟現已由隄工專欵保管委員會發租鳳翔里地皮尚屬空地一時不能獲利在押之陳仲培因病重屢請開釋本會以本案主要人犯既已槍斃脫逃原保久押終無法解決呈奉總司令部指令候提部訊明核辦等因在案

(五)毛鍾才侵蝕堤欵案

查前長岳關監督毛鍾才代辦鄂省隄捐因長沙兩次被匪失陷毛鍾才揑報隄欵損失經一再派員澈查不實迭催繳解迄未照辦二十年一月湘省府委艾樂堯赴關監收查出弊竇而毛鍾才已離湘其代拆代行之科長陳祿徽征收主任楊紱會計王大津相率捲欵潛逃當經湘鄂兩省政府電准財政部派湘岸榷運局長李鳳耀查辦湘省政府加派科員彭祖年視察員易彬鄂省政府派視察員張澤雄監收員劉德鈞會同查報乃該監督署重要職員相率逃匿關係文卷概行湮沒遂同赴海關清查正稅各帳並詢問海關稅例及代收碼頭捐辦法依據比例核實推算計侵蝕鄂省堤捐洋三十六萬二千七百八十六元五角三分九厘又揑報損失鄂省堤捐洋九萬八千七百八十五元七角一分六厘而數約十萬元上下之郵包捐尚不在內當由鄂省政府會同湘省政府呈請　行政院通飭一體緝拿歸案究辦并轉飭福建省政府查封毛鍾才陳祿徽楊紱王大津原籍財產備抵本會又呈奉總司令部准予通緝

(六)清理鍾祥船捐處欠領欠撥經費案

民國二十年十月襄河一帶遍地皆匪鍾祥最受蹂躪鍾祥船捐處職員被戕害者三人交通梗阻者十閱月船捐收入不敷經費開支因之前任主任王世綱共欠領經費九百三十五元六角三分繼任主任陳錦軒欠領經費四千二百九十元〇八角六分此外省立第七中學奉令在鍾祥船捐處撥領二十年秋季補助費三百元二十一年春季補助費一千元又鍾祥公安局奉令在該船捐處撥領二十一年一月至七月補助費六七〇元均無款撥付迨至二十一年八月前堤工經費管理委員會據該船捐處主任錢偉聲呈稱稅收清淡所有欠發各款共計洋七千餘元應如何辦理請示前來經提會議決以前既無收入欠款不撥當指令知照本會成立王世綱陳錦軒分呈請發該任欠領經費亦經提於本委員會議決既經前堤委會議決不撥勿庸再議并令知照乃該兩員一再呈請據陳錦軒聲稱任內應收鍾祥堤工處運料船捐四千餘元以之撥付不敷經費尚有餘裕等語查陳錦軒任內因鍾祥堤工處運料船隻不肯完納船捐雙方爭執經前水利局呈奉湖北省政府令准該堤工處照數增加船捐臨時預算嗣據該堤工處呈送船捐臨時預算列洋四八〇四元〇四業經本會照案核定此款即係該船捐處應收捐款前堤委會所謂該處既無收入欠款不撥之議決案似有變更之餘地提經本委員會第十五次會議議決准照鍾祥堤工處船捐預算數攤發鍾祥船捐處各項欠領經費及補助費等因本會遂就欠領欠撥總數照船捐預算數接成分配約合六六七五五折分令遵照已由鍾祥堤工處長萬勃生出具領款總收據作為船捐付交陳錦軒具領分別轉撥並飭陳錦軒補具撥領抵解報計各手續呈報堤工專款保管委員會核辦本會一面已函保管委員會知照各在案

(七)驗收二十一年堤防工程案

查二十一年份江襄兩岸堤防工程前水利局於二十年冬季派員分途勘估二十一年一二兩月分段派員設工程處開始修築於六七兩月逐段陸續告竣自七月一日起開始防汛是年水勢甚平於八月底防汛終了正擬派員分途驗收適湖北省政府會議議決將水利局劃分為水利堤工兩局職責權限方將劃清堤工局派定驗收人員正待出發又奉令將水利堤工兩局一併裁撤移其全部事務交江漢工程局繼續辦理迨江漢工程局接收之後以驗收二十一年份工程屬於清理範圍堅請本會派員協理旋經雙方會商結果『湖北二十一年份江襄兩路堤工由湖北省政府負責派員分別驗收本會調用江漢工程局職員參加查驗』至關於驗收費之

支給及驗收圖表之審核即歸本會完全負責比即分函湖北省政府工漢工程局查照辦理一面擬具驗收規則呈請備案並編具驗收費預算呈奉核准

本會照案實行費時約兩月有餘實支用驗收費五千八百六十七元三角六分核定二十一年份湖北江襄兩路堤工共支用洋一百五十七萬另一百三十九元七角七分四釐茲列表於後並附驗收規則以明梗概

二十一年承辦各堤工機關負責人及驗委姓名並工欵數目一覽表

名稱	負責人姓名	驗收委員姓名	查驗委員姓名	原估數	實施數	驗收數	備考
鍾祥堤工程處	處長萬勃生 工程主任劉文美	周惠孚	錢儒策	一九二九七九〇三〇	一四〇五三三三八七	一三七一五六〇一九	
京山堤工程處	處長梁繼曾 工程主任吳樹烈	鄒子珍	翟鶴峯	二〇〇一九四一七九〇	一五二一〇八八七〇	一五〇二六六三六〇	
荆潛堤工程處	處長楊煥 工程主任甑士傑	李萬青	朱文藻	二一五三三七二七八〇	一六三五八二五〇	一三六三七二一〇	
天門堤工程處	處長左南屏 工程主任孟昭志	李萬青	朱文藻	七〇〇八六四四〇	四九四四六〇七〇	四八五九三〇〇〇	
天沔堤工程處	處長雷震球 工程主任熊濤	吳方樓	石成軒	九〇四〇一九二三	八一三六二一八五	八一〇七三〇九五	
沔川堤工程處	處長伍正林 工程主任夏安倫	吳方樓	石成軒	七七三〇八六一九	六七六〇八六六七	六〇四八七八一〇	
漢川堤工程處	處長顏守仁 工程主任葉宅聲	鄭梅軒	馬延益	六七二五七二〇〇	五九七〇七三九〇	五九七七九〇〇	此堤係前水利局派員隨同省委驗收非本會查驗者

公安堤工程處	處長呂學謙 工程易燊 主任張鵬心	周少川 曾哲	一三五二〇五六〇〇	一〇七一九四一五〇〇	一〇七〇八四九八五	
公石堤工程處	處長廖名鑫 工程胡心如 主任	周少川 曾哲	六五七九九三三六	五九八一九一五六〇	五九三三〇〇〇〇	
三帝廟堤工程處	處長常春元	汪宗藩 陳英	一七六四〇七一七〇	一八三七一七〇〇〇	一〇三四三三七一三	
車灣堤工程處	處長郭世英	汪宗藩 陳英	一五九四八〇〇〇〇	一五九〇三〇〇〇〇	一五一〇四一六九八	
沔陽堤工程處	處長李鴻斌	梁韻湘 廖德金	八九五六八四五〇	五七一七四六〇〇	五六九九〇〇一〇	
武嘉堤工程處	處長揭祜	梁韻湘 廖德金	四五八三三五三〇	四二八一四一八〇	二八六三二三三〇	
武昌堤工程處	處長何浩 工程譚光祖 主任	張安蔭 王宗琳	一四四八五八四九〇	一〇九六八七三五五	一〇七三五七二一五	
張公堤工程處	處長劉亮丞 工程劉以均 主任	張安蔭 王宗琳	七九〇八一九〇	五九六六五四一〇	五九四九九一七〇	
黃圻冶堤工程處	處長向道 工程危文翰 主任	湯祖德 范鴻兢	六二一三三一七〇	六〇七一六九一	五七三七八一九二	該驗委驗收不實本會委李道宗復驗核定
黃梅堤工程處	處長楊受慶	湯祖德 范鴻兢	五七五七八四〇〇	五五九二一七三〇	五四七九七四五〇	

方家灣堤事務所	監修員孫宇倜	鄒子珍	崔鶴峯	二五三四六八〇	二四二六六八〇	一一八〇〇六〇
白沙灘堤事務所	監修員胡鍾瑩	李萬青	朱文藻	六三九八五三〇	五三五三七六八	五三五三七六八
鄧李灣堤事務所	監修員黃　明	吳方樓	石成岍	五〇八一九五〇	四〇五三五〇〇	四〇五三五〇〇
朱三弓合壠事務所	監修員江暑生王兆虎	汪宗藩	陳　英	八二八七四七九〇	六五一四六二〇	六四九八〇二五
鍾家台堤事務所	監修員過錫祺	張安蔭	王宗琳	六三九四〇〇〇	六二〇六七七〇	六一三二二〇
三合洑溜垸堤事務所	委員蔡傳書	張安蔭	王宗琳	一八九〇〇〇〇	一五八七五〇〇	一三七八六〇〇
荆江堤工局	局長徐國瑞	陶　炯	李道宗	一〇〇七六六二〇	八六九〇二五六四	九四〇九四四八一
小江湖鄧家湖堤事務所	監修員柯紹文	周惠宇	錢儒策	五六六八五〇〇〇	五六九三〇九九〇	四七七〇〇〇〇六
武豐堤事務所	堤紳魯方才	張安蔭	王宗琳	無	無	三五三三六七

協助第七區七段附屬工程

係八區工賬局二段長楊源經辦歸第八區駐工委員蔡傳書造報

內有金城垸驗收數一四七四三元八六一但前水利局令准補助五千五百元爲限

前水利局呈准湖北省政府發給補助費四萬元其餘由地方畝費補足

該紳呈由省政府令飭水利局發給補助費二萬元餘欵未繳

說明

查二十一年各處堤工程計二十六處由前水利堤工兩局派員估修湖北省政府派員驗收本會調派人員參加查驗共驗收核定洋一百五十七萬另一百三十九元七角七分四厘內補助費六萬五千五百元

豫鄂皖三省剿匪總司令部湖北水利堤工事務清理委員驗收二十一年堤防工程暫行規則

第一條　湖北二十一年江襄兩路堤工由湖北省政府負責派員分別驗收本會調用江漢工程局職員參加查驗

第二條　驗收委員應帶之原估實施對照表施工說明書及市尺測量儀器四方鐵錐等件由各委員開單逕向江漢工程局取用（單面須蓋本會官章證明）

第三條　委員驗收時須根據該工程處原估實施對照表以資比較切實驗收但驗收之數不得超過實施數少則照扣隨帶測夫弓手公役各一名以司丈量不得假手工程處員役

第四條　驗收土工時須將該堤長寬高度及收分用市尺逐廣丈量如有差欠尺寸及面凹腰空等情事須分別記載呈會核辦

第五條　測量堤身高度時須按預定基點逐廣測驗其有未定基點及基點遺失之處須察看二十年洪水位痕跡以資比較或詳詢當地紳民

第六條　堤身長度及腰脚寬度不得減少但高度因天然積壓力面寬因風雨剝蝕或略有差欠惟高度不得較實施表欠至四十分之一面寬不得欠至五十分之一如有差欠超過規定者須詳細記載呈會核辦

第七條　各堤禁脚須擇要丈量如較原定寬度欠至三尺以上者分別記載呈會核辦

第八條　驗收加修堤工時須根據原斷面圖說測量其無斷面圖說者得挖開老堤面堤脚查驗並得驗收下方以資比較

第九條　原估表載有土門窩遠加路工者應丈量該土場遠近考查所加之路費有無浮濫

第十條　翻沙翻淤塡海底挖溝及翻築獾洞蟻穴等工程其寬長深度無從挖驗者得取承包人包約或憑摺查驗其包約或憑摺須經工程主任會計專員及督查員蓋章方爲有效

第十一條　堤內外脚有打樁者須將樁數及樁頭之圍徑查明登記

第十二條　查驗碱工時須挖驗堤邊及斜坡是否包邊分打其築土厚層是否在一尺以內並以鐵錐釘入堤身灌水試驗其試驗之法如左

一・鐵錐長二尺橫斷面一寸見方

二・鐵錐須端直打入端直提起不得圓轉搖動

三・黃泥土應飽錐水涸須遲至四分鐘

四・夾沙土不能飽錐水涸須遲至二分鐘

五・雨後水涸須遲至六分鐘

六・久晴水涸須遲至二分鐘

七・驗收表須註明各該堤土質與查驗時天氣陰晴以憑查核

第十三條　查驗碱工時須調取碱夫所特憑摺核對其憑摺須經工程主任會計專員及督查員蓋章方得有效

第十四條　驗收石工時坦坡工程先須丈量坡面長度斜高及收分是否與原估或實施尺度相符次擇要挖驗數處得其平均厚度以便比較如坦內有白塘者（即白灰底）應詳查其有無如有灰漿者即將挖驗之灰塊携回呈會考查其團結力是否與規定配合之成分相符其灰漿之厚薄是否遵照原估或實施所規定即將挖開之坦坡考查其有無空隙及空隙之程度與所用之洋灰數以爲比較如砌坦厚度與原估或實施不符應照實砌之平均厚度折算計方但與原估或實施厚度相差太遠塌陷堪虞者應詳實記載呈會核辦至挖驗地點須隨時責令原承包人補築如式

第十五條　驗收護脚蠻石須考查以前督查員驗收之數量是否相符拋護及於脚底如數量不符拋護未及脚底者得分別記載呈會核辦

第十六條　驗收護脚樁木照第十一條之規定辦理

第十七條　削坦土方無從查驗須調閱工程處實施橫斷面圖及承包人包約或憑摺所載數量切實核對並考查其附近地形以資比較

第十八條　坦坡脚槽不能查驗以及護脚樁石或被水淹沒不能驗者得取該工程處帳據及承包人原摺考查之一切工料單據賬摺均須工程主任會計專員及督查員蓋章方得有效

第十九條　坦坡有用紅石或青磚者驗收時須量石與磚之長寬厚是否與實施規定尺碼相符每方實用石或磚若干塊須在驗收附註欄內註明如尺碼與規定不符者應按方驗收不得以塊計算並須考查不符情事詳實記載呈核

第二十條　石磯工程須將磯身之高度及圓長按照原估或實施表逐一丈量不得稍有差欠幷須查驗石磯內襯三合土及灰漿支配成分是否遵照原估或實施所規定其底槽樁石不能查驗以及護脚樁石倘被水淹不能驗者照第十八條之規定辦理

第二十一條　坦坡石磯附帶雜工雜件須事先呈准有案者方得查驗呈准有案而不能查驗者照第十八條之規定辦理

第二十二條　各堤工程驗收畢須調取各承包人原摺核對各該工程處帳據登記各價目及各項總數是否符合帳據原摺均須經工程主任會計專員及督查員蓋章並須考查各該工程處旬報表及督查員驗收表

第二十三條　各堤工程驗收後應由各該處處長責令土工石工承包人分別出具保固三年切結轉交委員賣會備查

第二十四條　各堤工程未驗收以前由委員出具切結（結內應載明如有驗收不實或扶同舞弊情事願受嚴重處分等語）方出發驗收後各委員須分別繕繪圖表按規定期限呈報本會並取具該工程處長工程主任保固三年切結賣核

第二十五條　驗收時關於剩餘材料或上屆材料須詳加點驗分別原購若干前存若干已用若干尚存若干在驗收表附註欄註明剩餘材料存放何處交某工務所保管須另附清冊並取具該工務所收據賣會備查

第二十六條　驗收各堤工程時隨同驗收各該處本年防汛工程暨由工賑局代辦工程或公家補助費所修工程其由公家補助費

購辦材料剩餘未用者亦應同時點驗剩餘材料存放何處交某工務所保管須取具某公務所收據繕造清冊一併賫核

第二十七條　本規則於此次驗收堤工適用之

第二十八條　本規則呈准　總司令部備案施行

(八)清理歷年各經徵機關侵虧堤捐案

呈　總司令部文；呈爲清理歷年各經徵機關侵虧堤捐迭催未繳茲分別公虧私虧酌擬辦法繕具清冊仰祈

鑒核事案查湖北堤工經費向無的款十六年春該省地方各法團鑒於水患頻仍堤防重要始聯名呈經

中央黨政各機關聯席會議議決在湘鄂贛三省海關稅及湖北境內特稅田賦厘金項下附征堤捐以爲修築湖北堤防之用幷組設

保管委員會負責保管專款存儲不准挪用意至善也祇以當時此項捐款均由各征收機關代征保委會又無監督稽核之權積久玩

生而侵蝕虧挪之案遂層見迭出除長岳關監督毛鍾才該關堤捐徵收主任楊紘侵虧堤捐逃匿無縱案情重大業經

財政部通令嚴緝有案外其次則宜昌口二五內地稅局局長陳信吳傑及湖北全省禁烟處處長宋英仲等案虧數較多餘爲田賦厘

金項下各縣縣長財政局長各征收局長虧欠或挪移捐款者多或逾萬少僅數十通盤合計數逾百萬元以外嗣保委會改組管理委

員會職權擴大對於從前虧欠各款雖經分案究追然以歷年既久人事變遷或蹤跡不明或糾紛莫決或通緝未獲或筋繳未清解決

之案寥寥無幾本會成立逐款清厘又經分令嚴催並將各該員職名虧數迭次登報通告限期飭令投會清結仍多擱置不理本會茲

以結束在即勢難再事延擱提經本委員會第十四次會議議決分別公虧私虧擬具辦法呈請　總部核示等因當即依據議決案詳

查卷宗將曾據聲明挪墊地方經費或誤解財政廳或被駐軍强迫提取等案屬於公虧範圍者分別海關稅特稅田賦厘金四項造具

各案案由職名虧數清冊一份擬即移交湖北堤工專款保管委員會繼續催繳以重堤款至關於私虧侵蝕各案亦分別四項將案由

職名虧數造具清冊幷酌量案情輕重擬定處分辦法於冊內分案詳陳請示辦理以資結束理合檢同公虧私虧清冊各一份一併具

文呈賫

鈞部敬祈　鑒核令遵如蒙

俯准並請按照私虧清冊所擬各案處分辦法分令飭遵實爲公便謹呈

豫鄂皖三省剿匪總司令蔣

計呈賫各征收機關歷年公虧私虧堤捐各案清冊各一份

湖北水利堤工事務清理委員會主任委員李書城
副主任委員朱玖瑩

（附註）公虧私虧堤捐表詳堤欵篇特註

豫鄂皖三省剿匪總司令部指令　（秘財鄂字第一二九一號）

令湖北水利堤工事務清理委員會

呈一件呈報歷年各經徵機關侵虧堤捐迭催未繳茲分別公虧私虧酌擬辦法繕具清冊二份祈核示由

呈暨清冊均悉茲將所陳附加堤捐公虧私虧各條分別核辦如左

甲・准予核銷者長岳關監督江瑞鍠漢口征收局長陳逸風湖北茶稅局長余萬青漢陽縣長黃敬之漢川縣長閻國鈞又黃福藻漢川縣財政局長饒於春又王次貧枝江縣長鄧卓羣又陳馮經鄂城財政局長陳宏濟圻水縣長吳錦芬宜都縣長王克立宜昌縣長江楚清沔陽縣長王仁謙等十五案均准核銷

乙，准予通緝者長岳關監督毛鍾才等二十八案通緝令清冊抄發

丙・訓令湖北財政廳暨湖北堤工專款保管委員會會同辦理者蒲圻縣財政局長楊振等九十案訓令清冊抄發

丁・訓令湖北堤工專款保管委員會繼續辦理者長岳口內地稅局長劉廷震等一百三十六案訓令清單抄發

戊・訓令清理湖北特稅處轉催查報者湖北全省禁煙處處長宋英仲一案訓令抄發

至於原費公廳冊後頁說明欄所列三項辦法擬請移交堤工專欵保管委員會查核辦理之案尚無不合業予另令照發惟此次公廳應有提用或借用機關之公文證明應由該清理委員會查明聲復並逕函管保委員會知照合函抄發訓令原文四件清冊清單共四份令仰該委員即便知照此令

計抄發訓令軍政各機關原文一件（附清冊一份）

訓令湖北財政廳

湖北堤工專欵保管委員會原文一件（附清冊二份）

訓令湖北堤工專欵保管委員會原文一件（附清單一份）

訓令清理湖北特稅處原文一件

一 准予通緝之二十八案姓名清單

毛鍾才　陳信　吳傑　李佩劍　吳連慶　吳厚載　吳承鼎　任子魁　羅厚所　張道南　鍾漢傑　葛亦雲　楊廷美

楊紱　何有藻　盧嚴方　程鼎豐　陳瑋瑛　陳君謙　楊振　鄭國棟　劉昌鳴　彭步雲　李廷芬　劉昌禧　穆良煦

唐建侯

龐眉　皮煥新

二 訓令湖北財政廳暨湖北堤工專欵保管委員會會同辦理之九十案姓名清單

楊振　李建唐　舒祖鎰　白蔚文　黃謹臣　曹繼新　李蔭西　袁辯肇　石解生　周至行　鍾愷　吳錦芳　高鴻縉

吳廷兆　林樵中　胡寶琛　何翔　余新尚　鄧良　秦祖培　何有藻　陳賡堯　高維崑　張箴三　李義勛　黃國翼

曹光典　黃家玉　盧邦燮　高季浦　朱維漢　謝樹彬　方毅　毛起鳳　胡仁　盧澤東　方毓清　蔡鳴九　周良鐸

單文儀　袁國紳　高永壽　柳維垣　顧我廬　洪壽昌　張春山　李景韓　田化龍　劉敦銘　陶季賢　蕭靜安　李晉芳

馬邦墀　呂璉　殷作楫　楊沛澈　夏隆基　江楚清　沈燕貽　周維新　彭梅巖　劉棣蕚　張敬西　冷生煜　黃永熙

張琴六　熊時鐘　羅詠裳　尹鳴珂　聞聰　帥根焜　余炳猷　皮宗榮　周襄　余毅　喻建九　張繼繼　米維亞　饒○○

黃紹豫　王壽琪　王治薰　賀笠青　婁　謙　王鏡塵　徐國和　徐炳龍　夏文藩　彭　毅　王　畏

（附註）內有一案原冊姓名未詳故僅八十九名

三

訓令湖北堤工專款保管委員會繼續辦理之一百三十六案姓名清單

劉廷震　易堂齡　袁思彥　冷　鈺　李佩劍　程乃達　梅煥敏　邱躬介　楊蘭坡　岑　樓　朱明善　劉棣蕚　劉永杰
董仲修　楊佩瑋　陳永言　周　彪　劉錫茲　徐翰芬　傅　梅　吳建中　李秉鈞　程毓崗　呂　璉　蔡耀民　陳彭瑛
范鴻勛　劉文泗　謝聖謨　石家璧　邱仲川　余聯輝　黃煜林　涂允欽　劉振昌　周　襄　劉翰華　劉伯陽　包耀鼎
劉蔡勤　饒於春　張春山　黃殿華　羅文盛　韓明正　黃紹豫　吳詠裳　江永開　張殼生　金錦柏　高開誠　蔣作均
劉儆民　陳　治　陳英武　李永忠　黃敬之　張澤雄　張鴻勛　汪銘勛　盧　僖　萬燮陽　涂時俊　胡鶴雲　李雲凌
劉振楚　馮　崑　張柱瀾　周一鶴　江采萍　陳鈺山　劉昌明　陳宏濟　梅　馥　蔡文傳　姜毓彬　賀笠青　周蕃蔚
張　鵬　馮昌言　閔應官　涂時俊　秦祖培　夏鎮堃　王鳴梟　李義鈞　劉昌禧　朱　江　劉書封　彭　毅　林志華
徐國和　何有藻　林一權　王壬化　余念萱　冷調陽　曾子粹　王丹候　傅端平　董相勛　尹鳴珂　朱　倜　皮煥新　熊爲琦
何　照　羅韻濤　方毓清　鄧溶之　樊自型　張明之　吳源翰　張包炤　王次賓　季雲凌　石　銘　閔健鐸　蔣醒禪
顧在宥　黃傳華　鄧鼎成　穆良煦　田夢椿　石　巖　王鳴周

（附註）查冷鈺一名原冊列有三案又劉振昌劉翰華饒於春張春山汪銘勛陳宏濟劉書封何有藻穆良煦等九名原冊各列有二案又江漢口內地稅局欠繳之海關附捐因帶欠在商無主名可列故右列僅一百二十四名

附錄

改良堤工意見書

鄂省本古荊州地江漢縱橫於全境湖港棋布於東南澤國之稱由來尚矣邇以洞庭壅塞江流淤墊宣洩乖宜於是不能不謀禦水之法而堤防遂爲全省要政焉自十五年秋武漢政府成立俯順輿情籌定的欵作修堤經費設專局以董其事並實施水利測量計畫以立疏濬始基而開辦六年糜欵一千數百萬元江漢幹堤既依然崩潰相尋未臻穩固測量計畫亦未能依限完成且積弊叢生幾視此爲貪汚之藪此宜乎　總司令蔣公赫然震怒必將其事業移歸全國經濟委員會所屬之江漢工程局辦理也該局自接辦以來剛逾半載事業制度上之改善已有可觀然依清理經驗之所得認爲應改絃更張或設法補救者尚有數事粗陳梗概用備採擇

(一)堤欵宜速籌抵補：鄂省堤欵自二十年釐金撤裁後僅餘特稅海關稅田賦三項附捐約計每年收入不足二百萬元僅敷全年水利事業事務等項經常費用三項收入就最近兩年平均計算以特稅附捐爲最多約占全額之半現

總司令方厲行禁烟倘特稅一旦無着則堤欵必頓感拮据此宜未雨綢繆預籌抵補庶免臨渴掘井貽誤工需查二十年八月前堤委會以厘金裁撤捐數銳減擬請在鄂省統稅內附征一成堤捐並將原有之海關稅附捐改照新稅則依金本位計算征收藉資彌補以格於部議未准施行仍當

擇其可行者預爲之計

(二)堤工宜秋冬舉辦：查歷年各堤工程處均係臨時設置大率二月開辦六月結束計時約僅四月加以事先籌備之稽遲中間意外之阻滯實行工作至多不過三月且每當春末夏初工程吃緊之時農作正忙集工匪易黃梅時節陰雨尤多種種躭延均所難免是以工程稍鉅便難依限完成如果免强竣工勢必敷衍塞責況工程結束之時正夏汛將臨之候新附之土堵築未堅一旦遭奔流之激掃風雨之摧殘縱令幸保無虞亦必不堪嚙蝕是皆開工過遲之所致無可諱言其最者或樁未下而江流盛漲致磯坦累年不成或坦甫削而春汛已臨致坡岸崩陷無已勞民傷財爲害尤大凡茲種種均屬事實成案俱在殷鑒匪遙再冬令沍寒地土凝固春陽發動質即疎鬆俗所謂冬土如鐵夏土如棉也今以如棉之土修堤而欲求堅實是何異南轅北轍背道而馳哉此物理之當然不容忽視者也故就天時地利人事三方攷察修堤之期實以秋冬爲最宜亟應明白規定嗣後每年新工必須秋季開辦春初完工非有特殊情形不得率請展期庶幾夙弊悉除堤防永固在曩時勘查承辦人員均係臨時遴委遲誤或不無可原現時各工務所既係常設機關則一切勘估設計購料招工等事務均不難於平時從容籌辦提前開工諒無窒碍此係根本要圖未可稍涉遷就

(三)樁木脚槽工程宜特加愼重：樁木脚槽本爲建築磯頭坦坡之基礎關係全部工程至爲重大然以其深入河底故取巧最易考察極難歷來不肖員司與包工勾結偷工減料多在於此詳查成案

向來磯坦之崩陷每發生於樁脚之傾斜蓋可思矣嗣後對於此類工程勘估設計時固應計劃周密力求堅實施工時尤宜隨時督察嚴杜取巧當各處開工之始應即遴派得力幹員二三人分別輪往各處切實勘驗如有未合立予糾正蓋與其事後驗收於事罔濟毋甯事前監督較爲切實基礎既固庶全部工程不易發生變故矣

(四)工程實施狀況宜就地公布：修堤工程夙稱弊藪事前監督已不易杜絕弊端事後驗收豈易得其眞相如係新修堤垸及建磯砌坦等工程尙爲形迹可查新舊可辨勘驗如果認眞或不難知其梗概他若修補之堤則新舊混淆高低莫辨護脚之石則拋沉河底多寡難明無論如何查驗終屬影響模糊僅憑帳據稽察何難勾通朦飾此不能不特加注意者也查作僞之方不一而足或浮報工料或偸減工程或劃去舊土以冒充新工或移用舊石以冒充新石種種情形筆難罄述嗣宜責令各工務所凡新工開始應將工程種類材料數量樁石尺寸以及土石方價若干土磯工價幾何並其他一切有關工欵事件逐一詳列於高脚木牌上擇新工各衝要處分段樹立廣爲公布俾衆周知行之數年縱未能弊絕風淸作僞之案或可減少蓋當地居民利害切膚關懷自甚耳目既近聞見較眞施工稍涉虛浮攻計便將立起至查驗人員更祇須就牌列情形與工程証據互相參証虛實當不難立判矣法簡用宏無逾於此

(五)土場宜預先指定：修堤取土事本細微然使措置乖方爲害滋大查歷來對於此等事務每視爲

無足重輕局章既未規定辦法包工合約亦從未計及類皆臨時任憑土工自由選擇而工人希圖便利大率於堤身內外逼近堤脚處就近掘取至土質是否適用堤身有無妨碍皆非所計歷時既久漸成深渠一屆夏汛時期外則洪流剝蝕內則積潦浸蝕內外夾攻損傷實甚動搖根本危險堪虞倘或加以禁阻另闢土場則藉口路遠費時要求加價允則損失公帑惡例難開否則要挾多端妨害公務各處皆然幾成慣例亟宜設法防止以固堤基嗣後各堤應於勘估設計時責令承辦人員於距堤較遠土質地點適宜之處指定土場若干招標時明白規定包約內亦併詳載嚴定違約處罰之條以資遵守而杜糾紛此等事件發端也微禍益乃大未可忽視

(六)沿堤宜增設堤警：歷來堤防磯坦之崩潰雖似變起倉促驟不及防然探本窮源實多由於平時防範之疎忽從前定制各堤工程處僅負新修工程之責並無考察全堤之權防汛處就全堤分段設立設備較周然又祇專防夏汛一屆安瀾便即裁撤故平時全堤修防事務向無負責辦理之人如果發生危機事先便無從覺察一旦大汛屆臨衝激掃射遂致潰決相尋不可收拾星星之火可以燎原涓涓不塞將成江河可不懼哉現各工務所雖屬常設機關然工役無多歲費有限責以平時修防之任實非力所能勝亟宜於江漢兩岸幹堤分段設立堤警或堤丁等類名目隸於各工務所專負修防查報之責就沿堤附近居民遴選勤樸年壯有室家有職業者充任每距二三里設置一名月給薪餉一二元每十人設一巡長督率之平時應於所轄堤內往來巡邏查有損壞立予修

補工鉅則報所核辦夏汛時帮同防護平時之修防既嚴遇險自無懈可擊歲費雖增保全甚大與其焦頭爛額毋寧曲突徙薪惜小費而誤鉅工圖近利而忘遠害有識者不爲也

以上六條皆就歷年發現之弊端酌籌改革之辦法並擇其切實易行力能興辦且關係較大者畧舉數事藉備採納雖非根本大計要不失爲補偏救弊之謀果能一一實行當不難漸著成效要之爲政固貴乎立法而行法尤重在得人蓋立法雖善苟行之不得其人則效未睹而弊已潛滋不肖者甚或緣法以爲奸故法與人須相輔而行未可偏廢詳察歷來堤工致弊之由緣於立法未善者固多緣於用人失當者尤夥補救之術是在知人善任而已夫得人則治失人則亂本爲政之通例而於堤政爲尤要深望主堤政者於此三致意焉

湖北水利堤工事務清理委員會第一次會議議事紀錄

時　間　二十一年十二月二十三日

地　點　漢口德托美領事街第四十四號本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　席德炳　王金職　吳國楨

列席人　胡品元　王濟舟

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席報告本會定於本日正式成立假法租界德託美領事街四十四號爲會址已呈請備案並分函各處知照

二　本會關防已奉　總部頒發到會已呈報自成立日起啟用

（乙）討論事項

湖北本屆未驗收之堤防新工程全國經濟委員會復電謂爲屬於清理部分應如何辦理請公決案

（議決）函請湖北省政府派員驗收由本會派員參加至分段查驗本會應須人員及經費函請江漢工程局代爲計劃查驗人員並由江漢工程局調用

一　本會組織成立設備事項在在需款擬編製開辦費預算列支三百元呈請核准由堤欵項下支給可否請公決案

（議決）呈請　總司令部核准

二　本會月支預算原定爲二千九百九十五元因增列房租七十元致超過三千元限度(三〇六五)可否照數規定呈請核准之處

請公決案

(議決)照辦

三　水利堤工兩局各附屬機關之主管人員如有未了手續自行到會呈請清理者擬呈請核准從寬辦理擬將與積案有關各人員姓名登報通告可否照辦請公決案

(議決)　通過

四　清理積案關於未經核准之款自應專案呈奉核准再予抵解其經湖北省政府核准數目如有呈辦抵解手續者可否即予照准

請公決案

(議決)(一)已核銷者不再清理已核准其手續未完者催其補完手續

(二)未經核准者提會核議辦理

五　本會清理步驟應如何規定請公決案

(議決)飭王秘書擬具辦法提下次會議討論

六　本委員會開會日期如何規定請公決案

(議決)每星期三日下午二時

湖北水利堤工事務清理委員會第二次會議議事紀錄

時　間　元月四日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　吳國楨　席德柄

請假委員　王金職

列席人　沈肇年

主　席　李書城

紀　錄　王濟丹

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告執行第一次會議議決案經過情形

二　奉總部訓令本會主任委員張難先准予辭職改代理主任委員李書城爲主任委員

三　本會月支經臨用費已奉准由堤款項下開支追繳之款隨時送保管會應發各款仍照法定程序辦理

四　江漢工程局函請本會派員會同驗收漢川監利荊門三處石方本會已派賀子良王德栽成勛前往辦理

五　本會額設員缺已陸續委定王濟舟等三十人

六　本會清理案件分股辦理爲免辦法歧異或抵觸起見每日於散值時由秘書邀集全體職員舉行會報一次業於上年十二月二十九日實行

（乙）討論事項

一　據王秘書簽呈擬具清理步驟可否照辦請公決案

（議決）通過

二　茲擬定本會員役出差旅費規則可否照辦請公決案

(議決)修正通過

三　前各處所送預計算書經本會審核相符者應送何處請公決案

(議決)隨時函送原審計機關備查

四　前車灣堤工處長楊聲溢任內支用棚脚遣散兩費八百餘元一再呈請核銷均以案未呈准飭令追繳在卷茲復據以急迫不及請示災黎無力賠償等情呈請核銷前來並據前督查員張鳳樓等呈同前由可否照准請公決案

(議決)既經前水利局委員驗明屬實姑准核銷彙案呈總部備案

五　前湖北堤工經費管理委員會移交未辦結文件應否由本會清理抑由堤欵保管委員會主辦請公決案

(議決)手續未了者由保管委員會補辦隨時通知本會查照有糾紛者送本會辦理

六　查接管湖北堤委會卷內逐年各處挪借堤捐計有湖北財政廳借款十四宗共洋二百一十三萬七千四百五十四元五角九分九厘編遣庫券七十五萬元湖北賑務會借洋一十八萬三千元湖北總工會湖北公鑛局各借洋六千元武昌電燈局借洋一萬五千元雷大同借洋二百元漢口市立醫院借國庫券一千五百元應如何分別清理請公決案

(議決)函請湖北堤工專欵保管委員會催收

七　據鍾祥船捐征收主任錢偉聲請領結束費一百七十餘元一案查與前漢荆兩關成案相符惟支數較多應如何分別准駁以及由何款內支給應否呈報

總部核示請公決案

(議決)姑准支給函保管委員會查照

八　各縣請領本年十一月底以前雨量觀測員薪俸應否補發請公決案

(議決)查案清理後再辦

九　准江漢工程局函復擬定驗收計劃一案關於此項經費預算應如何規定請公決案

（議決）照工程局計劃辦理

十　前水利局對於各處工程驗收後須呈奉省府核准再行轉飭遵編計算查接收文內有已驗收尚未呈報之件本會審查後應向何處請示請公決案

（議決）（一）函湖北省政府檢送該項預算

（二）每案清理後函湖北省政府查照

湖北水利堤工事務清理委員會第三次會議議事紀錄

時　間　元月十八日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　吳國楨　席德柄　王金職　程文勳

列席人　劉萬選　黃策六　傅知先　王濟舟

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告執行第二次會議議決案經過情形

二　主席指定會計師報告本會收受各處繳款情形

三　本會經臨各費尚未領到撫款開支已呈准總部借洋三千元交會應用

(乙)討論事項

一　前三帝廟堤工處長常春元呈送拋石圖表總數核與饒督查員士彬報數多列四百餘方經傳該兩員到會詢明可否即予解決抑俟驗收員查復再奪請公決案

(議決)既單據相符准予列報

二　前天潛堤工處長王寶琛請發押扣一成工款一案前堤工局以該處甎坦崩塌未准并派員查明崩塌原因呈復在卷可否准予解除責任抑派員復查請公決案

(議決)保留

三　前鍾祥船捐處主任王世綱請發欠費九百餘元陳錦軒請發欠費四千二百餘元兩案前堤委會先令後任補發嗣後議決不發應如何辦理請公決案

(議決)既經前堤委會議決不發勿庸再議

四　前宏恩堤專員寄勸浮報公欵據驗收委員呈復應存洋四萬餘元又報銅元被刦委查不實又據點驗材料委員呈報該員有舞弊情形經組織委員會審訊因該員身故省令撤銷如何辦理請公決案

(議決)另簽詳細意見呈核

五　前茅山北永堤監修委員干寶歧侵蝕工欵訊明槍決贓欵七千餘元經省令折春縣勒令該員家屬清繳迄未遵辦如何辦理請公決案

(議決)令折春縣查明該員遺產再辦

六　前潛江堤專員王兆虎承修賴趙深李四段坦坡因水漲停工全部崩潰又以匪擾材料損失甚多經局委查驗呈復核數相符在

卷驗收圖表應否核准請公決案

（議決）加簽意見再核

七　三帝廟堤工程處長桂負蒼經修工程及鉛絲籠案如何解決請公決案

（議決）就卷內疑點令桂負蒼詳細聲復再核

八　本會會議時間擬改爲星期三上午九時請公決案

（議決）通過

九　本會會議請江漢工程局長列席請公決案

（議決）通過

湖北水利堤工事務清理委員會第四次會議議事紀錄

時　間　二月一日

地　點　本會

出席委員　李書城　吳國楨　席德柄　王金職

請假委員　朱玖瑩　程文勳

列　席　人　楊思廉　王濟舟　傅知先　劉萬選

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定祕書報告第三次會議議決案執行經過情形

二　報告本會工作情形

三　本會副主任委員朱玖瑩自二十四日起請假一星期回鄉省親已奉令核准

四　長江第四防汛段主任劉盛鑫浮報石方証據確鑿已呈總部追究

（乙）討論事項

一　孫家拐堤監修委員蔡懷義呈訴水利局處罰失當懇撤銷原案等情應如何解決請公決案

（議決）除已停委兩年外姑准免予追賠

二　潛江堤工專員王兆虎承修賴李深趙坦坡工程隨修隨潰經水利局派員查驗已做工料及材料損失計洋七萬一千餘元應否核准飭造計算請公決案

（議決）併該員經手各項工程整個清理再行核議

三　德記採石公司欠領石欵約七千元荆門馬良山採石主任劉澤沛所有湖北省銀行存欵止兌之一千七百餘元應否准其付給請公決案

（議決）照准

四　長江第七段防汛主任李壯懷欠繳防汛餘欵及經費結存共洋九百餘元迭追未繳如何辦理請公決案

（議決）函建設廳查明該員欠薪是否屬實

五　前車灣堤工專員楊烺呈請發給欠領洋八千餘元一案經盤通統算僅欠領二千三百九十餘元可否照發請公決案

（議決）准先發給二千三百九十五元三角九分一釐

六　宏恩堤工專員寫勳承修工程經派員驗收浮報工款四萬餘元又呈報損失委查不實又據點驗材料委員呈報該員有舞弊情形前湖北省政府組織委員會審理因該員病故原案撤銷應否繼續追究請公決案

（議決）既經湖北省政府撤銷毋庸再議

七　各堤工處損計算格式十八年份水利局始通令施行茲清理十八年份以前未報計算各案應否飭照計算格式編造請公決案

（議決）仍照十八年以前辦法辦理

八　查前湖北堤工經費保管委員會十六十七兩年份堤捐收入幣制紊亂各處解文列洋元而賬目列現洋或申鈔顯有從中取巧之嫌應否澈底根究請公決案

（議決）以賬列數目清理

九　前襄河防汛第四段主任徐伯成玩職貽害追繳防汛經費亦未歸結應否查封財產備抵請公決案

（議決）照簽呈辦法辦理

湖北水利堤工事務清理委員會第五次會議議事紀錄

時　間　二月十五日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　吳國楨　席德柄　王金職　程文勳

列　席　人　王濟舟　劉萬選　黃策六

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

(甲)報告事項

一　主席指定秘書報告第四次會議議決案執行經過情形

二　二十一年新修江漢兩路堤工已依照第一次議決案函經湖北省政府委派陶爛周少川汪宗藩梁韻湘張安蔭湯祖德鄒子珍周惠孚李萬青吳方樓等分段前往驗收并由江漢工程局指定技術人員廖德金范鴻兢錢儒策朱文藻蔡增祚陳英王宗琳崔鶴峯曾哲李道宗等函由本會委令前往參加查驗

三　據會計師黃策六等簽呈奉　令會算前湖北堤工局長陳克明任內收支各款與案相符至所屬各機關支款本會現正清理似可無須另算

四　會計師報告清理水利局堤工經費委員會賬目情形

(乙)討論事項

一　茲擬定驗收堤工暫行規則已呈總部備案請追認案

(議決)追認

二　前三帝廟堤工尋員桂員若承辦鉛絲籠一案經依照第二次議決案就卷內疑點令據該員呈復到會如何辦理請公決案

(議決)將全案呈請　總司令部核辦

二　前中灣堤工處長楊聲瀛呈賣二十年防汛費計算一案經前水利局剔除洋五百餘元茲據聲復前來可否准予核銷請公決案

(議決)除二八九號單據剔出外餘准其核報

四　前天潛堤工處長王寶琛呈請發給扣押一成工款尾數並聲明坦坡崩坍原因懇予核銷一案可否照准請公決案

(議決)派襄第三河段驗收委員查復再奪

五　前沔天堤工處長張馭宸呈請核發工欵尾數一案可否照准請公決案

（議決）除剔出陷塌之工款一一三三元二八二外餘准予補發

六　前襄河防汛第四段主任徐伯成具報十九年六八九等月份處用可否准予支用請公決案

（議決）該員十九年六月並未到差六月份處用應行剔出七八九等月處用准予列報

七　准江漢工程局函商各山存石收方給價運輸保管等辦法一案酌擬會商意見五條是否可行請公決案

（議決）照辦

八　前潛江堤工專員王兆虎十九年承修賴李深趙坦坡崩坍材料損失經前水利局派員驗收核算相符可否核准請公決案

（議決）擬准核銷仍候呈　總司令部核示

湖北水利堤工事務清理委員會第六次會議議事紀錄

時　間　二月二十二日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　吳國楨　席德柄　程文勳

請假委員　王金職

列　席　人　楊思廉　王濟舟　傅知先　劉萬選　黃策六

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

(甲)報告事項

一　主席指定秘書報告第五次會議議決案執行經過情形

二　前兩圻北永荊唐等堤工專員胡宗棣任內溢支經費百元有零請轉入留用員役處用內計算又十八年六月份工欵計算十十一兩月份處用計算免予造報均經函呈核准有案應免置議

三　本會派員驗收各處蠻石旅費共須洋三百四十六元已造臨時預算呈總部核發

(乙)討論事項

一　前孫家拐堤工處長劉鎮寰欠繳蠻石運費兼據王趙孫李堤工驗收案亦未核結應如何辦理請公決案

(議決)保留

二　前襄陽老龍堤工處長易震芳任內十九年四月至十二月局用計算未據造報負責無人可否免議請公決案

(議決)准予免造計算

三　前樊口堤閘委員會欠繳借欵七千元省派會委薪俸計算亦未造報應如何辦理請公決案

(議決)(一)借欵函湖北省政府查追

(二)計算免予另編

四　前湖北堤工經費保管處十七年點收簡家灣堤工督修當春元移交工欵案內益大錢莊欠繳存欵四千三百串文應如何辦理請公決案

(議決)通知湖北省政府作借欵轉賬並函堤工專欵保管委員會查照

湖北水利堤工事務清理委員會第七次會議議事紀錄

時　間　三月八日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　席德柄　吳國楨　程文勳　王金職假

列席人　王濟舟

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第六次會議議決案執行經過情形

二、前孫家拐堤監修員廖調陽十六年捲逃工欵三萬元有奇經前水利局呈准通緝并查封財產迄未辦結已呈請　總部通令嚴緝並令湖南原籍將所封財產變價備抵

三　前清理樊口堤閘內湖荒業局十六年向前水利局借墊經費五千三百元迄未清還一案已連同本會第六次會議議決前樊口堤閘委員會欠繳借欵案一併函請湖北省政府查追（王前水利局長任內賬冊僅列洋五千三百元）

四　本會自成立日起截至本月二十二日止三個月限期屆滿清理各案尚未完竣擬即照章展限一月

（乙）討論事項

一　審查前孫家拐堤工處長劉鎮寰任內經手未結事件擬具辦法清公決案

(議決)(一)欠繳蠻石運費根據原案追賠

(二)王趙深李工程准照驗收數目造報

二　前黃坵冶堤工處長郭世英呈請補發欠領工欵洋二三一四元七七一可否給領請公決案

(議決)彙案請發

三　前襄陽老龍堤工局長洗景熙赴任時領洋一伯五十元未據造報又月報收支清冊應按月補造三份該員已病故可否免造請公決案

(議決)准予免造

四　淮江漢工程局兩轉據平湖漢陽兩門閘夫目金啟松等請發上年十月份工食洋四十四元一案核案相符可否照准請公決案

(議決)彙造預算請領

五　前襄陽老龍堤工局長洗景熙經手存放萬太生工欵倒塌洋三千二百元可否核銷請公決案

(議決)准予核銷

六　據承包天潛堤五支角磚渣工人羅順記呈以購存李家嘴磚渣被衝無力賠償請免剔除一案可否照准請公決案

(議決)保留

七　查前湖北堤委會十八年八月方任帳內漏收堤捐洋一千六百元一案茲據當時副會計王世綱呈述記帳錯誤原因可否准予解除責任請公決案

(議決)俟龍紹游緝獲到案再行訊辦

八　前武嘉沔堤工處長劉萬選伍正林二十年承修工程因水溢堤面間有洗刷崩塌應否照案免賠請公決案

(議決)准照驗收數目造報

湖北水利堤工事務清理委員會第八次會議議事紀錄

時　間　三月二十二日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　吳國楨　席德柄　王金職　程文勳

列席人　王濟舟　劉萬選　黃策六　黃　燮

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第七次會議議決案執行經過情形

二　前三帝廟堤工專員桂負蒼承修該處堤工疑竇滋多一案經依照第五次會議議決案呈奉　總部指令已令鄂省府將桂負蒼停職扣留並勒令到會清算

三　前襄河第四段防汛主任徐伯成玩職貽害一案依照第四次會議議決案呈奉　總部指令已代電蘇省府飭縣切實追繳并責令投會清理

四　前長江第四段防汛主任劉盛鑫何滌琴共同舞弊一案經呈奉　總部令准通緝並分令皖省府鄂三區行政專員飭將該兩員財產查封變價追還另電浙省府嚴催劉盛德將劉盛鑫交案又以劉盛德易冀生錢翰聲均不無嫌疑令經本會酌擬處分呈復旋准　總部軍法處函將本案全卷調處核辦

五　前孫家拐堤監修員廖調陽捲欵潛逃一案已呈奉　總部令准通緝並電湘省府飭縣將已封財產變賣備抵

六　川江龍公司倒騙堤欵一案因原保查問渠各商店經理等羈押已久案懸未決經呈奉　總部指令提部訊明核辦

七　前公安堤工處長呂學謙透支工欵疊令先繳二千元迄未遵辦已函由武昌省會公安局將該前處長傳案押追

八　副主任委員查勘張公堤工程情形報告案

（乙）討論事項

一　前陽夏堤工處長楊鴻勛二十年承修該處堤工經局委驗收洋一八〇九〇八元六八七惟未取具包工切結可否核轉請公決案

（議決）包工切結免造工欵照驗收數核轉

二　前鍾祥堤工處長丁雲翔二十年承修該處堤工經局委驗收洋一〇八二九一元六五惟兩柴磯被沙土壓沒又未取具包工切結可否核銷請公決案

（議決）包工切結免造被壓沒兩柴磯所用材料既據督查員點驗屬實准予核銷

湖北水利隄工事務清理委員會第九次會議議事紀錄

時　間　四月五日

地　點　本會

出席委員　李書城　席德柄　吳國楨　程文勛　朱玖瑩　王金職

列　席　人　楊思廉（高凌美代）　王濟舟　黃策六

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

(甲)報告事項

一　主席指定秘書報告第八次會議議決案執行經過情形

二　本會自成立日起截至三月二十二日三個月期滿已呈奉　總司令部令准展期一個月

三　前樊口湖荒堤工局長江暑生呈復任內損失文件衣物係因二十年大水所致自係實情附覆遺失清冊核案亦符該局已裁姑准核銷

四　准總部軍法處函以劉盛鑫浮報蠻石案內驗收員錢濤聲已拘押並請飭令易冀生之保薦人限期將易冀生交案訊辦

五　查驗收委員多已回省據報各處餘存材料各工務所時有藉口未奉局令或距所稍遠碍難照章派員接收

(乙)討論事項

一　前水利局歷任局長支付各縣雨量員薪俸各堤工處結束津貼及各項雜支共洋三二四五九元四一七均未造報可否免造請公決案

(議決)原則通過

二　前武金堤工局長涂允欽二十年承修該處堤工經局委驗收列支工款洋九八七五元〇七五可否核准請公決案

(議決)照驗收數核准

三　准湖北堤工專欵保管委員會函准美領事函請退還宜昌征收施美洋行過量堤捐四九一元六七一案可否照准請公決案

(議決)照省政府核示原案函復

四　擬具解決歷年各工程處蠻石糾紛辦法提請公決案

(議決)推朱委員程委員與楊局長會商辦理

湖北水利隄工事務清理委員會第十次會議議事紀錄

時　間　四月十九日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　席德柄　吳國楨　王金職　程文勳

列席人　楊思廉(高凌美代)王濟舟　傅知先　黃　燮　劉萬選　黃策六　金嘉鉞

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

(甲)報告事項

一　主席指定秘書報告第九次會議議決案執行經過情形

二　查二十年以前各堤工處欠領工款尾數及結束津貼並各委員旅費尾款各縣雨量員欠領薪俸經會核定應發之款共洋二一二九二元八八已造具預算書呈請　總部核發

三　朱程兩委員已依據第九次議決案與江漢工程局商定收運存石扣抵透支辦法三條幷函知江漢工程局查照辦理

(乙)討論事項

一　十九年劉文權承修黃家拐護岸工程一案令據驗收委員周少川曾哲呈復蠻石數尚實在可否准以局委驗收數造報請公決

案

（議決）准飭照驗收數造報

二 准湖北省政府函據前堤工局呈送二十年嘉魚堤工驗收表一案復核相符可否准以該局核定之驗收數造報請公決案

（議決）准照堤工局核定數造報

三 據驗收委員梁韻湘廖德金呈報驗收二十一年武嘉堤工程一案核案相符可否准予報銷請公決案

（議決）照辦

四 據漢昌公司經理趙慶純請求解決舊案三點分別擬具辦法提請公決案

（議決）一三兩項照辦二項照水利局二十年一月以後照磅方給價之原案辦理

五 查本會原定各段驗收期限與實際情形頗有出入擬分段酌改以符事實又驗收委員旅費擬不分薦委一律每日不得過四并請公決案

（議決）照辦

六 本會展限一個月截至本月二十二日滿期舊案新工仍難結束應否再請展期請公決案

（議決）再請展期兩個月

湖北水利隄工事務清理委員會第十一次會議議事紀錄

時　間　四月二十六日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　程文勳　王金職　席德柄　吳國楨

列席人　楊思廉　王濟舟　黃　燮　傅知先　劉萬選　余嘉鉞

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第十次會議議決案執行經過情形

（乙）討論事項

一　查曾祥俊十八年承修蕭家洲堤工十九年承修宏恩三磯均已崩塌經前水利局呈奉省府令准備案可否照原案辦理請公決案

（議決）呈請總部將曾祥俊停止任用五年

二　查江署生二十年承修民信閘等處堤工經前堤工局核定驗收洋二五五五六元〇八一并據呈請加列未用洋灰價三四九元五五三復核無訛可否照准請公決案

（議決）照准

三　查張冰如潘晦根二十年先後承修沔陽堤工經前堤工局核定驗收洋一一三三一五元八三六復核無訛可否照准請公決案

（議決）照准

四　據驗收委員鄒子珍崔鶴峯呈報驗收京山堤工表列工欵洋一五〇二六六元三六核案相符可否照准請公決案

（議決）照准

五　據驗收委員汪宗潘陳英呈報驗收三帝廟拋石護岸工程表列工欵洋一〇三四三三元七一三核案相符可否照准請公決案

（議決）照准

六　據驗收委員梁韻湘廖德金呈報驗收沔陽堤拋石護岸工程核定驗收工款洋五六九九〇元〇一可否照准請公決案

（議決）照准

七　據驗收委員崔鶴峯鄒子珍呈報驗收方家灣附屬工程列工款洋一一八〇元〇六核算無訛可否照准請公決案

（議決）照准

八　據驗收委員張安蔭王宗琳呈報驗收武昌堤工程列工款洋一〇七三五七元二一五審核相符可否照准請公決案

（議決）照准

九　據驗收委員汪宗藩陳英呈報驗收朱三弓合龍工程列工款洋六四九九八元〇二五核算相符可否照准請公決案

（議決）照准

十　據驗收委員朱文藻李萬青呈報查明二十年天潛堤甎坦崩塌實因水泓過深蠻石不濟具有特殊情形可否免議請公決案

（議決）准予免議

湖北水利隄工事務清理委員會第十二次會議議事紀錄

時　間　五月三日

地　點　本會

出席委員　李書城　吳國楨　席德柄　王金職

請假委員　朱玖瑩　程文勳

列席人　楊思廉　王濟舟　劉萬選　傅知先　黃　燮　黃策六　余嘉鉞

主　席　李書城

紀錄　王濟舟

開會如儀

(甲)報告事項

一　主席指定秘書報告第十一次會議議決案執行經過情形

二　朱副主任委員請假兩星期回鄂由王秘書濟舟代折代行已呈報總部

三　查前湖北堤工經費管理委員會歷任收支各欵有漏未列帳者有因貨幣不一前後任交接數目不相啣接者擬分別補行登記或核銷並彙報總部備案

(乙)討論事項

一　據驗收委員周少川曾哲呈報驗收二十一年公石堤工表列工欵洋五九三三〇元可否照准請公決案

(議決)照准

二　據驗收委員張安蔭王宗琳呈報驗收二十一年鍾家台堤工表列工欵經核定爲六一三一元三一可否照准請公決案

(議決)照准

三　據驗收委員朱文藻李萬青呈報驗收二十一年天門堤工表列工欵經核定爲四八五九三元可否照准請公決案

(議決)照准

四　查前湖北堤工經費管理委員會吳醒亞等委員任內應存劵洋數短少五一元三三可否准予核銷請公決案

(議決)准予核銷

五　查羅順記承包天潛堤五支角磚渣被衝一案前經議決保留現查天潛堤崩塌工程已准免議本案應如何辦理請公決案

（議決）仍照原案責令該包工負擔

六　據驗收委員張安蔭王宗琳呈報驗收二十一年三合垸工程表列工欵洋五三八元六可否照准請公決案

（議決）照准

七　據驗收委員朱文藻李萬青呈報驗收二十一年白沙灘工程表列工欵洋五三五三元七六八可否照准請公決案

（議決）照准

八　前據沔天堤工處長張馭宸呈二十年經修之坦工雖崩料尚能用懇免剔除一案一再委查屬實可否照准請公決案

（議決）免予剔除三九五元九七六

九　據驗收委員朱文藻李萬青呈報驗收二十一年荆潛堤工核定工欵一三九〇四元八一可否照准又一部份坦坡下蜷損失工欵三六〇八元九七應否責令承辦人賠繳請公決案

（議決）先將處長楊烺工程主任甄士杰扣留限期賠繳並將楊烺歷年修堤崩塌情形呈總部轉飭永遠停止委用

十　據驗收委員周少川曾哲呈報驗收二十一年公安堤工核定工款一〇七〇八四元九八五因二聖寺磯坦崩塌五分之二應如何分別議處請公決案

（議決）先將前後任處長呂學謙易燊及工程主任張鵬心扣留

湖北水利堤工事務清理委員會第十三次會議議事紀錄

時間　五月十日

地點　本會

出席委員　李書城　席德柄　吳國楨　王金職

請假委員　朱玖瑩　程文勳

列席人　楊思廉（高凌美代）王濟舟　傅知先　劉萬選　黃　燮　余嘉鉞　黃策六

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第十二次會議議決案執行經過情形

二　本會第一次請領補發二十年份以前各項尾數一案已奉准發洋二一二九二元八八

三　長江第六段驗收委員湯祖德范鴻競驗收黃梅黃圻冶兩處堤工報告不實已派李道宗復驗

四　二十一年各修防處用餘防汛料具如交工務所保管諸多窒碍擬變通辦理仍交各該監防處保存一面造冊送江漢工程局備查

（乙）討論事項

一　據驗收委員石吳成嶽方樓呈賫驗收二十一年沔川堤工表經核定工欵洋六〇四八七元八一可否照准請公決案

（議決）如簽辦理

二　據漢川縣長陳振鈞呈復前縣長何澄之十六年領發南屏垸補助費五千元因帳據被匪損失無從造報一案可否免造請公決案

（議決）准免造報彙呈總部

三　查王寶琛二十年承辦天漕堤工任內坦坡崩塌暨磚渣衝失兩案已提會議決可否照局委驗收工款洋一一九六八六元六七八飭令造報請公決案

（議決）准照驗收工款洋數造報

四　據驗收委員石成嶙吳方樓呈覆驗收二十一年鄧李灣附屬工程表列工欵洋四〇五三元五可否照准請公決案

（議決）照准

五　查魯方才二十一年領武惠堤補助費二萬元據驗委呈請以葛監修驗收洋一二五二三元三六七爲該堤工欵核定數可否照准餘洋七四七六元六三三應否飭繳請公決案

（議決）照葛監修員呈報驗收洋飭造計算餘欵追繳

六　據驗收委員陶炯李道宗呈覆驗收二十一年荆江堤工表列工欵洋七九三五〇元六二又金城垸工款洋一四七四三元八六一可否照准請公決案

（議決）准照驗收數造報金城垸工人保結免具

七　據驗收委員石成嶙吳方樓呈覆驗收二十一年天沔堤工表列工款洋八一〇七三元〇九五可否照准請公決案

（議決）如簽辦理

八　查十九年嘉蒲咸武堤工係劉程張三專員承辦經核定驗收工款洋七五七六九元〇二二可否先行核准至因鄭思煒案剔除之蠻石一千餘方擬另案辦理再程忠之迄未投會應如何處分併請公決案

（議決）准照核定驗收工款七五七六九元〇二二先行造報程忠之呈請總部通緝

九。查各工程處造報計算關於蠻石價欵應掣取各採石包工之收據茲因種種窒碍擬改由採石處出據交處造報可否請公決案

（議決）照辦

湖北水利隄工事務清理委員會第十四次會議議事紀錄

時　間　五月十七日

地　點　本會

出席委員　李書城　吳國楨　席德柄　王金職

請假委員　朱玖瑩　程文勳

列席人　楊思廉　王濟舟　傅知先　劉萬選　黃　燮　黃策六　余嘉鉞

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第十三次會議議決案執行經過情形

二　十六年天門縣呈解昔淵口堤工處繳還堤捐之國庫券廢一千五百元已由前水利局呈繳建設廳在卷茲經本會函准建設廳復稱無案可稽惟卷內確有該廳收據擬即照據付帳

三　十八年江漢二五內地稅局裁撤時商欠堤捐十七八萬元嗣經桐油稅局催繳一萬九千餘元餘均無著該兩局早經裁撤無案可稽此項欠款無從催收擬彙呈　總部備案

四　本月十六日王委員帶同本會工程師復驗張公堤工程

（乙）討論事項

一 順記公司以二十一年運交漢川工程處護脚石方價折減損失難堪迭呈請照工程處原收方數給價可否照准請公決案

(議決)照案駁斥

二 前據劉昇恒造報十七年補駁漢黃三段堤工旅費五三元七九一案查係揑造據報茲據聲明錯誤呈請剔除可否免議照准請公決案

(議決)姑准剔除并嚴加申斥

三 查楊煥二十年承辦潛京堤工經局委驗收核定工欵五六七八〇元一三可否照准又王萬口等四處坦坡損壞酌擬處分併請公決案

(議決)准照核定驗收洋數造報坦坡損壞處分如簽辦理

四 查二十一年呂學謙易燊承修公安二聖寺磯頭崩塌一案已提會議決茲按照設計施工各員責任酌擬處分提請公決案

(議決)保留

五 查二十一年楊煥承修荆潛堤曹八里坦坡下蹬一案已提會議決茲將該處長工程主任處分照章酌擬請公決案

(議決)如簽辦理

六 各徵收機關欠解堤工經費甚鉅應如何究追請公決案

(議決)分別公虧私虧擬具辦法呈請總部核示

七 前塔市驛協昌蠻石公司過領石欵甚鉅久懸未結應如何辦理請公決案

(議決)照簽擬具辦法呈請總部核示

八 據王兆虎劉鎮寰呈覆孫家拐堤工欵計算並未照案造報應剔除一〇九四元三四三實應列洋一八五三〇七元九二九可否照辦請公決案

（議決）照辦

九　據黃紹豫呈前在江陵財政局長任內被董西階挪堤捐三千元請令竹山縣查封董西階財產備抵一案應如何辦理請公決案

（議決）令原籍松滋縣查明黃紹豫財產變賣抵償

湖北水利隄工事務清理委員會第十五次會議議事紀錄

時　間　五月二十四日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱敬瑩　席德柄　王金職　程文勳

請假委員　吳國楨

列　席　人　楊思廉　王濟舟　傅知先　劉萬選　黃策六　黃　燮　余嘉鉞

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第十四次會議議決案執行經過情形

二　副主任委員已於本月二十二日由籍回漢銷假列會視事

三　益大錢莊欠繳前簡家灣堤工存欵銅元四千三百串一案經函准財政廳函復歸入甲債案內辦理未便單獨轉賬等因擬作懸案彙報

四　水利局第一測量隊二十一年六月份經費二七〇〇元計算因隊長病故無人造報又技士王秉衡支出勤費一二九元計算發還未呈復現爲呈送測量整個報銷起見擬將該兩案彙請核銷

（乙）討論事項

一　前據漢昌採石公司請求解決舊案三點已擬具辦法提會議決幷批示在卷茲復據兩呈請維持合約如何處分請公決案

（議決）仍照原案辦理

二　前王唐黃襄堤工專員王兆虎經支十六年防險費九一七九元一七五防險處用四二八六元單據被匪刦損失飭據前該堤工程師顏守仁證明屬實可否准予核銷免造計算請公決案

（議決）准予免造

三　據劉鎭寰呈以王趙深李工欵內經局剔除之王工帚柴雨欵共六四元四〇一呈准有案請准增加等情查尙屬實准否請公決案

（議決）照准

四　據前武嘉沔堤工處長伍正林呈稱奉局令代造嘉沔咸武堤餘存材料保管員經費計算共三一六元八單據遺失可否准免代造請公決案

（議決）准免代造

五　准湖北堤欵保委會函以宜昌征收施美洋行過量堤捐四九一元六七美領再請發還一案如何辦理請公決案

（議決）函復堤款保委會事關稅則問題不屬清理範圍仍請向全國經濟委員會請示

六　據驗收委員周惠孚饑儒策呈驗收小江湖鄧豕湖二十一年協助工程可否即以原發四萬元作報銷數又監修員控案可否免議幷請公決案

（議決）准照發欵數報銷監修員控案免議

七　據驗收委員周惠孚錢儒策呈驗收二十一年鍾祥堤工表列工款連同追加船捐共一二八〇六八元三四三及老龍堤工欵六七〇一元四七六可否照准又破爛紅石超過原估如何處理幷請公決案

（議決）鍾祥及老龍堤工欵准照驗收數造報船捐准予增加破爛紅石超過數准併驗收數列報

八　查鍾祥船捐主任王世綱陳錦軒呈請補發任內欠費共五千餘元已提會議決不准茲復據呈請前來可否准發請公決案

（議決）准照鍾祥堤工處船捐預算數攤發欠領經費及補助費

九　據驗收委員汪宗藩陳英呈驗收二十一年車灣堤工列工欵洋一五一二八六元一一三可否照准請公決案

（議決）所有南津港石方通按九折發給以示懲罰

十　查二十一年呂學謙易燊承修公安二聖寺磯頭崩塌一案已將呂易兩處長扣留茲按照設計施工責任酌擬處分請公決案

（議決）交楊局長王程兩委員審查

十一　公安堤工處長易燊荆潛堤工處長楊烺扣留武昌公安局及武昌縣兩案據取具鋪保隨傳隨到並負賠欵責任可否准予暫保請公決案

（議決）易燊楊烺准予交保

十二　張公堤二十一年劉亮丞經修工程草率糜費應如何辦理請公決案

（議決）併第十案審查

湖北水利堤工事務清理委員會第十六次會議議事紀錄

時　間　五月三十一日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　吳國楨　席德柄　王金職　程文勳

列席人　楊思廉　王濟舟　傅知先　劉萬選　黃　燮　黃策六　余嘉鉞

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第十五次會議議決案執行經過情形

二　荆潛堤坦坡下經一案已呈奉

總部令准訓令鄂省府及江漢工程局將楊煥永遠停委並由會錄令轉飭楊煥甄士杰遵照賠款

三　前中央銀行虧欠堤捐存款銀五萬餘兩券鈔共六十五萬餘元各機關繳該行支票未兌現者券鈔法幣共九萬餘元保委會現存券鈔六萬元有零合計虧銀五八一九六兩一九洋八〇九〇五二元七四五擬呈

總部核示

四　前嘉蒲咸武堤工專員程忠之匿不到案經手各欵無從解決一案已依據議決案呈奉

總部指令遵令嚴緝

五　前公安堤工處長易燊扣留一案已依據議決案函省會公安局將該員開釋

（乙）討論事項

一　據驗收委員湯祖德范鴻兢呈驗收二十一年黃梅堤工欵五四七九七元四五又補修土堤工欵及防汛補助費共一一〇八〇元九八可否照准請公決案

（議決）照准

二　查武惠堤代表魯方才等領補助費二萬元經依據議決案飭令造報並繳餘欵據呈均未遵辦應如何處分請公決案

（議決）飭造計算餘款令逕呈省府核示

三，前水利局建設廳歷年經支委員出差旅費一萬餘元從未造報茲擬酌量案情分別擬具辦法提請公決案

（議決）一二兩項照辦三項擬將計算送財政廳呈請

總部核示

四　據前武金堤工處長涂允欽呈報驗收表漏列剩餘樁木值洋三七八元七二八經令據該驗委等查復屬實可否准予列報請公決案

（議決）准予列報

五　本委員會第十三次會議第九案議決蠻石價欵改由採石處出據交工程處造報辦法仍有困難擬即由本會粘簽証明可否請公決案

（議決）由會粘簽證明

六　前嘉魚督採蠻石專員鄭思燁空塡蠻石聯票一案迭據呈訴寃誣情形前據蠻石包工趙慶純屢請將水利局剔除之一千另四十方蠻石照數給價到會經澈查全案似無確據可否免究准予列報請公決案

（議決）擬具解決辦法呈請
總司令部核示

七　據驗收委員張安陰王宗琳呈驗收沬溜垸工程樁木被壓無從驗收一案查該垸實施工欵洋八四〇元可否核銷請公決案
（議決）准照實施數造報

八　據本會股員李道宗呈報復驗黃圻冶堤二十一年工程計驗收工款洋五七三七八元一九二審核相符可否照准請公決案
（議決）准照復驗數造報驗收委員湯祖德范鴻競驗收不實函知各本機關撤職並停發欠領薪水

九　張公堤工程草率審查報告案
（議決）工程草率虛糜公欵罰洋二千元由處長工程主任分擔督察員馬延益高凌美應予以申斥處分

十　公安二聖寺磯頭崩塌審查報告案
（議決）原估復估設計人員吳仲凡張鵬心停委兩年主管處長呂學謙易藥除虧欵追繳外從寬予以申斥處分科長技正股長各員予以申斥處分

湖北水利堤工事務清理委員會第十七次會議議事紀錄

時　間　六月七日

地　點　本會

出席委員　李書城　席德柄　吳國楨　王金職

請假委員　朱玖瑩　程文勳

列　席　人　王濟舟　傅知先　劉萬選　黃　燮　黃策六　余嘉鉞

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

(甲)報告事項

一　主席指定秘書報告第十六次會議議決案執行經過情形

二　朱副主任委員奉總部委令查勘本年新修江襄兩岸各堤工程已於本月六日起程副主任任務由王秘書濟舟代折代行已呈總司令部備案

三　本會辦理結束所有未能依限完結各案擬將屬於水利堤工範圍內者移交江漢工程局屬於堤工經費範圍內者移交湖北堤工專欵保管委員會分別繼續辦理一面造具清理報告冊表呈核已呈請　總部核示

四　查二十一年份各堤工機關欠欵尾數共計洋五二九六四元一三已編製預算呈請　總部核發

(乙)討論事項

一　查李重威十九年承辦葉家洲工程造送工欵計算錯誤又透支洋四八六元八七七一案該員早經病故可否特准核銷請公決案

(議決)准予核銷計算照轉

二　前宜昌特稅堤捐徵收主任吳連慶梅肅堂任內各月經費多未造報幷有結餘未繳可否免造免繳准照預算數轉帳請公決案

(議決)准照預算數轉帳

三　前孫家拐堤工處長王兆虎付給保安第一大隊起卸費用添雇民船洋六二四元六二追繳無着應否仍令王兆虎賠繳請公決案

（議決）准作特別開支

四　查漢昌採石公司呈請解決舊案三點業經先後提會議決在卷茲復迭據呈述經過事實請求速決應如何辦理請公決案

（議決）函江漢工程局就現運到工之石重行過磅即以所磅重量作解決依據

五　查二十一年車灣堤工驗收案經提會議決南津港石方通按九折發給在卷茲據永盛永興六合等公司呈請免予折扣如何處置請公決案

（議決）准予分別辦理由秘書處擬具詳細辦法呈核

六　據前孫家拐堤工處長劉鎮寰呈請寬限追賠胡盛豪青磚定洋一千一百六十一元六角一分及李合階蔡廣大虧欠蠻石運費八百另四元一分並擬具照數認賠百分之十五欵項辦法可否照准請公決案

（議決）准其照數認賠百分之十五暫予解除責任胡盛豪欠欵令潛江縣轉飭具結將來需磚時照數交磚抵欠李合階蔡廣大欠欵令縣查明追賠

湖北水利堤工事務清理委員會第十八次會議議事紀錄

時　間　六月十四日

地　點　本會

出席委員　李書城　吳國楨　席德柄　王金職

請假委員　朱玖瑩　程文勳

列　席　人　楊思廉　王濟舟

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第十七次會議議決案執行經過情形

二　協昌公司過領石欵一案已呈奉　總部指令（一）（二）（三）項准照原擬辦法辦理將該公司財產抵償確數估計呈報（四）項經手專員應嚴懲除何滌琴已通緝吳伯崙准通緝外劉國藏吳煥章永不叙用並查明有無他案牽涉文節栽俟查明有無其他透付欵項情事再議處分并將類此各案查明於結束時公佈

三　准漢口公安局函寄押之甄士杰病重請保釋一案經派員查視屬實並由該局醫官張體乾出具証明書係患肺結核

四　本會函請湖北省銀行將張公堤工程處所存公欵除A零二五五一六號支票計洋一〇五六元一七四照兌外餘欵停付一案茲准函復照辦

五　奉　總部指令本會結束未了事件交江漢工程局及堤工專欵保管委員會辦理已照准

（乙）討論事項

一　查荆潛堤曹八里坦坡下經一案已提會議決並呈奉　令准在卷茲奉　總部先後令據楊煥甄士杰呈請免予賠繳分飭核議具復等因應如何呈復請公決案

（議決）可否原情減免呈請　總司令部核示

二　據秘書遵令擬具二十一年車灣堤工處驗收石質案解決辦法可否照准請公決案

（議決）照簽呈辦理

三　查王兆虎歷任承辦堤工懸案極多業經本會陸續核定計共欠繳公欵二千七百七十九元五角另四厘茲據再呈嘵辯並僅認賠洋六百零八元四角四分二厘應如何辦理請公決案

（議決）照案限期嚴追

四 據前荆潛堤工處長楊煥呈驗收表錯漏兩欵請准列報一案共計漏列洋二六七元六二可否照准請公決案

（議決）照准

五 據豐記採石公司呈前交沔陽堤工處蠻石水淹崩塌九二方六請發山價一案可否照准請公決案

（議決）照准

六 據前沔陽堤工處長潘晦根呈局令發還前長江第六段料具保管費計算飭代更正之文并未奉到一案可否准免代造請公決案

（議決）准免代造

七 據李錦駒呈十九年續修車灣堤工請准照前堤工局核定驗收工欵數造報即以應領尾欵及結束辦公費抵繳同昌厚倒欵一案可否照准請公決案

（議決）照准

八 查忠成華清豐記利濟各採石公司透支石欵存石不足抵償分別擬具辦法可否照辦請公決案

（議決）（忠成華清）（一）准交公安局（二）欵暫停發計算粘簽註明（豐記）（一）函請江漢工程局收石扣抵（二）欵暫停發

（利濟）函江漢工程局收石扣抵

九 前陽夏採石處透支包工張福堂石款約五千元無可抵償應如何辦理請公決案

（議決）張福堂夏赤臣均行押追

十 查前京山堤工處長梁繼頌任內餘存洋灰被刼一五桶沈沒一〇五桶可否准予核銷請公決案

（議決）准予核銷計算照驗收數列報

湖北水利堤工事務清理委員會第十九次會議紀錄

時　間　六月二十一日

地　點　本會

出席委員　李書城　朱玖瑩　吳國楨　席德柄　王金職

請假委員　程文勳

列席人　王濟舟　傅知先　黃策六　劉萬選　余嘉鉞　黃　燮

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第十八次會議議決案執行經過情形

二　張公堤工程處處長劉亮丞工程主任劉以均承修張公堤工程草率處罰二千元分飭賠繳一案已奉　總部指令准予照辦

（乙）討論事項

一　本會辦理結束擬請發給臨時結束辦公費一五三二元五暨編印總報告書表印刷費二千六百元可否請公決案

（議決）報告表按一千份編造預算餘如擬呈　總部核示

二　據楊煥呈請以德順透支石欵五三二二元五九二監利保衛團借洋三九〇元撥抵潛京荊潛兩屆欠繳工欵可否照准請公決案

（議決）一，透支欵准予先行轉帳

二，保衛團欠款令催監利縣補繳

三　前天潛堤工處長王寶琛任內欠領一十年六月份處用洋二百四十元應否補發暨由何項開支請公決案

（議決）王寶琛應加申飭欠領之欵專案編造預算呈請核發

四　前東灣堤工處長楊聲淦沔陽堤工處長潘晦根嘉魚堤工處長吳煥章透支石欵之責雖未解除各包工確有存石可抵各欠領工程尾欵應否照發請公決案

（議決）如簽辦理

五　公安堤工處長呂學謙欠繳溢支公欵三千元拘押公安局甚久分文未繳茲據請先繳十七年長期金融公債五百元准其交保限期籌繳可否照准請公決案

（議決）照准

荆潛堤工程主任甄士杰賠欵未繳在押病重難覓殷實妥保僅具隨傳隨到之鋪保可否准其保釋或候　總司令部核示再奪請公決案

（議決）既係病重屬實暫准交保

七　據忠成公司李金文呈請照包約算給石欵應如何結算請公決案

（議決）路遠人工加價姑准每方三角拾碼得難照准欠欵函江漢工程局在堵龍堤工欵項下如數扣抵

湖北水利堤工事務清理委員會第二十次會議紀錄

時　間　六月二十八日

地　點　本會

出席委員　李書城　席德柄　王金職　朱玖瑩（王濟舟代）

缺席委員　吳國楨　程文勳

列席人　王濟舟　劉萬選　黃　燮　黃策六　傅知先　余嘉鐵

主　席　李書城

紀　錄　王濟舟

開會如儀

（甲）報告事項

一　主席指定秘書報告第十九次會議議決案執行經過情形

二　前荊潛堤工處長楊煜工程主任甄士烝以坦坡下蹬請免賠款一案已遵令核議具復奉　指令准予減免

三　前張公堤工程處長劉亮丞應繳罰款已令飭三日內呈繳逾限即將省行停付該處存款沒收又工程主任劉以均應繳罰款已函請漢口市政府將該員扣留追繳

二　聖寺磯頭崩塌一案議決將設計之吳仲凡張鵬心停委二年主管之處長科長技正股長各予申斥處分已呈奉總部准如擬辦理

五　本會編印報告表原擬三百份預計二六〇〇元嗣因依據議決案改為一千份預算增至三〇〇〇元

(乙)討論事項

一 查漢昌公司請將二十年一月底以後採石照約給價一案經提會議決函江漢工程局重行過磅茲准復稱未能照辦應如何辦理請公決案

(議決)照第十七次議決辦法呈請 總部令江漢工程局照辦

二 據前漢川馬鞍山採石主任丁慶康呈民生公司石價計算錯誤請更正一案計少列洋四三五元九二查案相符可否照准請公決案

(議決)照准

三 查順記公司請將二十年交漢川工程處護脚石照該處收方數給價一案經提會議決駁斥茲據重申前請可否照准請 公決案

(議決)照第十四次議決案辦理

四 據前沔陽堤工處長范新培呈移交後任之樁木因圍算不合點數不清致損失四二八元一三請免賠繳一案可否照准請 公決案

(議決)准免賠繳

五 前漢川馬鞍山採石主任丁慶康欠繳石欵一一七元可否准予在發給順記公司石欵內扣抵請 公決案

(議決)准予扣抵

六 前漢川馬鞍山採石主任陳建勛欠繳石欵尾數請以透支石欵之採石公司鋪保世吉祥期票三百元抵解可否照准請 公決案

(議決)照准

七　王兆虎歷年經手堤工欠繳尾欵處用剔除及結存共洋二千八百元有零除呈繳六百元外餘數請求減免如何結束請公決案

（議決）照案追繳

八　荆門馬良申採石主任劉澤沛欠繳石欵六百餘元屢催均以關係人未到爲辭墊繳弗無力如何結束請　公決案

（議決）照案追繳

九　王祥甫經手堤工欠繳一千餘元應負責任者二千元屢催不允負責俱謂開支屬實事實俱在等語如何結束請　公決案

（議決）照案追繳

十　查老龍堤工局長鍾瀚聲欠領工欵尾數三百餘元本應照數發給惟該員因劉盛鑫案業經　總司令部管押尚未定案欠領尾數可否照發請　公決案

（議決）照發

十一　楊聲溢吳煥章潘晦根各欠領工程尾欵因透支石欵責任經十九次會議議決候函江漢局復函承認扣抵再行照發惟江漢局以必須存石用盡方可確定發欵數目此刻未便事先預定各該員欠欵可否照發請　公決案

（議決）尾欵先發透支石欵呈請　總部轉飭江漢工程局扣抵

十二　陽夏米糧山採石主任夏赤臣包工張福堂透支石欵五千餘元十八次會議議決函請公安局押追適爲本案石欵爭執在武昌地方法院控訴未決暫未函請照辦現迭據夏赤臣面述當時情形確非本任責任實屬代前任負責可否原情先將張福堂扣押追究請　公決案

議決　先將張福堂拘押追繳

以上共十二案

湖北水利堤工事務清理委員會自二十一年十二月二十三日成立起至二十二年六月二十二日結束止收支現款四柱數目清册

計開

一舊管

無

二新收

(甲)收前水利堤工兩局所屬機關繳還處用經費結餘洋四千三百六十五元三角二分九厘

一、收車灣堤工處長郭世英繳二十一年六月及十月份結餘洋八角五分

一、收車灣堤監防委員郭世英繳二十一年七八月份結餘洋四角

一、收公安堤工處長易燊繳二十一年五六月份結餘洋二角一分

一、收三帝廟監防委員常春元繳二十一年七八月份結餘洋二角九分

一、收第二測量隊長張靖繳二十一年七月份剔除及十月十一月結餘洋三百九十八元九角二分

一、收孫家拐堤工處長劉鎮寰繳二十年結束費結餘洋一元正

一、收王趙琛李專員劉鎮寰繳二十年結束費結餘洋三角六分

一、收荆唐五堤專員朱有庸繳十七年五月份剔除洋三十四元六角一分

一、收潛天高蘆黑橋堤專員楊聲溢繳十八年三月至十一月份結餘洋二十七元三角三分

一、收天門堤工處長左南屏繳二十一年二月份剔除洋五角

一、收沔陽堤工處長王寶琛繳十九年三月至六月份結餘洋二十五元七角七分

一、收長江第二防汛段主任殷盤繳處用結餘洋八角八分

一、收第二測量隊長張靖繳二十年各月份剔除洋一百一十一元四角五分六厘

一、收漢川堤工處長顏守仁繳二十一年二三月份剔除洋一元四角三分

一、收車灣堤工專員楊烺繳十八年元月至六月份剔除洋四元九角七分七厘

一、收廣濟堤專員易冀生繳十九年二月至五月份及結束費結餘洋一百二十三元四角八分八厘

一、收襄河第二區防汛主任易冀生繳十八年七八九月份結餘洋一十八元八角二分四厘

一、收長江組長黎其位繳二十一年四月及六月份剔除洋三元三角

一、收襄河第二區防汛主任孫衛伯繳十九年七月份剔除洋四角

一、收沔川堤工處長張暐樂繳結束費結餘洋二角九分

一、收嘉蒲咸武等堤視察員武正林繳十九年五六月份剔除洋一百四十三元三角九分

一、收水利局長藍文蔚繳武漢武穴監利沙洋水文站及武泰武豐防守處二十一年十一月份結餘洋六百二十三元六角四分

一、收長江組長黎其位繳二十一年八月份結餘洋六百九十二元另六分
一、收沔陽堤工處長潘晦根繳二十年六月份結餘洋一分
一、收沔天堤工處長鄧士强繳二十年結束費結餘洋六分
一、收荆潛堤工處長楊烺繳二十一年四五六月份結餘洋四十二元二角
一、收荆潛堤監防委員楊烺繳二十一年七八月份結餘洋三分
一、收高家拐堤工處長朱徽炳繳二十年六七月份及結束費結餘洋二角七分九厘
一、收襄陽水文站技士劉先炳二十一年十一月份結餘洋四角六分
一、收第九區駐工委員劉度成繳二十一年三月五月份剔除洋六元二角
一、收荆潛堤工處長楊烺繳二十一年五六月份剔除洋一元七角八分
一、收武金堤工處長凃允欽繳二十年六月份結餘洋二角零九厘
一、收小江湖鄧家湖堤監修員柯紹文繳二十一年七月份結存洋二角七分
一、收荆門馬良山採石主任劉澤沛繳二十一年八月份剔除洋六元正
一、收賴謝深李堤工專員王世英繳結束公費結存洋八角三分
一、收襄河第五防汛區主任葉宅聲繳十八年七至九月份結存洋一十一元七角四分二厘
一、收梅濟監防委員楊受慶繳二十一年七八月份結存洋五角八分
一、收襄河第四防汛區主任孫宇倜繳十八年處用剔除洋二十元另四角一分三厘
一、收荆門馬良山採石主任周衆懷繳二十年元月份剔除及結存洋九元正
一、收天潛堤工處長王寶琛繳二十年七八九月份防汛處用結存洋一角七分三厘

一、收孫家拐堤工處長劉鎮寰繳王趙深李堤結束費多列洋四角

一、收常年勘測隊長江組組長黎其位繳二十一年元月份臨時費結餘洋一百九十五元零四分

一、收武泰武豐堤閘防守主任涂允欽繳二十年五月份閉閘費結餘洋四分

一、收荆門馬良山採石主任周衆懷繳二十年處用結餘洋一元三角八分三厘

一、收監利塔市驛採石主任文節栽繳二十一年九月份結餘洋一角

一、收武泰武豐防守主任張境繳掘洩武金堤水口臨時費結餘洋一十二元一角三分

一、收廣春堤工處長余子勤繳結束費餘欵洋二角

一、收水利局長藍文蔚繳澤口水文站二十一年十一月份結餘洋一百八十五元五角

一、收水利局長藍文蔚繳襄陽水文站二十一年十一月份結餘洋一百七十五元五角

一、收沔川堤工處長伍正林繳二十一年七月份剔除洋一元二角

一、收漢陽監防委員謝濟川繳二十一年七八月份結餘洋六元一角

一、收荆河七區防汛主任曾祥俊繳十八年處用結餘洋一元另八分七厘

一、收張公堤工程處長劉亮丞繳二十一年處用結餘及剔除洋一百另一元另九分

一、收七區七段合壠監修員江暑生繳二十一年處用結餘及剔除洋三十五元五角五分

一、收漢川馬鞍山採石主任陳建勛繳十八年及二十年結餘洋三十元另三角二分

一、收沙洋水文站技士朱友椿繳經費結餘洋一角三分八厘

一、收沔天堤工處長張馭宸繳二十年處用結餘洋六百二十五元七角九分七厘

一、收黃圻冶堤工處長郭世英繳二十年結束費餘欵洋二分

一、收黃圻冶堤工處長郭世英繳二十年處用結餘洋三十四元九角七分

一、收朱三弓監修員王兆虎繳開辦費及處用結餘洋一元七角五分

一、收孫家拐堤工處長王兆虎繳處用結餘洋八角三分九厘

一、收第二測量隊長王祥甫繳二十年經費結餘及剔除洋一百八十二元另四分二厘

一、收嘉魚蕭家洲堤工專員曾祥俊繳十八年處用結餘洋三百一十五元二角六分一厘

一、收前襄陽老龍堤工局長錢溺生繳二十年經費結餘洋四厘

一、收前天沔堤工處長雷震球繳二十一年處用剔除洋八十八元二角三分三厘

一、收前襄河第二防汛段主任楊聲溢繳十九年處用剔除洋一十二元正

一、收前石首黃家拐堤專員劉文權繳十九年處用結餘洋三十元另四角一分四厘

一、收沔陽堤工處長潘晦根繳二十年處用結餘及剔除洋一十三元六角一分

(乙)收各處繳還工程防汛餘欵及料欵洋八千五百二十元另五角八分五厘

一、收武嘉監防委員揭祐繳二十一年防汛餘欵洋一千二百四十二元五角四分

一、收孫家拐堤工處長劉鎮寰繳二十年工欵餘欵洋一元一角六分

一、收長江第二防汛段主任殷盤繳十九年防汛餘欵洋八元八角

一、收襄河第一防汛段主任丁雲翔繳十九年防汛餘欵洋二分五厘

一、收漢川馬鞍山採石主任丁慶康繳料欵餘欵洋一百二十二元正

一、收漢黃第二防汛區主任葉萬青繳十七年防汛餘欵洋二十一元一角五分

一、收鄧李灣監修員黃明繳二十一年工欵餘欵洋二十八元四角五分
一、收沔陽堤工處長潘晦根繳二十年防汛餘欵洋六分
一、收荆門馬良山採石主任劉澤沛繳料欵餘欵洋二十七元另五分
一、收第九區駐工委員劉度成繳二十一年工欵餘欵洋五百三十四元六角八分
一、收襄河第四防汛區主任孫宇倜繳十八年防汛餘欵洋十元另三角九分八厘
一、收漢川堤工處長顏守仁繳二十一年工欵及防汛餘欵洋一百另一元八角六分
一、收漢川馬鞍山採石主任丁慶康繳料欵餘洋一百六十一元正
一、收漢川堤工處長顏守仁繳二十一年水尺工欵餘欵洋九十七元五角一分
一、收荆河八區防汛主任劉昇恒繳十八年防汛餘欵洋五十二元四角三分
一、收武嘉堤工處長揭祜繳二十一年工欵餘欵洋一百八十一元二角三分
一、收漢黃二區防汛主任葉萬青繳十七年防汛餘欵洋四厘
一、收松滋縣長楊鳳翔繳二十一年防汛餘欵洋四百四十九元三角五分
一、收武昌堤工處長何浩代扣繳陽夏採石處料欵洋六百二十六元七角四分
一、收武昌堤工處長何浩繳二十一年工欵餘欵洋六百九十九元七角二分
一、收公安堤工長左鵠繳二十年防汛費餘欵洋一十元另八分
一、收天門堤監防委員左南屏繳二十一年防汛費餘款洋八角八分
一、收塔市驛採石主任文節栽繳料欵餘洋三十六元三角六分二厘
一、收嘉浦咸武堤工專員劉鎮寰繳十九年工欵餘欵洋一十元正

一、收漢陽堤監防員謝濟川繳二十一年防汛費餘欵洋一百三十三元四角

一、收張公堤工程處長劉亮丞繳二十一年工欵餘款及賠欵一部洋一千另三十六元九角六分

一、收孫家拐堤工處劉鎮寰繳削樁工資剔除洋六元五角九分五厘

一、收孫家拐堤工處長劉鎮寰繳二十年工欵剔除洋二分

一、收襄河第四防汛區主任李錦駒繳十七年防汛費餘欵洋二百二十一元零九分一釐

一、收第八區駐工委員蔡傳書繳三合垸工欵餘欵洋二百另八元九角正

一、收朱三弓監修員王兆虎繳二十一年工欵結餘及剔除洋一十六元二角六分三厘

一、收荆河第八防汛區主任劉昇恒繳十八年防汛費餘欵洋五十三元三角九分五厘

一、收孫家拐堤工處劉鎮寰繳二十年工欵洋二百九十四元八角四分三厘

一、收嘉魚蕭家洲堤工專員曾祥俊繳十八年工欵餘欵洋七十四元二角九分五厘

一、收嘉蒲咸武堤工專員張曙辰繳十九年工欵餘欵洋三百元正

一、收孫家拐堤工處長劉鎮寰繳二十年工欵餘欵洋六百另八元四角四分三厘

一、收前漢川馬鞍山採石主任陳建勳繳蠻石料欵餘欵洋七十五元一角四分六厘

一、收前陽夏採石處主任夏赤臣繳蠻石料欵餘款洋三百二十二元正

一、收前沔川堤工處長伍正林繳代扣漢川馬鞍山採石處料欵洋四百五十三元九角三分

一、收前潛江孫家拐堤工處長王兆虎繳二十年工欵洋四十五元九角三分

一、收車灣堤工處長楊聲溢繳二十年防汛費剔除洋二十三洋八角正

一、收張公堤工程處長劉亮丞繳二十一年工欵餘欵洋三角二分七釐

一、收武嘉沔堤工處長伍正林繳透支工欵洋二十二元七角六分八厘

(丙)收前水利堤工兩局出差人員繳還預支旅費餘欵洋二百九十一元七角七分九厘

一、收楊聲溢繳還預支旅費尾欵洋一十一元四角

一、收彭逸騫繳還預支旅費尾欵洋七角

一、收萬煜斌繳還預支旅費尾欵洋一元四角五分

一、收陳億龍繳還預支旅費尾款洋一角

一、收譚佩蓀繳還預支旅費尾欵洋一元二角

一、收袁繩武繳還預支旅費尾欵洋五元六角三分

一、收左叔平繳還預支旅費尾欵洋一元八角正

一、收劉萬選吳煥章繳還預支旅費尾欵洋二十三元七角五分

一、收張岳鍾繳還預支旅費餘欵洋一十一元一角八分

一、收彭逸騫繳還預支旅費餘欵洋六元八角

一、收公安堤工處長易燊扣繳張鵬心借支一部洋七十一元四角二分九厘

一、收周衆懷繳還預支旅費餘欵洋三元二角

一、收游學博羅錦繳還預支旅費餘欵洋一元六角

一、收孫衛伯趙敢繳還預支旅費餘欵洋一角六分

一、收譚佩蓀繳預支旅費餘款洋一十五元正

一、收楊受慶程屏藩繳預支旅費餘款洋六十五元二角三分

一、收王兆虎繳預支旅費餘欵洋八元九角正

一、收過錫祺繳預支旅費餘款洋二十三元四角五分

一、收潘晦根繳預支旅費餘欵洋三十八元八角正

(丁)收各處繳解其他雜款洋一千三百二十元另一角七分

一、收荆門馬良山採石處存款利息洋四十八元六角七分

一、收前堤委會會計王世綱繳漏收堤捐洋九元正

一、收前堤委會會計王禹九繳漏收堤捐洋六元五角

一、收襄陽萬太生破產分配金洋二百五十六元正

一、收張公堤工程處長劉亮丞繳罰款洋一千元正

(戊)收湖北堤工專欵保管委員會撥「補發前湖北水利堤工兩局所屬各機關欠領各費」洋八萬三千另二十四元八角一分

一、收補發前水利堤工兩局所屬各機關各委員欠領各費洋二萬一千二百九十二元八角八分　全國經濟委員會第七十七號准單

一、收續發二十年以前湖北水利局所屬各機關各人員欠領各費洋八千五百二十七元八角　全國經濟委員會第一二七號准單

一、收補發二十一年份湖北各堤工機關欠領尾款洋五萬二千九百六十四元一角三分　全國經濟委員會第一三二號准單

一、收補發前天潛堤工程處二十年六月份會計專員處用經費洋二百四十元正　全國經濟委員會第一五六號准單

(已)收湖北堤工專欵保管委員會撥發「本會各項經臨費」洋三萬四千六百另九圓五角

一、收本會開辦費三百元正　　全國經濟委員會第二號准單
一、收本會二十一年十二月份經常費三千另六十五元正　　全國經濟委員會第三號准單
一、收本會二十二年一月份經常費三千另六十五元正　　全國經濟委員會第四號准單
一、收本會驗收二十一年堤防工程臨時費七千四百五十六元正　　全國經濟委員會第五號准單
一、收本會二十二年二月份經常費三千零六十五元正　　全國經濟委員會第三十號准單
一、收本會驗收存石委員旅費臨時費三百四十六元正　　全國經濟委員會第三十六號准單
一、收本會二十二年三月份經常費三千零六十五元正　　全國經濟委員會第四十號准單
一、收本會二十二年四月份經常費三千零六十五元正　　全國經濟委員會第七十號准單
一、收本會廣告臨時費五百二十元正　　全國經濟委員會第七十八號准單
一、收本會二十二年五月份經常費三千零六十五元正　　全國經濟委員會第九十四號准單
一、收本會二十二年六月份經常費三千零六十五元正　　全國經濟委員會第一三〇號准單
一、收本會辦理結束及印刷報告臨時費四千五百三十二元五角　　全國經濟委員會第一五五號准單

以上新收共計洋一十三萬二千一百三十二元一角七分三厘

三開除

(甲)支前湖北水利堤工機關人員欠領各費洋七萬六千四百六十二元九角八分六厘

一、支補發前湖北水利堤工兩局所屬各機關各委員欠領各費洋一萬七千八百四十一元六角四分一厘
奉總部秘鄂財字第五四一號指令准予存轉在卷

一、支續發二十年以前湖北水利局所屬各機關及人員欠領各費洋八千零三十四元三角五分五厘
奉總部秘鄂財字第七八〇號指令准予存轉在卷

一、支補發二十一年份湖北各堤工機關欠領尾欵洋五萬零三百四十六元九角九分
奉總部秘鄂財字第八四四號指令准予存轉在卷

一、支補發前天潛堤工程處二十年六月份會計專員處用經費洋二百四十元正
奉總部秘鄂財字第九六〇號指令准予存轉在卷

(乙)繳解湖北堤工專欵保管委員會各處繳還餘欵洋一萬四千四百九十七元八角六分三厘

一、第一次解洋一千二百四十二元五角四分　中央銀行銀字第六號收據

一、第二次解洋四百三十七元八角　中央銀行銀字第九號收據

一、第三次解洋六百五十七元五角八分　中央銀行銀字第十三號收據

一、第四次解洋一千五百一十二元六角八分　中央銀行銀字第二十三號收據
一、第五次解洋一百四十陸元五角三分　中央銀行銀字第五十八號收據
一、第六次解洋八百四十四元八角三分一厘（一厘捨去）　中央銀行銀字第七十七號收據
一、第七次解洋五百二十八元四角二分三厘（三釐捨去）　中央銀行銀字第八十六號收據
一、第八次解洋一千五百八十五元五角九分七厘（包作六角）　中央銀行銀字第九十八號收據
一、第九次解洋三百零二元八角一分八厘（包作二分）　中央銀行銀字第一一一號收據
一、第十次解洋三千零零二元八角五分二厘（二厘捨去）　中央銀行銀字第一二七號收據
一、第十一次解洋四千二百三十陸元二角一分二釐（二釐捨去）　中央銀行銀字第一六二號收據

（丙）支本會各項經臨費洋二萬二千七百三十三元一角六分

一、支本會開辦費二百九十八元九角四分　奉總部秘處財字第一六三號訓令准予核銷
一、支本會二十一年十二月經常費七百六十五元七角五分　奉總部秘處財字第一六五號訓令准予核銷在卷
一、支本會二十二年一月份經常費二千六百二十三元五角七分　奉總部秘鄂財字第四九五號訓令准予核銷在卷
一、支本會二十二年二月份經常費二千四百五十九元三角七分　奉總部秘處財字第二九〇號訓令准予核銷在卷
一、支本會驗收存石委員旅費臨時費二百四十四元零六分　奉總部秘處財字第二四三號訓令准予核銷在卷
一、支本會二十二年三月份經常費二千五百九十七元五角二分　奉總部秘鄂財字第九二三號訓令准予核銷在卷
一、支本會二十二年四月份經常費二千七百零二元二角七分　奉總部秘鄂財字第九六八號訓令准予核銷在卷

一、支本會一十二年五月份經常費二千八百一十二元四角六分　奉總部秘財鄂字第一二七一號訓令准予核銷在卷

一、支本會廣告臨時費二百二十三元七角一分　奉總部秘財鄂字第一三九六號訓令准予存轉在卷

一、支本會驗收二十一年堤防工程臨時費五千八百六十七元三角六分奉總部秘財鄂字第一三一三號指令准予存轉在卷

一、支本會二十二年六月份經常費二千一百一十四元三角五分　奉總部秘財鄂字第一二九八號指令准予存轉在卷

(丁)繳解湖北隄工專欵保管委員會補發以前各隄工機關人員欠領各費結餘洋六千五百六十一元八角二分四厘

一、繳解補發前湖北水利堤工兩局所屬各機關欠領各費結餘洋三千四百五十一元二角三分九厘　中央銀行銀字第一五九號收據

一、繳解續發二十年以前湖北水利局所屬各機關及人員欠領各費結餘洋四百九十三元四角四分五厘　中央銀行銀字第一六〇號收據

一、繳二十一年份湖北各堤工機關欠領尾欵結餘洋二千六百一十七元一角四分　中央銀行銀字第一六一號收據

(戊)繳解湖北隄工專欵保管委員會本會各項經費結餘洋七千三百四十三元八角四分

一、繳還本會開辦費結存洋一元零六分　中央銀行銀字第一二四號收據

一、繳還本會二十一年十二月份經常費結存洋二千二百九十九元二角五分　中央銀行銀字第二六號收據

一、繳還本會二十二年一月份經常費結存洋四百四十一元四角三分　中央銀行銀字第四七號收據

一、繳還本會二十二年二月份經常費結存洋六百零五元六角三分　中央銀行銀字第八七號收據
一、繳還本會驗收存石委員旅費臨時費結存洋一百零一元九角四分　中央銀行銀字第六二九號收據
一、繳還本會二十二年三月份經常費結存洋四百六十七元四角八分　中央銀行銀字第一一九號收據
一、繳還本會二十二年四月份經常費結存洋三百六十二元七角三分　中央銀行銀字第一二三號收據
一、繳還本會二十二年五月份經常費結存洋二百五十二元五角四分　中央銀行銀字第一五六號收據
一、繳還本會廣告臨時費結存洋二百七十二元四角九分　中央銀行銀字第一八二號收據
一、繳還本會驗收二十一年堤防工程臨時費結存洋一千五百八十八元六角四分　中央銀行銀字第一七一號收據
一、繳還本會二十二年六月份經常費結存洋九百五十元零六角五分　中央銀行銀字第一六七號收據

以上開除共洋一十二萬七千五百九十九元六角七分三厘

四實在

存洋四千五百三十二元五角

說　明

(一)實在項下存洋四千五百三十二元五角係奉核准呈辦理結束及印刷報告臨時費之預算數應俟本報告書印刷完畢結算清楚後再行編造計算專案呈報

(二)本會經常臨時各費向存附近大陸銀行年息三厘六月底共結算利息洋一百三十六元一角九分已另案解繳中央漢行列收湖北堤工專款賬掣取銀字第二三七號收據

(三)奉　總司令部訓令由經理處撥洋三千元作校對及郵之用已另案編呈計算因非堤工專款故未列入本寄案

呈總司令部文

（呈報遵令清理湖北水利隄工積案暨歷年隄欵收支情形繕具總報告書表賫請鑒核示遵由）

呈爲呈報遵令清理湖北水利隄工積案暨曆年隄工經費收支情形繕具報告書表賫請鑒核備案事案查上年十二月間奉

鈞部秘字第六三八號訓令開查湖北水利局隄工局及湖北隄工經費管理委員會應一併裁撤所有水利隄工兩局辦理之各項隄防工程一併移交全國經濟委員會所屬江漢工程局接管其原有隄工經費照舊征收另組隄工專欵保管委員會保管關於裁撤局會一切積案及各案糾紛由本部組織湖北水利隄工事務清理委員會從事清理幷經本部訂定湖北隄工專欵保管委員會章程及湖北水利隄工事務清理委員會章程分別函令全國輕濟委員會湖北省政府查照遵行各在案茲派張難先朱玖瑩李書城吳國楨席德柄爲北水利隄工事務清理委員會委員並指定張難先爲主任委員朱玖瑩爲副主任委員檢發湖北水利隄工事務清理委員會章程及任命狀分令遵照切實負責辦理此令正遵辦間旋奉

鈞令以張難先辭職照准改任李書城爲主任委員並加派王金職程文勳爲委員各等因奉此書城玖

瑩等遵即照章積極籌備愼選職員請發關防於上年十二月廿三日組織成立將清理事務分爲隄欵隄工水利三部分督率在事各員同時清理分工合作兼程並進祇以驗收廿一年新修各隄工程需時過久事實上未能照原定三個月限期辦理竣事嗣經兩次呈奉　令准展期三個月茲已清理完畢謹將清理經過情形分別隄欵隄工水利三項報告於左

（一）清理隄欵情形　查湖北隄工捐欵以湖北隄工經費保管委員會爲出納機關而水利隄工兩局爲其用款機關故本會清理隄欵應以局會之帳簿爲依據惟前隄委會在廿年四月以前所用帳簿均係舊式並無一定規程科目不一貨幣複雜而兩局歷任交接又僅憑交册盤算並不移交帳簿欵目亦不盡一致清查統計諸多障礙至局會歷年收支各欵就帳據案卷查核雖均無甚出入惟間有付出惜欵及廢鈔債票漏未登記或倒欵作現移交或應收應支之欵未予轉帳以及誤算或欠交尾數等情以致前後任收支數目彼此不相銜接茲特另立簡單帳簿厘訂科目並將遺漏訛誤各欵逐一查明提會核定後分別補列或更正其有因兌換手續未辦致移交之欵與應存貨幣種類不敷者亦經以兌換補行收付又有過領未解及欠領未發可以抵撥者補行轉帳經茲整理庶幾科目分明前後銜貫不難通盤結算矣綜計自十六年四月前湖北隄工經費保管委員會成立之日起至廿一年十一月底裁撤之日止共收隄工附捐洋一千七百四十萬另三千五百另四元七角五分三厘外收補助費雜項各欵洋二百三十萬另一千一百七十四元七角另六厘兩

共收洋一千九百七十萬另四千六百七十九元四角五分九厘支出項下計保管征收經費洋四十六萬另八百一十二元九角九分二厘水利隄工兩局事業經費洋一千二百七十九萬五千八百八十七元二角九分六厘水利隄工兩局行政經費洋一百另四萬一千七百五十五元二角一分三厘四項共計支洋一千四百二十九萬八千四百五十五元五角另一厘連同前湖北隄工經費管理委員會結存移交並本會追收轉解隄工專欵保管委員會接收洋八十萬另九千三百七十八元另一分八厘（內有洋例川洋均折爲現洋支存合計僅得洋一千五百一十萬另七千八百三十三元五角一分九厘較隄捐收入計尚不敷洋四百五十九萬六千八百四十五元九角四分即爲歷年湖北各機關挪借未還及中央漢行川江龍公司等處倒欵並公償票等項合計總數已分別呈請

鈞部核示及函送隄工專欵保管委員會照案催償在卷再前隄委會對於隄捐僅負保管之責並無稽核之權是以各代征機關每視隄欵爲無足輕重收數既不按時報告捐欵又復任意虧挪不獨征獲數目無憑攷稽即經征人員姓名亦多無案可查勾稽清算極感困難茲經澈底清厘歷年各機關虧挪隄捐有案可稽者除川江龍倒欵案已提歸

鈞部軍法處核辦外其餘各案計因公挪移者一百六十餘起計洋六十二萬餘元私人虧蝕者七十四起計洋七十三萬餘元兩共洋一百三十餘萬均不在上項隄捐收數之內業經酌量案情擬

具辦法呈准分別通緝或追繳此清理歷年隄欵收支之大概情形也

(二)清理隄工情形　查前水利局成立六載歷屆施工情形雖各不同其辦法大率每年均係分段設處委員承辦工竣撤銷再由局派員分段同時驗收報局審查轉呈鄂省府核定工欵數目後轉飭造報費局轉審全案方能完結展轉稽延故一案之結束動輒經年倘或工竣後水漲被淹或匪擾阻滯未能如期驗收便須延至翌年方能辦理設不幸工程因水淹而損壞證據因匪擾而銷滅則全案遂無法解決前水利局懸案之多實以此爲最大原因加以逐年積壓從未整理遂致糾紛迭出疑竇叢生棼亂如麻莫可究詰如是有一人聯任數屆或一屆並任兩處職務致案件牽連糾葛不清者有經手事件未完即擅自遠離或人已病故致案不能結欵無從追者至浮報冒領捲欵潛逃之案歷年既久証據散佚虛實不明通緝未獲尤爲不易解決他若報銷超過預算支欵未經呈准以及欵目不清手續未完之件更不一而足凡茲種種均非倉卒所能了結茲經本會按年分處逐一澈查詳審案情依據法令持平處理毋枉毋縱凡情節簡單並無何項疑竇者即由本會逕予處分彙案列表呈核次要之件依法擬具辦法提會決定後仍彙呈

鈞部查核備案其有案關重大情形繁復或事實平反變更定案者隨時專案呈請

鈞部核示遵行綜計前水利局六年來設立工程防汛採石等處共二百七十五處領支各欵共計一千二百一十四萬二千三百四十二元七角三分六厘七毫經前水利隄工兩局審核計算轉送

核銷者一百另三處計洋三百五十萬另一千三百六十七元四角七分三厘二毫由本會清理完結者廿年以前舊案八十三處核銷洋四百三十八萬八千五百四十九元六角五分五厘五毫廿一年新工各案四十五處核銷洋一百四十一萬七千另一十二元五角七分其專案呈請通緝或追繳及移案繼續辦理各案四十四處共支洋二百七十萬另六千九百三十三元八角二分內核准洋二百二十九萬二千另三十二元九角六分四厘（漢市府防水費三七・五四八元一九水利局防水費三三一・六七七元四九五係提由　鈞部黨政委員會監察處與軍法處核定者均在內）未核准洋二十萬另九千八百八十九元另九分九厘應繳還洋二十萬另五千另十一元七角五分七厘以上核銷核准及未核准與應繳還各欵共洋一千二百另一萬三千八百六十三元五角一分八厘七毫蠻石透支洋在外再查各隄所用蠻石均係按年招商包辦派員督採運往各工程處應用間有由各工程處直接招商包採者其山價運費照章有應由採石處預付者有應由工程處發給者但必須用石各堤工程驗收核准用石數量確定後方能與各包工結清帳欵前水利局對於各包工帳欵多未清結以致期限之混淆處所之牽扯數量與價格之爭執前後任與上下屆之套搭種種糾葛清理維艱茲經分別公司逐案清厘通盤結算計前水利局歷年支用蠻石價洋九十萬元有零各採石處支用石欵應轉入各工程處支付列報者均經照數收付轉帳至各採石公司透支石欵經清查確定共一十二萬八千四百七十九元二角一分八厘（內協昌公

司透支洋三萬二千餘元奉令核銷）現有存石可以抵扣者計洋九萬四千三百另一元一角六分六厘此外各工程處直交接招包之採石公司透支洋一萬七千七百五十二元二角八分七厘均有存石可抵已一併移交江漢工程局陸續照案扣償此清理歷年堤工積案之大概情形也

（三）清理水利工程情形　前水利局開辦伊始專以修堤爲事對於水利工程如地形測量水文測量等業務概未計及迨十八年三月水利工程處成立組設測量流量等隊分途勘測是爲辦理水利工程之始然以事屬草創策劃未盡周詳客卿主持情形不無隔閡兼之時僅半載遂致成績未彰同年九月改六流量站爲水文總站增設分站二十八處負測量水文之責設測量隊三分漢黃荆河襄河東荆河四路從事地形測量限期縮短組織擴大計劃較爲周密十九年七月調第二測量隊專測各路幹堤負臨時勘估之責至翌年四月僅成漢黃一路又將原設三隊併改爲長江襄河兩常年勘測隊所有地形水文勘估等測量事務悉屬之以固定人員作長時間往復之查勘事權統一責任分明辦法已臻安善果能循序漸進本不難依限完成乃因當時匪患頻仍軍事滋擾各站隊迭遭擄掠輕則損失公物重且喪失生命干戈掃地風鶴頻驚致令在事人員未能安心供職時作時輟良法莫由推行全功未能告竣是誠事之無可如何固未可盡責諸人謀之未臧也茲將歷年水利測量各案分別經費成績兩項清理完竣計水利工程處支洋一十八萬九千六百二十六元四角三分第一期測量地形支洋一萬七千七百四十四元六角七分八厘各縣雨量員薪俸

支洋九千七百二十五元各測量隊水文站勘測隊共支洋四十六萬一千二百九十八元五角七分四厘合計支洋陸十七萬八千三百九十四元六角八分二厘以言成績則(一)地形測量原定二十個月竣工者僅完成原計劃五分之三而歷時已及十分之七八(二)幹堤測量五個月限期已滿而測畢者僅漢黃一路(三)水文測量則以匪共滋擾未能按日觀測致報告圖表殘缺不完此清理歷年水利測量之大概情形也

再查前水利堤工兩局及建設廳歷任經支各項雜欵各驗收勘估調查等委員旅費各堤工處結束津貼各縣雨量員薪俸及一切雜支等欵雖均呈准有案但當時因單據未齊或飭查未復以及欠欵待追尾數未發等種種原因以致未能造報歷任展轉遞交懸擱至今茲經本會根據原案分欵清查賡續核辦欠欵則限期清繳尾數則請欵核發手續不完或行查未復者嚴令照章補具遵令呈復雷厲風行限期從事除委員旅費一項內有少數案件因事勢上之障礙未能依限辦結外其餘各案均已一律辦理完結並經分別錄案呈奉

鈞部令准核銷在卷此本會清理兩局歷任經支各項雜欵之情形也要之湖北自有堤工經費以來歷時六載收支數目迄未依照會計法詳列科目正式公布蓋迄未依照會計法分項製表按年公布蓋事前既無完全預算以爲根據事後又不辦理決算藉資考核隨意支銷絕少計劃任情挪借漫無限制以致亂如棼絲莫可究詰個中底蘊匪特局外人莫由洞悉即當局者恐亦不易得其要領本會奉命清理

事繁任重時懼弗勝所幸半載以來仰承
鈞部之指導下賴同寮之臂助同心協力黽勉從公矢愼矢勤差免隕越謹將清理所得分別堤欵堤工水利三欵以年爲經以事爲緯編製報告書表繪圖貼說藉明眞相並附陳改革堤政意見以備採擇庶幾歷年堤工經費收支之情形工程進行之概況與夫利弊得失之所在均不難按圖以索瞭如指掌而於鄂省將來堤政之進行或亦不無裨補除將上項書表印刷千份以便公布外理合先行繕具全份備文呈賞
鈞部鑒核備案幷祈指令祇遵謹呈
豫鄂皖三省剿匪總司令部

計呈賞

(一)清理湖北歷年收支堤欵報告一册附(甲)公虧私虧堤捐册各一本(乙)堤工經費委員會各任收支對照總表一份(丙)堤工經費各年度收支對照總表一份(丁)水利堤工兩局各局任內收支對照總表一份(戊)水利堤工兩局各年度收支堤欵對照總表一份(己)湖北堤欵收入總表一張(庚)湖北堤欵收支總表一張(辛)湖北堤欵收支對照總表一張

(二)清理前水利局歷年堤防工程報告一册附(甲)本會清結堤工懸案報告表一百二十八份(乙)清理未結懸案報告表四十四份(丙)前水利堤工兩局辦結各案清理報告表一百另

三份(丁)清理歷年蠻石糾紛報告附採石處蠻石表五份

(三)清理湖北水利事務報告一冊附表五張測量隊水文站報告表十二份

(四)改良堤工意見書一冊

(五)清理之起緣及經過文一篇

主任委員李書城

副主任委員朱玖瑩

豫鄂皖三省剿匪總司令部指令（秘財鄂字第一四八〇號）

令湖北水利堤工事務清理委員會

呈一件呈報遵令清理湖北水利堤工積案暨歷年堤欵收支情形繕具總報告書表賫呈鑒核示遵由

呈件均悉察閱所陳改良堤工意見書暨清理之緣起及經過等各冊表均甚周密詳盡堤工辦法應即按照所陳意見實施此次清理堤工積案具見該委員等辦理得力殊堪嘉許應予明令嘉獎除抄發原意見書分令全國經濟委員會工程處江漢工程局及湖北省政府遵照辦理外仰即知照此令附件存轉



全國經濟委員會湖北堤工專欵收支對照總表

自民國21年12月5日起至22年6月30日止

收項	金額 小計	金額 合計	金額 總計
收入之部			
I關稅附加捐款			
1.江漢關		423,893 600	
2.宜昌關		14,300 360	
3.沙市關		22,506 860	
4.長沙關		61,840 590	
5.岳州關		18,583 330	541,124 740
II特稅附加捐欵			1,040,481 150
III田賦附加捐款			26,263 050
IV其他收入欵			
1.接收移交欵			
(1)現洋	136,457 940		
(2)洋例　照市價折合現洋	377,707 470		
(3)申鈔　仝　上	90,531 470		
(4)川洋　仝　上	112,982 040	717,678 920	
2.借款繳還			
(1)財政廳	100,000 000		
(2)雷大同	200 000	100,200 000	
3.前湖北各機關繳還餘款			
(1)前各海關堤捐征收處捐欵繳還	8,673 150		
(2)前駐宜特稅堤捐征收處捐欵繳還	605 000		
(3)前鍾祥船捐征收處捐欵繳還	2,990 380		
(4)前澤口分所被匪損失餘欵繳還	60 950		
(5)前湖北水利堤工各機關餘款繳還	12,328 470	24,657 950	
4.本年經費結餘繳還			
(1)湖北水利堤工事務清理委員會經費結餘	4,279 520		
(2)湖北堤工專欵保管委員會經費結餘	1,338 840	5,618 360	
5.房租		220 000	
6.債券本息			
(1)編遣庫券	32,847 300		
(2)金融長期公債	2,990 440		
(3)湖北省善後公債	4 400	35,842 140	
7.利息			
(1)漢口中央銀行	14,187 400		
(2)湖北省銀行	1,930 620		
(3)宜昌聚興誠銀行	1,016 670	17,134 690	901,352 060
收項總計			2,509,221 000

付項	金額 小計	金額 合計
支出之部		
I工程用欵		
1.江漢工程局土石工欵		830,00
2.金水建閘工程欵		74,30
II經費用欵		
1.清理委員會經費		30,07
2.堤工專欵保管委員會經費		8,98
3.江漢工程局經費		155,02
4.鄂省測量經費		12,67
5.解款匯費		36
6.銀行酬勞費		2,41
7.補發以前各機關欠領各欵		
(1)清理委員會具領轉發各欵	82,784 810	
(2)前湖北堤工經費管理委員會經費	5,999 500	
(3)前湖北水利局經費	1,740 000	
(4)各縣雨量觀測費	1,510 000	
(5)襄陽老龍堤工巡費	180 000	92,21
III防汛費		
IV補助及撥借欵		
1.補助欵		
(1)荆江堤工局補助費	60,000 000	
(2)石首縣九十兩區幹堤補助費	30,000 000	
(3)湘鄂湖江水文測量補助費	3,375 000	
(4)鍾祥護城堤歲修補助費	100 000	
(5)鍾祥公安局補助費	100 000	
(6)第七中學補助費	700 000	94,27
2.湖北東荆河修堤撥借欵		100,0
V結存，存中央銀行		
付項總計		

說明　1.本會接收以後關於原有現洋洋例申鈔川洋四種幣別改爲現洋一種原有洋例申鈔川洋三種收存各款一律照市價升折現洋存儲中央銀行

2.本會所列收入各款係以中央銀行解款報告及各機關抵解報告送達本會爲根據所列支出各款係以本會簽發各項用款及各機關坐支報告送達本會爲根據

全國經濟委員會湖北堤工專欵收支對照總表

自民國21年12月5日起至22年6月30日止

項	金額 小計	金額 合計	金額 總計
部			
		423,893 600	
		14,300 360	
		22,506 860	
		61,840 590	
		18,583 330	541,124 740
			1,040,481 150
			26,263 050
	136,457 940		
	377,707 470		
	90,531 470		
	112,982 040	717,678 920	
	100,000 000		
	200 000	100,200 000	
繳還	8,673 150		
欵繳還	605 000		
還	2,990 380		
繳還	60 950		
款繳還	12,328 470	24,657 950	
員會經費結餘	4,279 520		
經費結餘	1,338 840	5,618 360	
		220 000	
	32,847 300		
	2,990 440		
	4 400	35,842 140	
	14,187 400		
	1,930 620		
	1,016 670	17,134 690	901,352 060
計			2,509,221 000

付項	金額 小計	金額 合計	金額 總計
支出之部			
I工程用欵			
1.江漢工程局土石工欵		830,000 000	
2.金水建閘工程欵		74,300 000	904,300 000
II經費用欵			
1.清理委員會經費		30,077 000	
2.堤工專欵保管委員會經費		8,980 000	
3.江漢工程局經費		155,026 310	
4.鄂省測量經費		12,676 000	
5.解款匯費		362 960	
6.銀行酬勞費		2,416 070	
7.補發以前各機關欠領各欵			
(1)清理委員會具領轉發各欵	82,784 810		
(2)前湖北堤工經費管理委員會經費	5,999 500		
(3)前湖北水利局經費	1,740 000		
(4)各縣雨量觀測費	1,510 000		
(5)襄陽老龍堤工巡費	180 000	92,214 310	301,752 650
III防汛費			180,000 000
IV補助及撥借欵			
1.補助欵			
(1)荆江堤工局補助費	60,000 000		
(2)石首縣九十兩區幹堤補助費	30,000 000		
(3)湘鄂湖江水文測量補助費	3,375 000		
(4)鍾祥護城堤歲修補助費	100 000		
(5)鍾祥公安局補助費	100 000		
(6)第七中學補助費	700 000	94,275 000	
2.湖北東荆河修堤撥借欵		100,000 000	194,275 000
V結存，存中央銀行			928,893 350
付項總計			2,509,221 000

洋例申鈔川洋四種幣別改爲現洋一種原有洋例申鈔川洋三種收存各欵一律照市價升折現洋存儲中央銀行

銀行解欵報告及各機關抵解報告送達本會爲根據所列支出各欵係以本會簽發各項用欵及各機關坐支報告送達本會爲根據

全國經濟委員會湖北堤工專款保管委員會

收支對照表

中華民國二十二年自七月起至九月底止

收入	科目	支出
	（收入之部）	
928,893 35	上年度結存轉入數	
19,362 00	上年度結轉暫支數	
271,049 67	關稅附加捐款	
197,301 04	特稅附加捐款	
14,520 02	田賦附加捐款	
14,154 62	經費餘款	
22,585 12	其他收入款	
12,137 88	補收以前欠解各款	
	（支出之部）	
	工程費	80,000 00
	防汛費	80,000 00
	金水建閘款	69,000 00
	本會經臨費	4,526 06
	湘鄂湖江測量經費	2,025 00
	鄂省合作測量經費	19,014 00
	金水建閘辦事處經費	7,430 00
	補發以前欠領各費	1,567 58
	湖北水利堤工事務清理委會經費	4,532 50
	收款手續費	1,490 79
	解款匯費	193 22
	江漢工程局暫支經費	19,362 00
	江漢工程局及其所屬機關經費	36,662 00
	退還稅款	491 67
	定期存款	500,000 00
	結存	653,708 94
	（附註）結存數應併定期存款五十萬元計算截至九月底止實共存洋一百一十五萬三千七百零八元九角四分	
1,480,003 70	總計	148,000 370

全國經濟委員會工程處
江漢工程局
二十二年度江漢幹堤土工工價一覽表

所別	施工地點	起訖地點	里程	核定土方總數	核定單價	核定總價	承包公司	承包單價	承包總價	預備費	開工日期	預定完工日期	招標或招包	備註
第一工務所	王口堤	漢江市平葉家灣	16300	3977.91	0.75	2983.43	成城公司 楊春山	0.57	2267.41	716.02	三月一日	四月三十日	招標	
	成墓堤	全堤	8750	2676.04	0.70	1873.23	協泰公司 劉紹先	0.55	1471.82	401.41	三月二日	四月三十日	招標	
	華家屯堤	全堤	4455	4350.38	0.70	3045.27	協和公司 劉國恩	0.56	2436.21	609.06	三月二日	四月三十日	招標	
	港鄉堤	全堤		3836.40	0.70	2685.48	協盛公司 梅開玉	0.56	2148.38	537.10	三月十三日	四月十日	招包	
	鼎豐堤	全堤	9000	2051.38	0.70	1435.97	協記公司 劉國恩	0.55	1100.76	300.21	三月二日	四月二十日	招標	
	茅山堤			21927.38	0.85	18638.27	協成公司 梅開玉	0.55	12297.33	6340.94	三月十三日	四月廿五日	招包	
	抱鶴尾			1070.74	1.00	1070.74	協盛公司 梅開玉	0.70	749.52	321.22	三月十三日	四月廿五日	招包	
	合計			39840.23		31697.59			22471.43	9225.96				
第二工務所	張北湖堤	全堤	0.980	4336.90	0.70	3035.83	漢豐公司 傅慶堂	0.64	2775.62	260.21	三月廿五日	四月三十日	招標	
	樊口堤	全堤	16.935	4647.92	0.70	3253.54	鼎豐公司	0.64	2974.67	278.87	三月十六日	四月三十日	招包	
	新港湖堤		6.220	12225.60	0.70	8557.92	漢豐公司 馬立明	0.64	7824.38	733.54	三月廿五日	四月三十日	招標	
	茅草湖堤	全堤	3.364	4854.47	0.70	3398.13	協成公司	0.61	3106.86	291.27	三月廿九日	四月三十日	招包	
	堵龍堤 洪家洵	潰口內都	0.160	1340.06	1.00	1340.06	汪銘根	0.75	1005.05	335.01	四月廿九日	五月廿一日	招包	
		填脚沙	0.060	129.60	0.50	64.80	汪銘根	0.50	64.80	0.00	四月廿九日	五月廿一日	招包	
	顧家小灣	潰口內都	0.100	298.08	0.90	268.27	汪銘根	0.75	222.56	44.71	四月廿九日	五月廿一日	招包	
		填脚沙	0.010	54.00	0.50	27.00	汪銘根	0.50	27.00	0.00	四月廿九日	五月廿一日	招包	
	李家小灣	潰口內都	0.060	294.03	0.90	264.63	汪銘根	0.75	220.52	44.11	四月廿九日	五月廿一日	招包	
	蕭家墩	培土包沙	0.300	1020.60	0.85	867.51	汪銘根	0.75	765.45	102.06	四月廿九日	五月廿一日	招包	
	上挖口	潰口內都	0.260	1991.79	1.05	2091.38	汪銘根	0.75	1493.84	597.54	四月廿九日	五月廿一日	招包	
		填脚沙	0.060	121.50	0.50	60.75	汪銘根	0.50	60.75	0.00	四月廿九日	五月廿一日	招包	
	下挖口	潰口內都	0.280	1331.64	1.00	1331.64	汪銘根	0.75	998.73	332.91	四月廿九日	五月廿一日	招包	
		填脚沙	0.060	45.36	0.50	22.68	汪銘根	0.50	22.68	0.00	四月廿九日	五月廿一日	招包	
	蕭家閘	填堤坑	0.022	332.64	0.75	249.48	汪銘根	0.75	249.48	0.00	四月廿九日	五月廿一日	招包	
	堵龍堤	加高	5.000	4725.00	0.85	4016.25	汪銘根	0.75	3543.75	472.50	四月廿九日	五月廿一日	招包	
	合計			37749.19		28849.87			25357.14	3492.73				
第三工	四縣公堤	孟家閣至閻碼頭	8.105	15373.90	0.80	12299.12	鼎興公司 秦荆門	0.54	8301.91	3997.21	三月十八日	五月二十日	招標	
	四縣公堤	蒼梧嶺至蔡家店	3.000	3906.28	0.80	3125.02	鼎興公司 秦荆門	0.54	2109.39	1015.63	三月十一日	五月二十日	招標	
	金口長堤	下沙湖至上沙湖	6.835	8427.08	0.75	6320.31	復泰公司 張志軒	0.52	4382.08	1938.23	三月廿九日	五月五日	招包	
	豐樂垸堤	劉家邊至姚湖	11.620	115784.78	0.80	92627.82	天成成美四公司分	0.54	62523.78	30104.04	三月廿七日	五月二十日	招包	
	合豐江堤	姚湖至上北洲	1.000	6390.70	0.80	5112.56	集義公司 陶河清	0.44	2811.91	2300.65	三月廿七日	四月[illegible]	招標	

工務所	合豐江堤	姚湖至上北洲	1.000	6390.70	0.80	5112.56	集義公司 陶河濱	0.44	2811.91	2300.65	三月廿六日	四月三十日	招標	
	合豐垸堤	梁洲至汪家洲	18.645	30897.63	0.80	24718.10	劉炳唐	0.57	17611.65	7106.45	三月廿五日	五月廿八日	招包	
	六合垸堤	牛埠頭至梁洲	114.20	22388.70	0.80	17910.96	義記公包 姚唐唐	0.49	10970.46	6940.50	三月廿五日	五月十五日	招標	
	蝦子溝			22500.53	0.80	18000.42	胡鄭山 王書堂張志軒	0.79 0.54	4291.96 9216.61	4491.95	五月八日	五月三十一日	招包	5432.74方單價0.79 17067.79方單價0.54
	合計			225669.60		180114.31			122219.65	57894.66				
新堤臨時工務所	白楊段皇堤	白螺市至閻碼頭	9.220	21430.54	0.80	17144.43	永豐建築公司 趙懷盛	0.53	11358.19	5786.24	四月一日	五月十五日	招標	
	新葉段皇堤	主城至葉家洲	7.000	3410.81	0.80	2728.65	漢豐公司 馬立明	0.58	1978.27	750.38	三月二十日	五月十五日	招標	
	牛埠頭上段	葉牛段	2.100	5150.79	0.80	4120.63	徐元清	0.54	2781.43	1339.20	四月六日	五月二十日	招標	
	牛埠頭下段	葉牛段	1.600	4647.24	0.80	3717.79	葉世新	0.56	2602.45	1115.34	四月七日	五月二十日	招標	
	甘家碼頭至蔣家碼頭	螺新段	3.600	2823.78	0.80	2259.02	袁尙志	0.55	1553.08	705.94	四月七日	五月二十日	招標	
	蔣家碼頭至張家碼頭	螺新段	0.900	3513.20	0.80	2810.56	楊鳳山	0.66	2318.71	491.85	四月六日	五月二十日	招標	
	張家碼頭至界牌	螺新段	4.200	12178.92	0.80	9743.14	楊華陔	0.54	6576.62	3166.52	四月六日	五月二十日	招標	
	楊林鎮山至上坊	楊螺段	3.800	4196.22	0.80	3356.98	六合建築公司 常肇彬	0.49	2056.15	1300.83	四月六日	五月二十日	招標	
	荆河腦至郭家灣	荆白段	2.300	5795.95	0.80	4636.76	黃標	0.65	3767.37	869.39	四月五日	五月二十日	招標	
	合計			63147.45		50517.96			34992.27	15525.69				
第四工務所	百家灣堤	馬家嘴至涂郭巷	9.510	28345.52	0.75	21259.14	三元謙記公司分包	0.48	13605.85	7653.29	三月十九日	五月十日	招標	
	陳公東垸	黃陵山至章華港	9.400	22543.11	0.75	16907.33	集義公司 龔南浦	0.44	9918.97	6988.36	三月廿一日	五月三十一日	招標	
	上車灣	郝修老堤		3180.06	1.20	3816.07	段光明	0.90	2862.05	954.02	四月二日	五月十日	招標	
	東大垸堤	涂郭巷至藕池口		61197.19	0.75	45845.39	郭華堂	0.58	35453.77	10390.62	四月三日	五月三十一日	招包	
	朱三弓	開河工程		14509.87	0.65	10374.56	何祖珊	0.56	8125.53	2249.03	三月十日	四月三十日	招包	在核定總價內有預備費一成
	朱三弓	郝修老堤		15858.95	0.60	9515.37	楊秉衡	0.50	7929.48	1585.89	四月三日	四月三十日	招標	
	合計			145564.70		107717.86			77895.65	29822.21				
第五工務所	長安垸堤	舵落口至余家墩	0.400	1374.37	0.90	1236.93	瑞記公司 陳春市	0.70	1962.06	274.87	三月十五日	四月十五日	招標	
	自興垸堤	慈惠墩至石家台	4.500	1177.09	0.85	1000.45	合記永興公司 閻智蘿	0.56	659.12	341.33	三月十五日	四月十五日	招標	
	大興垸堤	蕭家渡至高家台	2.800	1279.80	1.00	1279.80	羅正卿	0.56	716.69	563.11	三月十四日	四月十五日	招包	
	蔴蒲垸堤	漢川至城皇港	4.670	9751.32	0.90	8776.19	永記公司 王學彬	0.53	5168.20	3607.99	三月二日	四月廿五日	招標	
	六湖垸堤	城皇港至分水嘴	0.700	4773.03	2.00	9546.12	永順公司 崔峻山	0.53	2529.72	7016.40	三月五日	四月廿五日	招標	
	德豐垸堤	大沙嘴至蘇馬口	19.800	22487.22	0.80	17989.78	祥泰公司 劉蔭人	0.50	11243.61	6746.17	三月廿四日	五月十日	招標	
	合計			40842.77		39829.27			21279.40	18549.87				
第六工	洞庭廟		1.000	9003.69	0.80	7202.95	安裏建築公司	0.58	5222.14	1980.81	三月廿九日	五月十五日	招包	
	岳口熊家月	熊家月至雙湖垸	2.760	15005.00	0.80	12004.00	福記同濟公司分包	0.42	6301.20	5702.80	三月十九日	四月三十日	招標	
	孫家台	孫家台至周家月	7.000	17451.00	0.80	13960.80	同興公司 顏成章	0.47	8201.97	5758.83	三月十八日	五月十五日	招標	
	姚家月	開鎮口土工		800.00	0.50	400.00	周亨記	0.48	384.00	16.00	三月十九日	五月三十一日	招標	
	高家拐		1.040	30631.73	0.80	24505.38	周亨記	0.48	14703.23	9802.15	三月十九日	五月三十一日	招標	
	雷新場堤 楊家月	涂家拐至吳家灣	2.637	12937.37	0.95	12290.50	漢記公司	0.68	8797.41	3493.09	三月二十日	五月三十日	招包	
	三家灣至中興場		8.300	21574.00	0.75	16180.50	永宗公司	0.36	7766.64					

六工務所	孫家台	孫家台至周家月	7.000	17451.00	0.80	13960.80	同興公司 顏成章	0.47	8201.97	5758.83	三月十八日	五月十五日	招標		
	姚家月	開鎖口土工		800.00	0.50	400.00	周亨記	0.48	384.00	16.00	三月十九日	五月三十一日	招標		
	高家拐		1.040	30631.73	0.80	24505.38	周亨記	0.48	14703.23	9802.15	三月十九日	五月三十一日	招標		
	雷新場堤 楊家月	涂家拐至吳家灣	2.637	42937.37	0.95	12290.50	漢記公司	0.68	8797.41	3493.09	三月二十日	五月三十日	招包		
	三家灣至中興場		8.300	21574.00	0.75	16180.50	永定公司	[illegible].36	7766.64	8413.86	三月三十日	五月十五日	招包		
	五支角			72630.65	0.60	43578.39	牲記天成同益三公司分包	0.55	39946.86	3631.53	三月三十日	五月三十一日	招包		
	方家灣			79652.36 6055.14	0.80 0.40	63721.89 2422.06	同益和興漢成恆記四公司分包	0.72 0.30	57349.70 1816.54	6977.77	三月卅一日	五月三十一日	招包	原包七角後呈准添加二分	
	萬家拐	開鎖口土工		800.00	0.50	400.00	天成公司	0.42	336.00	64.00	三月三十日	五月三十一日	招包		
	岳口堤	翻修灌洞		12231.83	0.60	7339.10	安瀾晉益協記三公司分包	0.58	7094.46	244.64	四月十五日	五月三十一日	招包		
	合計			278772.77		204005.57			157920.15	46085.42					
沙洋臨時工務所 沙洋堤	官家榨		2.807	7571.75	0.75	5678.81	高中堅	0.497	3763.16	1915.65	四月四日	五月三十一日	招標		
	楊家台		1.800	5847.12	0.75	4385.34	牲記建築公司 江福珍	0.55	3215.92	1169.42	四月一日	四月三十日	招標		
	三合垸		3.160	7729.40	0.75	5797.05	耀記長記公司分包	0.43	3323.64	2473.41	四月一日	四月三十日	招標		
	田關		0.678	2417.19	0.75	1812.89	高中堅	0.497	1201.34	611.55	四月四日	五月三十一日	招標		
	茶菴	翻修浸漏	0.020	108.54	0.60	65.12	協記公司 劉仁超	0.58	62.95	2.17	五月六日	五月三十一日	招包		
	爛泥崗	翻修浸漏	0.400	3758.40	0.60	2255.04	協記公司 劉仁超	0.57	2142.29	112.75	五月六日	五月三十一日	招包		
	熊家店	翻修浸漏	0.600	4860.00	0.60	2916.00	協記公司 劉仁超	0.60	2916.00	0.00	五月六日	五月三十一日	招包		
	棗樹灣	翻修浸漏	0.100	343.00	0.60	145.80	協記公司 劉仁超	0.55	133.65	12.15	五月六日	五月三十一日	招包		
	新城市	翻修灌洞	0.650	5116.50	0.60	3069.90	協記公司 劉仁超	0.55	2814.08	255.82	五月六日	五月三十一日	招包		
	東嶽廟	翻修灌洞	0.290	3287.52	0.60	1972.51	協記公司 劉仁超	0.55	1808.14	164.37	五月六日	五月三十一日	招包		
	東嶽廟	翻修灌洞	0.020	434.16	1.00	434.16	協記公司 劉仁超	0.55	238.79	195.37	五月六日	五月三十一日	招包		
	王家橋	翻修浸漏	0.010	104.22	1.00	104.22	協記公司 劉仁超	0.60	62.53	41.69	五月六日	五月三十一日	招包		
	亞粟樹	翻修灌洞	0.020	405.27	1.00	405.27	協記公司 劉仁超	0.60	243.16	162.11	五月六日	五月三十一日	招包		
	白花寺	翻修灌洞	0.010	121.50	1.00	121.50	協記公司 劉仁超	0.60	72.90	48.60	五月六日	五月三十一日	招包		
	合計			42004.57		29163.61			21998.55	7165.06					
補遺所	鮑家嘴	翻修灌洞		1929.82	0.90	1736.84	長記公司 顏炳卿	0.60	1157.89	578.95	六月五日		招包		
	董家拐	翻修灌洞		927.65	0.90	834.88	長記公司 顏炳卿	0.60	556.59	278.29	六月五日		招包		
	總計			876448.75		674467.56			485848.72	188618.84					

全國經濟委員會江

第一工務所

施工地點	土工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數	斷面張數
七口堤					
劉佐口		7048.66	1	1	1
中廟上 吳盛門首		244.33	1	1	2
水仙廟		210.71	1	1	1
土地徑		8327.48	2	1	2
唐林岸		2792.67	1	1	3
抱鷄尾					
絲茅徑		12884.45	1	1	1
茅山堤					
成眞堤					
新洲		5556.23	1	1	1
鼎豐堤					
華家屯堤					
道士祺 至石柱		485.12	1	1	2
風波港		1854.52	1	1	1
港鄉堤					
瓦窰街		3986.33	1		1
劉家渡		6457.18	1	1	3
總計		49847.68	12	10	18

第二工務所

施工地點	土工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數	斷面張數
挖溝上濱口		7860.55	1	1	2
挖溝下濱口		9473.62	1	1	4
蝦蟆磯		16110.46	2	1	0
堵龍堤					
巴浦		9042.19	1	1	0
樊口堤					
茅草湖堤					
張北湖堤					
新港湖堤					
武豐堤新濱口		20751.94	1	1	0
		翻淤改用板樁 6067.60	1	0	0
武金堤新月堤		22909.92	1	1	0
武泰閘挖口		11196.53	1	1	0
袁家河閘家河		11001.34	4	1	0
總計		114414.15	13	8	6

第三工務所

施工地點	土工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數	斷面張數
金口堤					
十字號堤 居字號		8175.75	1	1	1
日字號		4464.76	1	1	1
四縣公堤 孟家閣至閻羅城					
四縣公堤 蒼糖嶺至蔡家店					
邱家灣		8446.02	1	1	1
嘉魚陡山		1059.60	1	1	1
新堤角		2676.28	1	1	1
凉亭上下		4441.75	1	1	1
宏恩三磯		24176.53	2	1	3
合豐院					
樂合垸					
合豐堤					
豐樂垸					
總計		53440.69	8	7	9

新堤臨時工務所

施工地點	土工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數
茅埠		2525.78	1	1
葉家洲		183.75	1	1
新葉段皇堤				
楊螺段皇堤				
白楊段皇堤				
荆白段皇堤				
總計		2709.53	2	2

全國經濟委員會江漢工程局石工工數總表

務所			新堤臨時工務所						第四工務所						第五工		
平面	斷面		施工地點	土工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數	斷面張數	施工地點	土工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數	斷面張數	施工地點	土工（元）	石工
			[illegible]		[illegible]				[illegible]		[illegible]	2	1	3	[illegible]		
1	1		葉家洲		153.15	1	1	0	三[illegible]		[illegible]	1	0	0	白[illegible]垸堤		
1	1		新葉段皇堤						姚[illegible]		2527.20	1	1	1	大興垸堤		
			楊螺段皇堤						調[illegible]		34770.96	1	1	1	蘇浦垸堤		
			白楊段皇堤						隊公[illegible]垸堤						觀音廟		
1	1		荆白段皇堤						東大垸堤						六湖垸堤		
1	1								二[illegible]		11904.16	1	1	1	脉旺嘴		1
1	1								青[illegible]		7305.52	1	1	1	魏家灣		1
1	1								百家[illegible]						楊家口		
2	1	3							朱[illegible]						劉家潭口		3
									八[illegible]		4564.36	1	0	1	羅家台		1
															德豐垸 新垸子		
															鄭家灣		21
															禹王宮		1
															葉家灣		2
															仙桃鎮		
8	7	9	總計		2709.53	2	2	1	總[illegible]		169867.64	8	5	8	總計		15

局石工工欵總表

四工務所

工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數	斷面張數
	107485.04	2	1	2
	1310.40	1	0	0
	2527.20	1	1	1
	34770.96	1	1	1
	11904.16	1	1	1
	7305.52	1	1	1
	4564.36	1	0	1
	169867.64	8	5	8

第五工務所

施工地點	土工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數	斷面張數
長安垸堤					
自興垸堤					
大興垸堤					
蔴浦垸堤					
觀音廟		4008.04	1	1	1
六湖垸堤					
厤旺嘴		18542.04	1	1	2
魏家灣		10957.32	1	1	2
楊家口		6843.27	2	1	1
劉家潭口		349 5.59	1	1	0
羅家台		15521.62	1	1	2
德豐垸 新垸子					
鄭家灣		21453.19	3	1	3
禹王宮		11394.34	1	1	1
葉家灣		21311.22	1	1	2
仙桃鎮		9568.09	2	0	1
總計		154544.72	14	9	15

第六工務所

施工地點	土工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數	斷面張數
白沙潭		30.00			
岳口堤 熊家月至雙湖垸					
岳口堤 孫家台下至周家月					
岳〃口					
李家拐		11863.46	2	1	2
萬家拐					
方家灣					
高家拐					
歐家灣		500.00			
雷新場堤					
三家灣 至中興場					
姚家月					
洞庭廟					
總計		12393.46	2	1	2

沙洋臨時工務所

施工地點	土工（元）	石工（元）	估表張數	平面張數	斷面張數
田關					
三合垸					
楊家潭					
宮家榨					
沙洋堤					
唐心口		20944.86	3	1	3
王家營		42804.85	2	1	1
十一工		28016.75	2	1	0
三四工		10021.79	6	1	0
簡家灣		栽植臥柳 500.00			
總計		102288.25	13	4	4

江襄幹堤石工工欵總計659506.12元

上海图书馆藏书

A541 212 0014 8993B

漢口武漢印書館代印
8
1627209
