三六	今入町ヨリ愛宕町ヲ經テ赤羽橋南詰ニ至ル	一、九二〇	一三	
三七	三ノ輪町ヨリ白鬚橋西詰ニ至ル	一、六三七	一三	
三八	入谷町ヨリ山ノ宿町、淺草驛前ヲ經テ中ノ鄕業平町ニ至ル	二、八三六	一三	
三九	荒布橋東詰ヨリ思案橋ヲ經テ小網町四丁目ニ至ル	三八〇	一三	
四〇	西久保神谷町ヨリ宇田川町ニ至ル	九一〇	一三	
四一	西小川町ヨリ三崎町三丁目ヲ經テ陸軍造兵廠前ニ至ル	五八〇	一三	
四二	永田町二丁目地内	三四五	一二	
四四	壹岐殿坂下ヨリ本鄕一丁目ニ至ル	五八〇	一七	
四五	東黑門町ヨリ上野廣小路町ニ至ル 但シ本號路線ノ西側ニ於テ之ニ接續スル面積約六百五十坪ノ廣場ヲ設ク	一四五	一六	
四六	須田町ヨリ萬世橋南詰ニ至ル	一一〇	一六	
四七	木場町ヨリ辨天前河岸ニ至ル	七〇	一二	
四八	宮本町ヨリ濱松町一丁目ニ至ル	四〇二	一七	
四九	一ツ橋通町ヨリ美土代町二丁目ヲ經テ豐島町ニ至ル	一、七二三	一二	
五〇	村松町ヨリ豐島町ニ至ル	五七三	一二	
五一	湯島天神町三丁目ヨリ厩橋ヲ經テ押上町ニ至ル	三、八七〇	一二	
五二	池ノ端仲町ヨリ上野元黑門町ニ至ル 內譯 池ノ端仲町ヨリ上野元黑門町迄 上野元黑門町地内	三〇〇	一二	
五三	越中島町ヨリ濱園町ニ至ル	一、〇二五	一二	
合計		二七、一二三		

二　橋梁

合計

名稱	所在 區町名	河川名	路線番號	橋長	幅員	起工年月 竣工年月	型式
相生大橋	深川區越中島町	荒川派川	一〇	一四六・五米	一三米	一三、八 一五、一二	吊桁附鋼鈑突桁七徑間
相生小橋	京橋區新佃島西町三丁目			四五・五	一三	一三、一二 一五、一八	鋼鈑桁五徑間
永代橋	京橋區大川端町 深川區佐賀町三丁目	荒川	三	一八五・二	一三	一三、一一 一五、一二	突桁及吊桁を有する鋼鈑繋拱三徑間
清洲橋	日本橋區中洲町 深川區清住町	同	一六	一八六・六	一三	一四、三 三、三	補剛鈑桁を有する自碇吊橋
藏前橋	淺草區南元町 本所區横網町	同	一三	一七三・二	一三	一三、一 二、九	二鉸鋼鈑拱三徑間
駒形橋	淺草區駒形町 本所區竹町	同	六	一四九・一	一三	一三、七 二、六	同
言問橋	淺草區山ノ宿町 本所區新小梅町	同	三八	二三七・七	一三	一四、五 三、二	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間
淺草橋	日本橋區馬喰町四丁目 淺草區茅町一丁町	神田川	五	三五・八	三	二、一〇 五、一一	二鉸鋼鈑拱

名稱	所在 區町名	河川名	路線番號	橋長	幅員	起工年月 竣工年月	型式
湯島天神町三丁目ヨリ厩橋ヲ經テ押上町ニ至ル	越中島町ヨリ濱園町ニ至ル		五一 五二	一、〇二五	二三		
池ノ端仲町ヨリ上野元黑門町ニ至ル							
內譯 池ノ端仲町ヨリ上野元黑門町迄 上野元黑門町地內				二七、一二三			

美倉橋	神田區豐島町 同區佐久間町四丁目	同	三四	三五・八	二三	二、六 四、二	同
和泉橋	神田區岩本町 同區佐久間町一丁目	同	一	三五・七	四四	三、四 五、二	同
昌平橋	神田區淡路町二丁目 同區旅籠町二丁目	同	三五	二三・八	三〇	三、一 五、二	無鉸鐵筋混凝土拱
聖橋	神田區駿河臺東紅梅町 本郷區湯島三丁目	同	一二	九二・五	二三	一三、九 三、一一	無鉸鐵筋混凝土拱一徑間鋼鈑桁二徑間鐵筋混凝土框三徑間
水道橋	神田區三崎町二丁目 小石川區小石川町	同	一三	一七・八	二七	一五、七 三、六	鋼鐵桁(外側に鐵鋼鈑拱)
後樂橋	神田區三崎町一丁目 小石川區小石川町	同	四一	二一・〇	二三	一四、八 二、一三	二鉸鋼鐵拱
飯田橋	麴町區飯田町六丁目 牛込區下宮比町	同	一四	一八・〇	二七	三、二 四、一一	鋼鈑桁
茅場橋	日本橋區南茅場町 同區小網町三丁目	日本橋川	五	五二・一	三三	二、一一 四、七	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間
江戸橋	日本橋區江戸橋一丁目 同區本船町	同	一	六三・四	四四	一四、一 四、一	二鉸鋼鈑拱二徑間
小網橋	日本橋區小網町一丁目 同區同町二丁目	東堀留川	三九	三六・〇	二二	二、三 三、七	二鉸鋼鈑拱
親父橋	日本橋區照降町 同區新霞町	同	三三	三二・六	二二	一三、五 一四、七	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框
中ノ橋	京橋區本八丁堀三丁目 同區南八丁堀二丁目	櫻橋川	五	二八・〇	三三	三、一 四、一二	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間
新京橋	同區炭町 同區金六町	京橋川	一	三一・四	四四	三、一二 五、一	無鉸鐵筋混凝土拱
比丘尼橋	同區北紺屋町 同區銀座西一丁目	同	一九	三一・七	二七	三、五 五、二	同
高橋	同區日比谷町 同區東湊町一丁目	龜島川	一七	三二・七	二二	二、三 五、一	同　三徑間
龜島橋	同區水谷町 同區川口町	同	七	三一・二	二二	三、九 四、一二	二鉸鋼鈑拱

比丘尼橋	同區北紺屋町 同區銀座西一丁目	同	一九	三一・七	二七	三、五 五、二	同
高橋	同區日比谷町 同區東湊町一丁目	龜島川	一七	三二・七	二二	二、三 五、一	同　三徑間
龜島橋	同區水谷町 同區川口町	同	七	三一・二	二二	三、九 四、二	二鉸鋼鈑拱
靈岸橋	日本橋區南茅場町 京橋區富島町	同	三	四一・三	三三	一四、一〇 五、三	連續混凝土桁四徑間
菖蒲橋	日本橋區濱町三丁目 同區中洲町	箱崎川	二八	二八・五	二二	一三、一〇 一五、三	中央徑間鋼鈑框桁側徑間鐵筋混凝土框
東新川橋	京橋區四日市町 同區銀町二丁目	新川	一七	一八・五	二二	二、九 三、八	二鉸鐵筋混凝土拱
蓬萊橋	同區木挽町七丁目 同區汐留町一丁目	汐留川	一	三二・〇	四四	一四、二 四、五	無鉸鐵筋混凝土拱二徑間
土橋	同區銀座西八丁目 芝區二葉町	同	一九	二八・〇	二七	一四、一二 五、三	無鉸鐵筋混凝土拱
三原橋	京橋區銀座四丁目 同區木挽町四丁目	三十間堀川	四	三〇・二	三六	三、五 四、一一	連續鋼鈑桁三徑間
數寄屋橋	麴町區有樂町二丁目 京橋區銀座西五丁目	外濠	四	三九・五	三六	一四、七 四、五	無鉸鐵筋混凝土拱二徑間
八重洲橋	麴町區丸ノ內一丁目 日本橋區吳服橋三丁目	同	七	三八・〇	四四	三、一一 四、六	同　同
常盤橋	麴町區大手町二丁目 日本橋區北鞘町	同	三三	三九・〇	二七	一四、二 一五、一一	同　同
新常盤橋	麴町區大手町二丁目 日本橋區本石町二丁目	同	一一	三〇・八	二七	二、一二 四、一二	同　三徑間

鎌倉橋	神田橋	一ツ橋	雉子橋	俎橋	堀留橋	千代橋	萬年橋	彈正橋	久安橋	千代田橋	中ノ橋	小川橋
麹町區大手町二丁目 神田區鎌倉町	麹町區大手町一丁目 神田區美土代町一丁目	麹町區元衛町 神田區一ツ橋通町	麹町區竹平町 神田區一ツ橋通町	麹町區飯田町二丁目 神田區今川小路三丁目	麹町區飯田町四丁目 神田區西小川町二丁目	京橋區木挽町九丁目 同區築地四丁目	京橋區采女町 同區築地三丁目	同區本材木町三丁目 同區高代町	日本橋區江戸橋三丁目 京橋區松屋町一丁目	日本橋區江戸橋一丁目 同區坂本町	日本橋區蠣殻町三丁目 同區濱町二丁目	日本橋區浪花町 同區久松町
同	同	同	同	同	神田川	築地川	同	楓川	濱町川	同	同	同
三五	三五	三四	三四	二	一四	一五	四	一七	五	三	七	一七
三〇・二	三二・一	三〇・六	三一・九	二四・五	二五・六	二七・〇	二四・一	三二・二	一三七	三二・三	三二・〇	三二・二
二三	三三	二七	二七	四二	二七	二七	三三	二三	三三	三三	三三	二三
三、一四、四	三、一五、四	三、一〇、二	三、一二、二	二、二四、六	一四、一三、八	三、一〇、六	二、一八、一一	三、一二、一七	三、一五、五	三、一四、三	三、一二、一一	一五、一六、三
同	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框	同	二鐵鋼鈑拱	無鉸鐵筋混凝土拱	同	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框	連續鋼鈑桁	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框	鋼鈑桁	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框	無鉸鐵筋混凝土拱	同

鞍掛橋	日本橋區小傳馬町三丁目 同區馬喰町一丁目	同	一一	一三・〇	二七	一五、六 二、八	同
岩井橋	神田區元岩井町 同區江川町	同	三四	一四・二	二二	二、五 四、一	同
大和橋	同區東龍閑町 同區豐島町	同	四九 二	一五・九 一一・九	六三・二	一五、八 四、六	同
地藏橋	日本橋區本銀町四丁目 神田區美倉町	龍閑川	一	一一・〇	四四	三、二 五、一	鐵筋混凝土框
龍閑橋	日本橋區本銀町一丁目 神田區西今川町	同	一九	一〇・四	二七	一四、七 一五、三	鐵筋混凝土桁（外側鐵筋混凝土框）
市場橋	京橋區築地三丁目 同區同四丁目	築地川 東支川	五	三一・〇	三三	一四、四 一五、二	中央吊桁鋼鈑突桁三徑間
門跡橋	同區同三丁目 同區東小田原町二丁目	同　南支川	四	二四・七	二七	二、六 四、一	鐵筋混凝土框二徑間
開國橋	同區入舟町六丁目 同區築地一丁目	築地川	五	三四・三	三三	一四、八 四、一〇	中央吊桁鋼鈑突桁三徑間
金杉橋	芝區土手跡町 同區金杉一丁目	古川	一	一八・二	三六	一四、八 四、五	鐵筋混凝土桁三徑間
赤羽橋	麻布區飯倉五丁目 芝區赤羽町	同	三六	一五・七	二二	一三、一一 二、一一	鋼鈑桁
八ツ山橋	芝區高輪南町 荏原郡品川町北品川宿八ツ山	鐵道	一	四二・九	二三	四、九 五、	結構繫桁
須賀橋	淺草區須賀町 同區御藏前片町	須賀堀川	五	一一・〇	三三	一四、一〇 一五、七	鋼鈑桁
今戸橋	同區金龍山瓦町 同區今戸町	山谷堀川	三一	二四・六	二二	一三、四 一五、六	二鉸鋼鈑拱

久安橋	日本橋區江戸橋三丁目 京橋區松屋町一丁目	同	七	三三・〇	三三	三、一 五、一	無鉸鐵筋混凝土拱
千代田橋	日本橋區江戸橋一丁目 同區坂本町	同	三	三二・三	三三	一三、四 一五、三	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框
中ノ橋	日本橋區蠣殼町三丁目 同區濱町二丁目	濱町川	五	一三・七	三三	一五、五 三、五	鋼鈑桁
小川橋	日本橋區浪花町 同區久松町	同	三三	一三・五	二二	一五、五 三、	同

吉野橋	同區聖天町 同區吉野町	同	三二	一三・三	三二	一四、一〇 一五、二	鋼鈑桁						
三ノ輪橋	下谷區三ノ輪町 南千住町三ノ輪河原崎	音無川	一	四・九	二二	一五、四 一六、四	鐵筋混凝土桁						
日本堤橋	淺草區田町二丁目 同區同	新堀川	二三	一〇・〇	二三	二、一〇 三、一〇	同						
二之橋	本所區松井町二丁目 同區東兩國四丁目	竪川	一〇	二九・八	二五	五、八 四、八	二鉸鋼鈑拱						
高橋	深川區東大工町 同區東元町	小名木川	一〇	五四・五	二五	二、三 五、三	同　二徑間						
北ノ橋	同區西六間堀町 同區東六間堀町	六間堀川	二九	九・九	二七	三、六 五、三	構成工形鋼						
彌勒寺橋	同區東森下町 本所區林町一丁目	五間堀川	一〇	一四・一	二五	三、五 四、一	鋼鈑桁						
伊豫橋	深川區東森下町 同區富川町	同	二九	一〇・六	二七	三、一一 五、一三	構成工形鋼						
海邊橋	同區萬年町二丁目 同區伊勢崎町西平野町	仙臺堀川	一〇	二九・八	二五	三、七 五、三	中央吊桁附鐵筋混凝土突桁三徑間						
松島橋	南葛飾郡砂町彈正	東京運河	二八	二七・一	二六・四	二、九 三、一三	構成工形鋼三徑間						
黑船橋	深川區蛤町二丁目 同區古石場町	大島川	一〇	四三・八	三三	三、一二 五、一一	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間						
平木橋	同區木挽町 同區平久町二丁目	同	四七	二三・四	二三	四、四 四、二四	鋼鈑桁						
福島橋	同區富吉町、諸町 同區福住町、中島町	大島川 西支川	三	一七・四	三三	二三、四 四三、三四	同						

汐見橋	同區數矢町 同區入舟町	中ノ川	三	三〇・一	三三	一三、四 一三、七	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵鈑混凝土框						
船木橋	同區入舟町 同區木場町	大島川 東支川	三	二五・〇	三三	一三、四 一五、三	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間						
濱園橋	同區越中島町 同區濱園町	鹽濱川	五三	四〇・七	二二	一四、一一 一三、五	同						

汐見橋	同區數矢町 同區入舟町	中ノ川	三	三〇・一	三三	一三、四 三、七	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵鈑混凝土框
船木橋	同區入舟町 同區木場町	大島川 東支川	三	二五・〇	三三	一三、四 五、三	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間
濱園橋	同區越中島町 同區濱園町	鹽濱川	五三	四〇・七	二二	一四、一一 三、五	同
源森橋	本所區中ノ鄕瓦町 同區新小梅町	源森川	三〇	二四・四	二二	二、一 三、六	二鉸鋼鈑拱
澤海橋	深川區木場町 同區西平井町	大横川	三	二五・七	二三	一三、四 五、一	鋼鈑桁
茂森橋	同區茂森町 同區豐住町	同	七	一九・五	二二	一三、一二 四、一二	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框
扇橋	同區扇橋町一丁目 同區石島町	同	二八	四〇・八	二二	一五、一〇 四、一二	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間
菊川橋	本所區菊川町二丁目 同區柳原町三丁目	同	二九	三八・四	二二	一三、四 四、一二	同　同
江東橋	同區入江町 同區江東橋一丁目	同	二	三八・四	二七	一三、九 一五、一二	同　同
法恩寺橋	同區石原町四丁目 同區太平町一丁目	同	二二	三二・八	二二	一三、四 一四、一一	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框
横川橋	同區横川町 同區太平町一丁目	同	五一	三三・一	二二	一五、七 三、一	中央吊桁鋼鈑突桁三徑間
業平橋	同區小梅業平町 同區中ノ鄕業平町	同	六	三一・六	三三	四、一 五、二	中央吊桁附鐵筋混凝土突桁三徑間
八反目橋	同區小梅瓦町 同區小梅町	同	三八	一一・四	二二	三、八 四、八	構成二形鋼
豐砂橋	深川區豐住町 砂町砂村新田西支川	横十間川	二七	三九・〇	二二	三、一 五、二	鋼鈑桁二徑間

福島橋	同區富吉町、諸町 同區福住町、中島町	大島川 西支川	三	一七・四	三三	一三、四 四、三	同
平木橋	同區木挽町 同區平久町二丁目	同	四七	二三・四	二二	四、四 四、一二	鋼鈑桁
黒船橋	深川區蛤町二丁目 同區古石場町	大島川	一〇	四三・八	三三	三、一二 五、一	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間
木島橋	南葛飾郡砂町強正	東京運河	二八	三七・一	二六・四	二、三	構成工形鋼三徑間

岩井橋	深川區海邊町砂町永代新田	同	二八	四五・三	二三	三、一一 五、二	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框
本村橋	深川區本村町南葛飾郡大島町二丁目	同	二九	四〇・四	二三	一四、六 二、三	中央吊桁鋼鈑突桁三徑間
松代橋	本所區江東橋四丁目龜戸町押上天神川東	同	二	三九・七	二七	三、一〇 五、三	吊桁附鋼鈑突桁三徑間
天神橋	本所區柳島町龜戸町龜戸	同	二三	三〇・〇	二三	三、四 四、八	鋼鈑桁二徑間
黑龜橋	本所區黑江町同區龜住町	油堀川	二七	二五・〇	二三	一三、四 四、七	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間
富岡橋	同區門前山本町同區和倉町	同	一〇	二五・三	二七	三、一 四、一一	鋼鈑桁
大和橋	同區大和町同區鶴歩町	中ノ川	二七	三五・〇	二三	二、一二 四、一〇	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間
要橋	同區鶴歩町同區扇町	大島川東支川	二七	一九・四	二三	三、四 四、三	鋼鈑桁
扇森橋	同區扇町同區茂森町	仙臺堀川	二七	二一・〇	二三	一四、一 五、一	中央徑間鋼鈑桁側徑間鐵筋混凝土框
計	九十六橋						

第五項　運河改修新鑿埋立及之に伴ふ橋梁

運河は改修十一、新鑿一、埋立一、合計十三及之に架設する橋梁十八橋は國に於て施行す。

其の運河及橋梁左の如し。

一　運河

種別	名稱	區域	延長(約)	幅員	深度(零點下)
新鑿	築地川楓川聯絡	京橋區金六町地先櫻川合流ヨリ同區木挽町一丁目地先築地川ニ至ル	二九〇米	三三米	一・八米

運河は改修十一、新鑿一、埋立一、合計十三及之に架設する橋梁十八橋は國に於て施行す。

其の運河及橋梁左の如し。

一　運　河

第五項　運河改修新鑿埋立及之に伴ふ橋梁

種別	名稱	區域	延長(約)	幅員	深度(零點下)
			米	米	米
新鑿	築地川楓川聯絡	京橋區金六町地先櫻川合流ヨリ同區木挽町一丁目地先築地川ニ至ル	二九〇	三三	一・八
同	小名木川	深川區上大島町地先横十間川ヨリ同區新安宅町地先隅田川ニ至ル	二、四六〇	五五	二・二
同	横十間川	本所區柳島元町地先北十間川ヨリ深川區豐住町地先十間川ニ至ル	三、六七〇	四〇	一・八
同	大島川	深川區平富町二丁目地先平久川ヨリ諸町地先隅田川ニ至ル	一、三〇五	四〇	一・八
同	神田川	神田區柳原河岸地先ヨリ日本橋區新柳町地先隅田川ニ至ル	一、四二〇	三六	一・八
同	日本橋川	京橋區富島町地先龜島川ヨリ同區大川端町地先隅田川ニ至ル	四七〇	四七	一・八
同	楓川	日本橋區本材河岸地先日本橋川ヨリ京橋區柳町地先櫻川ニ至ル	一、二二〇	三三	一・八
同	櫻川	京橋區金六町地先京橋川ヨリ同區港河岸地先龜島川ニ至ル	七五〇	三三	一・八
改修	京橋川	京橋區北紺屋町地先外濠ヨリ同區金六町地先櫻川ニ至ル	六〇〇	三三	一・八
同	築地川(一)	京橋區木挽町八丁目地先ヨリ同區築地四丁目地先海ニ至ル	五五〇	四七	一・八
同	築地川(二)	京橋區木挽町一丁目地先ヨリ同區木挽町八丁目地先ニ至ル	一、一三〇	三三	一・八
同	汐留川	京橋區木挽町七丁目地先三十間堀川ヨリ同區木挽町八丁目地先築地川ニ至ル	四〇〇	三三	一・八

二　橋梁

名稱	所在 區町名	河川名	路線番號	橋長	幅員	起工年月 竣工年月	型式
柳橋	日本橋區元柳町 淺草區下平右衛門町	神田川		三八・三米	二米	三、二 四、七	鋼鈑繫拱
豐海橋	京橋區南新堀町二丁目 日本橋區北新堀町	日本橋川		四六・八	八	一五、五 二、九	フヰレンデュル構
紺屋橋	京橋區北紺屋町 同區銀座西一丁目	京橋川		三二・八	一一	四、三 四、一三	連續鋼鈑桁三徑間
南門橋	同區木挽町一丁目 同區築地四丁目	築地川		四五・二	一一・二	一四、四 一五、一四	無鉸鐵筋混凝土拱三徑間
尾張橋	同區木挽町八丁目 同區築地四丁目	同		三〇・〇	一一	一四、一一 三、一一	同
祝橋	同區木挽町二丁目 同區築地二丁目	同		三六・五	一五	一四、一一 二、一五	中央吊桁鋼鈑突桁三徑間
海運橋	日本橋區江戸橋一丁目 同區兜町	柳川		三五・二	一二	一五、二 二、六	中央徑間二鉸鋼鈑拱側徑間鐵筋混凝土框
兜橋	同	同		三一・四	一二	一四、三 一五、二	中央徑間鋼鈑桁同
三吉橋	京橋區木挽町一丁目 同區新富町五丁目 同區築地一丁目	新設運河 築地川		八二・八	一五	四、二 四、一三	鋼鈑桁三徑間
新富橋	同區木挽町一丁目	新設運河		三四・四	一二	四、四 五、七	連續鋼鈑桁三徑間
同	埋立						
東堀留川	日本橋區西萬河岸地先ヨリ同區末廣河岸地先日本橋川ニ至ル			四四一	三三	一四、七〇六	一・八
西堀留川	日本橋區小船河岸地先ヨリ同區末廣河岸地先日本橋川ニ至ル			三七四	三〇		一
計							

第六項　路面鋪裝

計十八橋

兜橋	三吉橋	新富橋	練兵橋	石島橋	鐵道橋	柳島橋	栗原橋	松幡橋	炭谷橋	白魚橋	
同	同京橋區木挽町一丁目 同區新富町五丁目 同區築地一丁目	同區木挽町一丁目 同區新富町一丁目	深川區中島町 同區越中島町	同區富岡門前町 同區牡丹町	本所區錦糸町 龜戸町押上天神川東	本所區柳島元町 龜戸町砂原	本所區柳島横川町 龜戸町砂原	京橋區高代町 同區本材木町三丁目	京橋區南水谷町 同區炭谷町	同區本材木町三丁目 同區金六町	
同	新設運河築地川	新設運河	大島川	同	横十間川	同	同	楓川	京橋川	同	
三三・四	八二・八	三四・四	四〇・四	三九・二	四〇・〇	四二・八	四〇・五	三三・〇	三一・八	三二・一	
二	一五	七・六	八	八	復線	一六・五	一〇・九	七・三	一〇	九・五	
一四、三 一五、二	四、二 四、三	四、七 五、一	一四、一 一五、九	二、一〇 三、八	四、七 四、二	四、六 五、三	四、八 五、三	五、八	五、八	五、八	
中央徑間鋼鈑桁同	鋼鈑桁三徑間	連續鋼鈑桁三徑間	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間	構成工形鋼三徑間	鋼鈑桁二徑間	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間	鋼鈑桁三徑間	中央吊桁附鋼鈑突桁三徑間	鋼鈑桁一徑間	同	

海運橋	祝橋	尾張町橋	築地川								
同日本橋區江戸橋一丁目 同區兜町	同區木挽町八丁目 同區築地四丁目	同區木挽町二丁目 同區築地二丁目	同區築地四丁目								
同	同	同	柳川								
三〇・〇	一二	三六・五	一五	三五・二	一二						
一四、一 一五、一	一四、一 一五、一	一四、一 一五、一	一五、一 一五、一								
無鈑鐵筋混凝土拱三徑間	同	中央吊桁鋼鈑突桁三徑間	中央徑間二鉸鋼鈑拱側徑間 鐵筋混凝土框								

都市の發展に伴ひ交通運搬の激增は著しく路面の破損を招き、加之一般市民の文化的要求も到底從來の如き不完全なる街路に滿足する能はざる所なるを以て、本市は銳意之が對策に腐心の折柄大正九年　畏くも御內帑金三百萬圓を特に道路鋪裝費として御下賜せられたるを機とし、市に於ては大正十年度より向ふ七箇年の繼續事業として豫算三千九百四十六萬八千圓を以て重要路線延長五萬二千間此の面積三十四萬八千坪を鋪裝することに決し工事施行中の處偶々大震災に遭遇せる爲工事半に於て之を打切り爾餘の路面鋪裝に就ては燒失區域に屬するものは復興計畫に移し、其の他は別途豫算を以て施行することゝせり、而して復興計畫に依る路面鋪裝は震災被害に依る損傷部分の復舊二萬三千五十坪、車道境界緣石四千三百間及重要路線にして差當り新規鋪裝を必要とするもの一萬二千百三十九坪を本市繼續帝都復興費中道路修築費豫算百三萬二千三百七十七圓を以て大正十二年度より同十五年度迄の四箇年に亘り繼續施行し補助線街路に伴ふ鋪裝總延長二萬七千三百十一間面積十三萬九千九百六十三坪は本市繼續街路及土地整理費街路修築中より百萬九千七百七十八圓を、區劃整理街路に伴ふ鋪裝總延長二千五百九間面積一萬二千四百二十四坪は同費目土地整理費中より八萬六千五百六十三圓を支出し、昭和五年度迄の繼續事業として新設施行せりと雖多少の殘工事を生じたるを以て之は既定豫算の範圍內に於て昭和六年度に於て施行せり。

第七項　橋梁復舊竝改築

一　橋梁復舊

震災に依り燒失墜落せる橋梁二百八十九橋及燒失墜落を免れたるも損傷を蒙りたるもの七十橋、計三百五十九橋の內破損部分を修理して使用に供し得らるべきものは修理を施し燒失墜落せるものは應急的に木桁を以て假設することに決し、右被害橋梁中百六十四橋に對し本市繼續帝都復興費道路橋梁改築費橋梁復舊費百二萬九圓を以て復興事業として大正十二年度及大正十三年度の兩年度に繼續執行の豫定なりしが計畫設計に變更を來したる爲更に年期を一箇年延長し大正十四年度に於て全部工事の完了を見たり、其の復舊橋梁左の如し。

一　橋梁復舊

震災に依り燒失墜落せる橋梁二百八十九橋及燒失墜落を免れたるも損傷を蒙りたるもの七十橋、計三百五十九橋の內破損部分を修理して使用に供し得らるべきものは修理を施し燒失墜落せるものは應急的に木桁を以て假設することに決し、右被害橋梁中百六十四橋に對し本市繼續帝都復興費道路橋梁改築豫算工事費百二萬九圓を以て復興事業として大正十二年度及大正十三年度の兩年度に繼續執行の豫定なりしが計畫設計に變更を來したる爲更に年期を一箇年延長し大正十四年度に於て全部工事の完了を見たり、其の復舊橋梁左の如し。

復舊橋梁一覽表

橋名	所在地 區町名	所在地 河川名	精算工事費 豫算	精算工事費 事算	備考
萬世橋	神田區小柳町	神田川	一、〇一四・一六〇	一、〇二四・一六〇	ペンキ塗
御茶ノ水橋	同　鈴木町	同	三、〇〇〇・〇〇〇	六六四・四九〇	擴張
鞍掛橋	日本橋區小傳馬町	濱町川	四九七・〇〇〇	同	同
今川橋	同　本銀町	龍閑川	四五六・〇〇〇	同	同
九道橋	同　小傳馬町	同	二七七・〇〇〇	同	同
兩國橋	本所區元町	大川	五九四・〇〇八	同	同
吳服橋	麹町區永樂町	外濠	五、〇五六・〇〇〇	同	同
鎧橋	日本橋區南茅場町	日本橋川	一、四四二・六〇〇	同	同
京橋	京橋區銀座一丁目	京橋川	二、一二六・六六〇	同	同
櫻（芝）橋	同　南八丁堀	櫻川	二、五四七・五六〇	同	同
土橋	芝區二葉町	外濠	四八〇・六八二	同	同
難波橋	同　芝口	汐留川	八八六・五〇〇	同	同
			一、九六六・〇〇〇	同	同
			五九三・五〇〇	同	同
			四三七・三〇〇	同	同
			四八〇・九三〇	ペンキ塗	ペンキ塗
			八五六・七〇〇		

豊海橋	日本橋區北新堀町	日本橋川	三九三・六〇〇 四、二八〇・〇〇〇	同 擴張
湊橋	京橋區南新堀町	同	三四二・四〇〇 三、七九四・四六〇	擴張
靈岸橋	同　富島町	富島川	一、一三八・八〇〇	同
土州橋	日本橋區箱崎町	箱崎川	一、一〇二・八八〇 一、三九九・〇二〇	同
吉野橋	淺草區吉野町	山谷堀川	二五七・八二〇	同 修繕
須賀橋	同　須賀町	須賀堀川	二九八・九六〇	同
萬年橋	京橋區采女町	築地川	七三九・二〇〇 六九二・三二〇	同
數寄屋橋	麴町區有樂町	外濠	五四〇・〇六〇	同
三之橋（京橋）	京橋區靈岸島銀町	新川	一、九七一・四一五	同
小梅橋	本所區業平町	十間川	四、六〇〇・〇〇〇	同
永喜橋	深川區和倉町	入堀	九〇〇・〇〇〇 九一八・八八六	架替
箱崎橋	日本橋區箱崎町	箱崎川	四、五八〇・六二七	同
京成橋	本所區押上町	北十間川	三、三一五・六〇〇	擴張
龜壽橋	深川區大和町	入堀	七一五・〇〇〇	架替
押上橋	本所區押上町	北十間川	二、一八四・〇〇〇	擴張
甚兵衛橋	日本橋區小傳馬上町	龍閑川	一、三五五・〇八〇	同
西仲ノ橋	同　本銀町	同	一、三六二・四八〇	同
東仲ノ橋	同　同	同	一、六五九・六八〇	同
玉出橋	同　龜井町	同	一、七〇二・二五一	同

長崎橋	本所區長崎町	大横川	二、八二〇・〇〇〇	同
新川橋	京橋區靈岸町	新川	三、六九二・九三五	同
千鳥橋	日本橋區橋町	濱町川	一、六九八・〇八〇	同
小石川橋	小石川區小石川町	神田川	一、九〇二・七八六	同
大富橋	深川區東大工町	小名木川	四、〇三七・二〇六	同
汐先橋	京橋區木挽町	汐留川	三、八三六・〇七三	同
淺草橋	淺草區茅町	神田川	八二二・三六〇	ペンキ塗
柳橋	同下平右衞門町	同	一七六・六八〇	同
左衞門橋	同左衞門町	同	四九〇・九六〇	同
武田橋	深川區大和町	入堀	三四九・〇四〇	架替
千鳥橋	同堀川町	油堀	三、一二四・六八五	擴張
一之橋	京橋區靈岸島町	新川	二、五二五・二六四	同
一ツ橋	神田區一ツ橋通	外濠	五、九三八・〇八〇	同
思案橋	日本橋區小網町	東堀留川	三、三四一・四二四	同
龜島橋	同龜島町	龜島川	四、七七九・九五一	同
高橋	深川區東大工町	小名木川	六八六・三二〇	ペンキ塗
二之橋	本所區相生町	竪川	九四二・七七〇	同
東元橋	深川區東元町	五間堀川	二三〇・九二〇	同
元木橋	同堀川町	大島川西支川	二、一一九・七九〇	擴張

辨天橋	洲崎町	大横川	二、〇一九、二八〇	同	同	
枕橋	本所區中ノ郷瓦町	源森川	一、三八六・四六四	同	同	
新場橋	日本橋區本材木町	楓川	三、二〇三・五九五	同	同	
金杉橋	芝區土手跡町	古川	四七一・五〇〇 一三八・五七九	修繕	ペンキ塗	
横川橋	本所區中ノ郷横川町	大横川	六、〇一三・三一〇	擴張	假橋	
西河岸橋	日本橋區西河岸町	日本橋川	五四九・五一〇 一〇、九六五・九一〇	ペンキ塗		
江戸橋	同　本船町	同	二、〇八・八〇〇 四、二八〇・〇〇〇 七一〇・〇〇〇	同	同	
和泉橋	神田區佐久間町	神田川	二、二三三・九九三	同	同	
中之橋	本所區太平町	入堀	七、三〇五・九七一	同	同	
蓬來橋	深川區富岡門前町	大島川	一、四一七・七九五	同	同	
俎橋	神田區今川小路一丁目	外濠	一、八二一・四四八	同	同	
地藏橋	日本橋區本銀町	龍閑川	四、八三二・二六四	同	同	
永居橋	深川區大和町	油堀	二、四一三・二八〇	修繕	同	
中之橋	京橋區本八丁堀	櫻川	二、一六七・五四〇	同	同	
芝濱橋	芝區芝浦二丁目	新芝川北支川	三、八二〇・三二七	擴張	同	
朝日橋	京橋區銀座三丁目	三十間堀川	一、六三五・六五六	同	同	
千船橋	深川區平久町	平久川支川	一、〇七二・〇七四	修繕	同	
榮橋	日本橋區久松町	濱町川				
八千代橋	芝區芝浦三丁目	新芝川北支川				

平野橋	深川區入舟町	大島川	三、二八〇・〇七二	擴張
新大橋	同西元町	大川	五六、一三三・一六〇 八、八五六・九二〇	修繕
要橋	同吉永町	仙臺堀川	五、二三二・九三〇	同
備前橋	京橋區築地二丁目	築地川	七、一三三・二四四	假橋
永久橋	日本橋區箱崎町	箱崎川	二、一五三・八八八	架替
一之橋	本所區相生町	竪川	二、四九二・四六九	擴張
緑橋	日本橋區小傳馬上町	濱町川	五三七・二五二	修繕
元高橋	京橋區本八丁堀	龜島川	四、四八六・三〇〇 五二三・〇〇〇	同 ペンキ塗
一石橋	日本橋區北鞘町	日本橋川	二、九五〇・五〇〇	同
海邊橋	深川區萬年町	仙臺堀川	二、五〇九・九六五	同
黒龜橋	同龜住町	油堀	二、五九五・三五五	同
猿子橋	同西元町	六間堀川	一、三六〇・九九〇	擴張
櫻橋（深川）	同富川町	入堀	五六一・一二一	架替
白魚橋	京橋區本材木町	京橋川	九五九・八九七	修繕
通運橋	深川區富川町	入堀	六六一・八一六	架替
船路橋	芝區芝浦	芝浦川西支川	二、八九八・二一七 八六七・六二〇	同
堺橋	京橋區入舟町	築地川	一、五一三・八二一	同
鍛冶橋	麴町區八重洲町	外濠	七八九・七六〇	修繕
龍閑橋	日本橋區本銀町	龍閑川	二五四・一三〇	同

芝潟橋	芝區芝浦二丁目	新芝川北支川	二、四一三・二八〇	修繕
朝日橋	京橋區銀座三丁目	三十間堀川	二、一六七・五四〇	同
千船橋	深川區平久町	平久川支川	三、八二〇・三一七	擴張
榮橋	日本橋區久松町	濱町川	一、六三五・六五六	同
八千代橋	芝區芝浦三丁目	新芝川北支川	一、〇七二・〇七四	修繕

榮橋	深川區石島町	入堀	六九四・一七一	架	大下水	區宇田川町	一七六・一八六
板橋	同猿江町	大下水	三六九・六九〇	同	同	同汐留町	八〇・一一〇
三原橋	京橋區木挽町	三十間堀川	四九三・一三〇	修	同	同汐留町	二四・九八三
中之橋	深川區木場町	入堀	六六七・〇九九	同	同	同汐留川	一三・八八九
琴平橋	本所區古石場町	大島川南支川	六九〇・七九九	同	同	同南割下水	同
銚子場橋	本所區東大工町	入堀	五六二・七五三	同	同	同大島川西支川	同
板橋	深川區入舟町	同	五七八・三九〇	同	同	同	同
扇橋	同	大堀川	二、一九〇・一七五	同	同	同	同
石島橋	本所區石島町	入堀	一、五九二・九〇〇	同	同	同	同
八反目橋	同小梅町	曳舟川	三一二・五三〇	同	同	同	同
新辻橋	同柳原町	竪川	一、九六五・一九四	同	同	同	同
北辻橋	同花町	大横川	二、二五四・四六三	同	同	同	同
橋本橋	神田區材木町	濱町川	七八二・七三〇	同	同	同	同
汐見橋	深川區數矢町	中之川	九六五・四六〇	同	同	同	同
久松橋	日本橋區久松町	濱町川	一、〇〇四・〇一四	同	同	同	同
萬橋	同新材木町	新堀留川	一、四八二・九七〇	同	同	同	同
會仙橋	芝區汐留町	汐留川入堀	七九二・四七五	同	同	同	同
惠比壽橋	本所區數矢町	入堀	四〇九・八三六	同	同	同	同
古川橋	深川區西平井町	同	九六二・四三三	架	同	同	同
宇田川橋	芝區宇田川町	大下水	一七六・一八六	修			
蓬萊橋	同汐留町	汐留川	八〇・一一〇	同			
久潟橋	本所區長岡町	南割下水	二四・九八三	同			
松永橋	深川區今川町	大島川西支川	一三・八八九	同			
				繕			

替

宇田川橋	芝區宇田川町	大下水	一七六・一八六	修繕
蓬萊橋	同　汐留町	汐留川	八〇・二一〇	同
久潟橋	本所區長岡町	南割下水	二四・九八三	同
松永橋	深川區今川町	大島川西支川	一三三・八八九	同
榮久橋	淺草區北三筋町	新堀川	一七三・七三二	同
竹芝橋	芝區芝浦南濱町	新芝川	一、七〇一・〇八〇	同
月島橋	京橋區月島	月島川	三、三三七・六一五	同
初見橋	同　新佃町	佃川	三、一六三・〇五五	同
東仲ノ橋	深川區富岡門前町	油堀東支川	三一三・三〇三	同
豐平橋	同　東平井町	十間川	九九六・三一五	同
豐榮橋	同　千田町	二十間川	一、九九一・四七〇	同
西永橋	本所區西永町	入堀	二五五・二三〇	同
長谷川橋	同　豐住町	同	三八一・〇五七	同
山下橋	同　東扇町	同	四三五・二四二	同
和泉橋	同　東扇町	同	五四八・四八五	同
製鋼橋	同　東大工町	同	六五〇・六九四	同
坂田橋	深川區福住町	北黑江川	二三七・五九七	同
土橋	芝區二葉町	外濠	二八五・一九〇	同
猿江橋	深川區西町	大橫川	二、六一八・七五五	同

久松橋	日本橋區久松町	濱町川	一、〇〇四・〇一四	同
萬橋	同　新材木町	新堀留川	一、四八二・九七〇	同
會仙橋	芝區汐留町	汐留川入堀	七九二・四七五	同
惠比壽橋	本所區數矢町	入堀	四〇九・八三六	同
古川橋	深川區西平井町	同	九六二・四三三	架替

千田橋	同	西平井町	入	堀	五七・八三四	同	
太田橋	同	同	同		三〇・二五九	同	
平井橋	同	東平井町	同		四三九・二六五	同	
石小田橋	同	同	同		四三六・八一五	同	
西平野橋	同	西平野町	十間堀川		七一九・六一五	同	
丸木橋	本所區豐住町	入	堀		四四二・九三八	同	
岩井橋	神田區元岩井町	濱町	川		八九六・三四四	同	
火除橋	日本橋區大傳馬鹽町	龍閑	川		六九五・四三六	同	
男橋	日本橋區濱町	箱崎	川		二、三〇六・四三三	同	
蠣濱橋	同	蠣殻町	濱町	川	六五二・七一九	同	
明大橋	京橋區木挽町	大下	水		一九二・五七四	同	
新錢座橋	芝區新錢座町	同			三八五・九五五	同	
玉姫橋	淺草區玉姫町	下	水		九二・一五六	同	
正平橋	深川區木場町	入	堀		四五七・六四二	同	
小川橋	日本橋區浪花町	濱町	川		二、三三・八七一	擴	張
中之橋	深川區東六間堀町	六間堀	川		一、一六・九一一	同	
采女橋	京橋區采女町	築地	川		一、三九・四七〇	同	
紙洗橋	淺草區吉野町	山谷堀	川		三五・〇〇〇	ペンキ塗	
壽福橋	同	老松町	新堀	川	四〇・〇〇〇	同	

睦橋	深川區和倉町	入堀	一、五一九、〇四八	擴張		
岡田橋	同　西平井町	同	一、五二五、三五八	架替		
大和橋	神田區豐島町	濱町川	三一、三〇〇	修繕		
伊藤橋	京橋區新富町	入船川	二一三、二六〇	架替		
新月橋	京橋區新佃町	佃川	九四四、四四七	修繕		
元彈正橋	同　本材木町	楓川	一〇六、三六二	同		
柳原橋	神田區東龍閑町	濱町川	一、六二三、二一〇	架替		
大塚橋	深川區西森下町	五間堀川	五四、三〇〇	擴張		
大久保橋	同　東森下町	同	一五四、二〇〇	同		
御竹橋	本所區龜澤町	南割下水	一、〇七〇、四六〇	架替		
伊豫橋	深川區森下町	五間堀川	一、一八一、二五五	擴張		
出雲橋	京橋區竹川町	三十間堀川	九四、五三三	修繕		
比丘尼橋	同　北紺屋町	京橋川	一五九、五六七	同		
佐久間橋	神田區佐久間町	神田川入堀	四五五、八〇〇	ペンキ塗		
明石橋	京橋區明石町	築地川	一五六、八四〇	同		
新高橋	深川區西町	小名木川	一七〇、〇〇〇	同		
常盤橋	麹町區大手町	外濠	二、九〇四、九一〇	架替		
新橋	芝區芝口	汐留川	三、五〇二、八七九	修繕		
日ノ出橋	同　芝浦	芝浦川東支川	一、二〇五、八八〇	同		
			八三三、〇六〇	ペンキ塗		
			四九四、三四六	修繕		

小川橋	日本橋區浪花町	濱町川	二、三三一、八七一	擴張		
中之橋	深川區東六間堀	六間堀川	一、一六一、九二一	同		
采女橋	京橋區采女町	築地川	一、三五九、四七〇	同		
紙洗橋	淺草區吉野町	山谷堀川	三五、〇〇〇	ペンキ塗		
壽福橋	同　老松町	新堀川	四〇、〇〇〇	同		

二　橋梁改築

大震火災に因る被害橋梁中、破損の程度著しく修理するも永久の使用に耐え難き橋梁の改築竝大震災には被害なかりしも不燃質の構造にあらざるもの、又は強度不充分なるものに付這般の大震火災に鑑み強度及構造上より改築を必要とするもの八十八橋に對し本市繼續帝都復興事業費道路橋梁改築費橋梁改築費豫算千四十六萬四千三百一圓の內八百六十八萬八千五百七十五圓を以て復興事業として大正十二年度より昭和四年度迄の七箇年に亘り繼續執行の豫定なりしが、實際の工事執行に當り種々の障阻の爲豫定の進捗を見る能はず、更に一箇年度延長し昭和五年度に於て完成の豫定なりしが南辻橋、吾妻橋、山下橋、櫻橋及辨天橋の六橋は設計變更等の爲豫定の進捗を見る能はず、殘工事に對しては既定豫算の範圍に於て昭和六年度に於て施行せり、其の改築橋梁左の如し。

改築橋梁一覽表

名稱	所在		震災前				改築				起工年月日	精算	
	區町名	河川名	橋長	幅員	構造		橋長	幅員	構造		竣工年月日	工事費	
竹橋	麹町區代官町	內濠	三三・八〇	四・三〇	木桁		五〇・〇〇	三一・〇〇	鐵混凝土筋		一四、五、一三 一五、九、三	一九一、一五〇	円
辨慶橋	同　紀尾井町	同	二四・〇〇	四・〇〇	同		四一・〇〇〇	二一・〇〇〇	同		一五、六、四 一五、三、三	七二、六九九	
新三崎橋	神田區三崎町	外濠	一六・〇〇	三・〇〇	同		二七・〇〇〇	八・〇〇〇	同		一五、五、一四 一五、一一、二六	四三、三五一	

新川橋	同　同	新　川	一四・〇〇	五・三六	同		二六・五〇〇	二一・〇〇〇	鐵　桁	一四、八、五 二、八、二七	八〇、〇三六
今川橋	日本橋區通一丁目	龍閑川	六・〇〇	一三・二三	鐵　桁		一一・〇〇〇	二七・二三	鐵　桁	一三、九、二五 一四、四、六	三七、一四五
千鳥橋	同　元濱町	濱町川	六・〇〇	四・〇〇	木　桁		一四・七〇〇	二一・〇〇〇	鋼鈑桁	二、一一、八 三、七、三	二六、九四三

新川橋	同	同	新川	一四・〇〇	五・三六	同	二六・五〇〇	一一・〇〇〇	鐵桁	一四、八、五 二、八、二七	八〇、〇三六		
今川橋	日本橋區通一丁目	龍閑川	六・〇〇	一三・二三	鐵桁	一一・〇〇〇	二七・二五三	鐵桁	一三、九、二五 一四、四、六	三七、一四五			
千鳥橋	同	元濱町	濱町川	六・〇〇	四・〇〇	木桁	一四・七〇〇	一一・〇〇〇	鋼鈑桁	二、一一、八 三、七、三一	二八、九四二		
西河岸橋	同	西河岸町	日本橋川	二八・八〇	六・二五	鐵桁	五二・〇〇〇	一一・〇〇〇	鈑桁	一三、一三、三〇 一四、八、一八	九八、六六九		
出雲橋	京橋區出雲町	三十間堀川	一六・〇〇	四・〇〇	同	三三・〇〇〇	一四・五〇〇	同		一三、一〇、一一 一四、四、六	一〇〇、三八六		
築地橋	同	築地一丁目	築地川	一八・〇〇	六・〇〇	木桁	二四・五〇〇	一八・二〇〇	鋼拱橋	一二、六、八 一四、一、一五	一八一、三〇三		
備前橋	同	同二丁目	同南支川	一四・〇〇	四・〇〇	同	三二・〇〇〇	一七・〇〇〇	鈑桁橋	一三、一一、一七 一四、五、一六	一〇〇、六一六		
三之橋	同	同	新川	六・〇〇	四・〇〇	同	一三・五〇〇	八・〇〇〇	鐵凝土筋	一四、八、一 一五、二、一五	三七、一二四		
明石橋	同	南飯田町	築地川	七・五〇	四・二三	同	二五・〇〇〇	八・〇〇〇	鈑桁	一四、一二、四 一五、八、二七	六七、九一五		
新月橋	同	佃西町	佃川	二三・〇〇	一・六七	同	三九・〇〇〇	一一・〇〇〇	鈑鋼桁	二、四、九 二、一一、二一	九五、九五四		
堺橋	同	明石町	築地川	五・五〇	四・〇〇	同	二五・〇〇〇	八・〇〇〇	鈑桁	二、一〇、一五 三、七、三	六六、二七五		
芝園橋	芝區新堀町	古川	一一・〇〇	八・三〇	同	一九・〇〇〇	二六・〇〇〇	同		一四、三、二 一五、一、一八	九六、二七〇		
新橋	同	芝口一丁目	汐留川	二二・五〇	一〇・四〇	鐵桁	二五・〇〇〇	二七・〇〇〇	鐵凝土筋	一三、九、二四 一四、七、二八	二四〇、五八三		

竹橋	麹町區代官町	內濠	二三・八〇	四・三〇	木桁	五〇・〇〇〇	二三・〇〇〇	鐵凝土筋	一四、五、二三 一五、九、一三	一九一、一五〇			
辨慶橋	同 紀尾井町	同	二四・〇〇	四・〇〇	同	四一・〇〇〇	二一・〇〇〇	同	一五、六、四 一五、一三、二三	七二、六九九			
新三崎橋	神田區三崎町	外濠	一六・〇〇	三・〇〇	同	二七・〇〇〇	八・〇〇〇	同	一五、五、二四 一五、一一、二六	四三、三五一			

南濱橋	同　南濱町	芝浦川	三一・四〇	四・〇〇	木桁	五四・四〇〇	一八・〇〇〇	鈑桁	一五、一〇、三 二、八、二五	一五九、〇八四
中之橋	同　赤羽町	古川	九・〇〇	三・〇〇	同	一六・三〇〇	一三・〇〇〇	同	一四、一二、一四 一五、七、九	五七、三〇六
船河原橋	牛込區新宮比町	江戸川	一一・六〇	八・〇〇	同	二一・〇〇〇	三・〇〇〇	鐵筋混凝土	一三、九、一〇 一四、一〇、三〇	一三三、六五一
富坂橋	小石川區西富坂町	千川	三・〇〇	九・九〇	同	五・八〇〇	一八・〇〇〇	同	一四、五、一二 一四、八、一六	七、六二一
市ヶ谷橋	牛込區八幡町	同	五・〇〇	八・〇〇	同	九・二八六	一五・二四〇	メラン式桁	一五、六、一三 二、一二、二四	二三、八九二
江戸川橋	小石川區小日向水道町	江戸川	一〇・〇〇	六・五〇	同	一八・〇〇〇	二〇・〇〇〇	鈑桁	一四、一〇、九 一五、七、二〇	七八、二八二
平井橋	深川區東平井町	十間堀川入堀	五・四〇	二・三〇	同	八・六〇〇	一〇・〇〇〇	木桁	二、七、一一 三、四、二八	一五、二三五
平野橋	同　西平野町	同	四・五〇	二・〇〇	同	七・〇〇〇	一〇・〇〇〇	同	二、八、一五 二、一一、一七	九、六八五
野口橋	同　冬木町	仙臺堀川入堀	二・〇〇	三・〇〇	同	八・七〇〇	七・〇〇〇	同	三、五、二三 三、九、一三	一〇、一一三
玉出橋	日本橋區龜井町	龍閑川	六・〇〇	四・〇〇	同	三・二〇〇	八・〇〇〇	鐵筋混凝土	三、四、三 二、一〇、二七	二三、六七五
佃橋	深川區佃町	佃川	二四・〇〇	三・〇〇	同	四〇・〇〇〇	八・〇〇〇	鈑突桁	三、一二、二五 三、一〇、一〇	九一、三四二
枕橋	本所區中ノ郷瓦町	源森川	六・二〇	四・一〇	同	二五・四〇〇	一八・〇〇〇	鐵筋混凝土	二、一〇、一三 三、一一、二七	一三三、五三四
鶴壽橋	深川區鶴歩町	大島川東支川	八・一〇	一・一〇	同	一九・七〇〇	四・五〇〇	鐵桁	三、五、二六 三、一一、三〇	二五、五九四

厩橋	淺草區黑船町	荒川	八六・四〇	六・九〇	鐵桁	一五二・〇〇〇	二二・〇〇〇	鋼撃拱	[illegible]	二、一三四、三九七
小石川橋	小石川區小石川町	神田川	二一・〇〇	四・五〇	木桁	二九・七〇〇	二一・〇〇〇	鐵桁	一五、八、一六 二、三、二七	七五、一二五

厩橋	淺草區黑船町	荒川	八六・四〇	六・九〇	鐵桁	一五二・〇〇〇	二三・〇〇〇	鋼撃拱	一五、九、九 四、九、三〇	一、一三四、三九七
小石川橋	小石川區小石川町	神田川	一一・〇〇	四・五〇	木桁	二九・七〇〇	一一・〇〇〇	鐵桁	一五、八、一六 二、一二、二七	七五、一二五
小川橋	深川區冬木町	仙臺堀川	六・〇〇	七・五〇	同	七・〇〇〇	七・〇〇〇	木桁	三、一〇、四 四、二、三	八、二三一
入船橋	同 入船町	入堀	九・〇〇	二・五〇	同	一七・四〇〇	八・〇〇〇	鈑桁	三、六、二九 四、二、一二	三四、八九三
一之橋	麻布區網代町	古川	八・〇〇	七・三〇	同	一六・八〇〇	一七・二〇〇	鈑鋼桁	二、一二、一 四、二、一五	五七、七〇〇
相生橋	深川區永堀町	仙臺堀支川	五・五〇	二・五〇	同	一七・八〇〇	一一・〇〇〇	鐵桁	三、六、一七 四、三、二二	六二、六〇四
巽橋	同 千田町	入堀	七・〇〇	三・〇〇	同	九・七〇〇	一〇・〇〇〇	木桁	三、七、三〇 四、三、二九	一四、四三五
太田橋	同 西平井町	同	三・五〇	二・〇〇	同	七・八〇〇	一〇・〇〇〇	同	三、一〇、六 四、三、二四	一五、二八五
綠橋	同 松賀町	大島川	一〇・〇〇	二・五〇	同	二三・〇〇〇	一一・〇〇〇	鐵構	三、六、一六 四、四、一三	五六、九〇五
佐久間橋	神田區佐久間町	運河	九・〇〇	六・六〇	同	一四・四〇〇	二三・〇〇〇	鈑桁	三、二、一五 四、四、四	五五、一八〇
會仙橋	芝區汐留町	入堀	五・一〇	四・一〇	同	八・七〇〇	八・〇〇〇	木桁	四、二、六 四、五、二七	一五、一四四
女橋	日本橋區濱町	箱崎川	二一・〇〇	三・四〇	同	三五・三〇〇	八・〇〇〇	鐵桁	二、一一、二五 四、六、七	六四、一一五
川口橋	同 同	同	六・〇〇	四・一〇	同	一三・五〇〇	一一・〇〇〇	同	二、一一、一五 四、六、七	四三、八四〇

佃橋	深川區佃町	佃川	二四・〇〇	三・〇〇	同	四〇・〇〇〇	八・〇〇〇	鈑突桁	三、一二、二五 三、一〇、一〇	九一、三四二
枕橋	本所區中ノ鄕瓦町	源森川	六・二〇	四・一〇	同	二五・四〇〇	一八・〇〇〇	鐵筋混凝土	二、一〇、三 三、一一、二七	一二三、五三四
鶴壽橋	深川區鶴歩町	大島川東支川	八・一〇	一・一〇	同	一九・七〇〇	四・五〇〇	鐵桁	三、五、二六 三、一一、三〇	二五、五九四

竹森橋	日本橋區龜井町	濱町川	七・〇〇	三・〇〇	木桁	一五・〇〇〇	一一・〇〇〇	鈑桁	三、一一、三 四、六、二六	二七、五三五
長崎橋	本所區長崎町	大横川	一〇・〇〇	四・一〇	同	三九・〇〇〇	一一・〇〇〇	ワーレン型單構	三、七、一三 四、七、二	一〇六、二二九
長島橋	深川區千田町	入堀	六・〇〇	二・一〇	同	九・七〇〇	一〇・〇〇〇	木桁	四、二、八 四、七、二三	一六、八六六
松井橋	本所區松井町	六間堀川	五・〇〇	三・〇八	同	一〇・五〇〇	一一・〇〇〇	鈑桁	三、一三、一八 四、七、二六	三一、九一二
古川橋	深川區西平井町	入堀	三・三〇	一・五〇	同	八・七〇〇	一〇・〇〇〇	木桁	三、一三、二〇 四、七、九	一七、一三九
千鳥橋	同　堀川町	大島川支川	一三・〇〇	四・〇〇	同	二八・三〇〇	八・〇〇〇	鐵構	三、一、一六 四、八、三一	五七、九七三
石小田橋	同　東平井町	入堀	五・五〇	二・二〇	同	九・七〇〇	一〇・〇〇〇	木桁	四、七、一一 四、一三、六	二三、三九四
宮城橋	同　清住町	同	五・六〇	二・一〇	同	四・二四三	八・〇〇〇	鐵筋混凝土	四、一、二四 四、一三、一〇	一〇、二五六
孝慈橋	同　伊勢崎町	同	八・〇〇	三・〇〇	同	一四・〇〇〇	八・〇〇〇	鈑桁	四、四、一 四、一一、二二	三一、四三〇
小田原橋	京橋區築地三丁目	築地川	一〇・五〇	三・〇〇	同	二四・五〇〇	一五・〇〇〇	鐵筋混凝土	四、二、八 四、一〇、一六	九四、七二二
富士見橋	深川區西平井町	十間川	一一・三三	二・七八	同	二〇・五〇〇	一一・〇〇〇	鋼鈑	四、五、三〇 四、一三、九	五七、〇五六
東仲之橋	日本橋區本銀町	龍閑川	六・〇〇	四・〇〇	同	一三・〇〇〇	一一・〇〇〇	鈑桁	四、七、一三 五、一、六	三三、九二四
紙洗橋	淺草區地方今戸町	山谷堀	五・三三	二・三三	鐵桁木桁	一〇・一〇〇	八・〇〇〇	鋼桁	四、七、一 四、一〇、二五	一一、〇二八
萬世橋	神田區小柳町	神田川	一四・〇〇	一〇・三〇	鐵桁	二六・〇〇〇	三六・〇〇〇	鐵筋混凝土	三、二、一〇 五、九、三〇	三四九、五三九
京成橋	本所區押上町	北十間川	一〇・五〇	六・三〇	同	一九・〇〇〇	二三・〇〇〇	鈑桁	三、八、一八 四、一〇、二五	一一二、九八九
大榮橋	深川區久永町	大横川	一八・〇〇	二・五〇	同	三八・〇〇〇	一一・〇〇〇	鋼構	三、一一、二〇 四、一一、六	一一二、七二七

萬世橋	神田區小柳町	神田川	一四・〇〇	一〇・三〇	鐵桁	二六・〇〇〇	三六・〇〇〇	鐵筋混凝土	三、二、一〇 五、九、三〇	三四九、五三九
京成橋	本所區押上町	北十間川	一〇・五〇	六・三〇	同	一九・〇〇〇	二二・〇〇〇	鈑桁	三、八、一八 四、一〇、二五	一二二、九八九
大榮橋	深川區久永町	大横川	一八・〇〇	二・五〇	同	三八・〇〇〇	一一・〇〇〇	鋼構	三、一一、二〇 四、一一、六	一二二、七二七
鹿島橋	芝區南濱町	新芝川 北支川	二〇・〇〇	五・〇〇	同	三六・二〇〇	一六・五〇〇	鈑桁	四、一一、七 五、三、二七	一二二、一二二
榮綠橋	深川區石島町	入堀	五・五〇	二・一〇	同	九・七〇〇	一〇・〇〇〇	木桁	四、一、二五 四、一一、二〇	二〇、一一九
南辻橋	本所區南川町	大横川	一三・〇〇	三・〇〇	同	三四・九〇〇	一一・〇〇〇	鈑桁	六、一、一二 六、五、一五	一二二、四七八
太田橋	深川區久永町	入堀	三・五〇	二・〇〇	同	七・八〇〇	一〇・〇〇〇	木桁	四、一二、一九 五、六、一四	一四、四四一
豐島橋	同　西永代町	中ノ堀川	八・〇〇	三・〇〇	同	二〇・六〇〇	八・〇〇〇	鈑桁	四、三、二五 四、一二、一四	六一、九七一
幾世橋	同　扇橋町	水路	四・五〇	二・五〇	同	一五・四〇〇	四・〇〇〇	鋼鈑桁	四、七、一〇 五、一、一三	二六、六三二
範多橋	同　茂森町	大横川 支川	一一・〇〇	一・五〇	同	二三・〇〇〇	六・〇〇〇	鋼鈑	四、七、一〇 五、一、一三	四四、三〇五
吉岡橋	同　東平野町	福富川	八・〇〇	二・八三	同	一七・〇〇〇	九・〇〇〇	鈑桁	四、五、一七 四、一二、三〇	四二、七八四
福永橋	同　島崎町	同	一〇・〇〇	四・〇〇	同	二〇・〇〇〇	六・〇〇〇	同	四、五、二五 五、三、三	三六、〇七九
吾妻橋	淺草區花川戸町	荒川	八一・五〇	七・六七	鐵桁	一五・〇〇〇	一四・五四五	鋼桁	四、六、二七 五、六、一五	一、二三九、七一三

富士見橋	深川區西平井町	十間川	一一・三三	二・七八	同	二〇・五〇〇	一一・〇〇〇	鋼鈑	四、五、三〇 四、一二、九	五七、〇五六
東仲之橋	日本橋區本銀町	龍閑川	六・〇〇	四・〇〇	同	一三・〇〇〇	一一・〇〇〇	鈑桁	四、七、一二 五、一、六	三三、九二四
紙洗橋	淺草區地方今戸町	山谷堀	五・三三	二・三三	鐵桁 木桁	一〇・一〇〇	八・〇〇〇	鋼桁	四、七、一 四、一〇、二五	一一、〇二八

榮橋	京橋區新船町	入堀	一〇・〇〇	四・〇〇	木桁	二七・四〇〇	八・〇〇〇	鈑桁	四、六、五	五、三二、二四	六〇、四七八		
新入橋	深川區千田町	二十間川支川	六・三三	一・三三	同	一三・〇〇〇	一一・〇〇〇	同	四、八、三〇	六、一六	四四、〇八六		
押上橋	本所區押上町	北十間川	一〇・〇〇	四・三〇	同	一八・九〇〇	七・〇〇〇	木桁	五、九、一〇	六、一、三二	一二、三四一		
西仲橋	日本橋區本銀町	龍閑川	六〇・〇〇	四・〇〇	同	一三・〇〇〇	一一・〇〇〇	鈑鋼桁	四、九、一〇	六、一、三二	三七、三四一		
築島橋	深川區島田町	大島川東支川	一八・〇〇	六・〇〇	同	二三・九〇〇	五・〇〇〇	鈑桁	四、一〇、一〇	五、六、一八	二九、七三八		
青海橋	同　吉永町	福富川支川	六・〇〇	二・〇〇	同	一六・〇〇〇	九・〇〇〇	鋼鈑桁	四、一一、三	五、九、三〇	三三、七六〇		
蘆洲橋	同　鹽濱町	平久川支川	一〇・〇〇	四・〇〇	同	一八・〇〇〇	一三・五〇〇	鈑桁	四、一〇、一六	五、五、一一	五四、五九六		
大久保橋	同　東森下町	五間堀川	四・〇〇	二・二五	同	一一・〇〇〇	一一・〇〇〇	鋼鈑	四、一一、一五	五、八、一四	三三、八三六		
有樂橋	麹町區有樂町	外濠	二一・五〇	六・〇〇	木桁鐵桁	三九・八〇〇	一三・〇〇〇	鋼桁	四、九、一三	五、二、一六	三三、七六九		
新川橋	京橋區銀町	新川	八・〇〇	九・三七	木桁	一六・〇〇〇	一五・〇〇〇	同	四、九、七	五、二、一五	三五、一九〇		
千船橋	深川區平久町	平久川支川	一〇・〇〇	四・〇〇	同	一八・〇〇〇	七・四〇〇	木桁	四、一〇、四	四、一三、一三	七、九五三		
四之橋	麻布區本村町	古川	一一・〇〇	四・〇〇	同	一六・二〇〇	六・〇〇〇	鈑鋼桁	五、二、五	六、一、三	四〇、九七八		
御藏橋	本所區横網町	入堀	五・四〇	四・〇〇	同	一九・五〇〇	一一・〇〇〇	同	五、一、三〇	五、一〇、三一	五四、九七七		

箱崎橋	日本橋區箱崎町	箱崎川	一一・〇〇	四・三〇	同	三五・〇八〇	一一・〇〇〇	鋼鈑桁	四、一一、二	五、九、三〇	九五、六六七		
水門橋	本所區小梅瓦町	曳舟川	二・七〇	二・三〇	同	九・七〇〇	七・〇〇〇	木桁	五、二、二五	五、六、五	五、〇〇二		
兩國橋	本所區横網町	荒川	九〇・〇〇	二一・五〇	鐵桁	一六四・五〇〇	二四・〇〇〇	鋼鈑桁	五、二、一九	五、事中	九八七、五〇〇		

箱崎橋	日本橋區箱崎町	箱崎川	一一・〇〇	四・三〇	同	三五・〇八〇	一一・〇〇〇	鋼鈑	四、一一、二 五、九、三〇	九五、六六七
水門橋	本所區小梅瓦町	曳舟川	二・七〇	二・三〇	同	九・七〇〇	七・〇〇〇	木桁	五、二、二五 五、六、五	五、〇〇二
兩國橋	本所區横網町	荒川	九〇・〇〇	一一・五〇	鐵桁	一六四・五〇〇	二四・〇〇〇	鋼鈑桁	五、二、一九 工事中	九八七、五〇〇
平野橋	深川區入船町	大島川	八・〇〇	四・〇〇	木桁	一四・六七〇	七・〇〇〇	木桁	五、一〇、一 七、一、三一	八、七三七
山下橋	京橋區山下町	外濠	一六・〇〇	六・五〇	同	一六・〇〇〇	一〇・〇〇〇	鐵筋混凝土	鐵道省にて委託工事中	三一、〇〇〇
櫻橋	同南八丁堀	櫻川	一七・〇〇	六・二〇	鐵桁	三〇・七八六	一八・〇〇〇	鋼鈑	五、九、二八 六、六、一三	九三、六三六
辨天橋	深川區洲崎町	大横川	九・〇〇	四・〇〇	木桁	二三・二〇〇	九・〇〇〇	鈑桁	六、六、三〇 工事中	四七、五二〇
計			八十八橋							

備考　兩國橋、山下橋及辨天橋は工事中に付豫算額を掲ぐ。

第四節　其の他の復興事業

第一項　上水道

一　事業概要

本事業は明治二十三年東京市區改正委員會の改良計畫に基き前後約二十有餘年の歳月を費し、專ら多摩川を水源として上水道を完成せしめたるも、當時の計畫は一日の給水能力十七萬立方米(人口百五十萬人、一人當百十一リツトル)を標準としたるものにして人口の增加時勢の推移に依り一日の給水能

力五十萬立方米(人口二百六十萬人、一人當百八十五リットル)に擴張の必要を認め、更に大正二年度より昭和三年度に至る十六箇年繼續事業として豫算總額四千七百六十萬圓を投じ、工事を第一期(豫算千百五十萬圓)に分ち事業の擴張を計れり、

第一期工事は羽村村山線、村山貯水池の大部、村山境線、境淨水場濾過池十二面、境和田堀線、和田堀淨水池及配水本管の內和田堀靑山線新宿巢鴨線竝配水枝管全部を竣成し、先づ一部の通水を計り、第二期工事は殘工事卽ち下貯水池の一部、境淨水場濾過池八面、境和田堀送水暗渠及市內配水本管の殘部を完成せしむる豫定にあり。

工事は順調に進捗し第一期工事將に成らむとするに當り、偶々大震災勃發の爲一時中止し、第二期工事は大正十三年度より實施の計畫なりしが之亦震災の爲市財政に一大變化を來し遂行困難に陷りたるを以て之を中止したり、而して之等事業中差當り最も急を要するもの及既設水道の復舊を要するものを復興事業に繰入れ豫算總額千萬圓(國庫より四分の一の補助を受く)を以て大正十二年度より昭和元年度に至る四箇年繼續事業として施行中一部設計變更其の他の事情に依り更に年期を二箇年延長の止むなきに至り、昭和三年度に始めて之等の應急施設をなせり。

又水道鐵管工事は區劃整理に依る建物移轉に伴ふ既設水道鐵管の移設竝增設を行ふものにして、豫算千五百萬圓を以て大正十五年度より昭和三年度に至る三箇年の繼續事業なりしも本工事は區劃整理其の他の復興事業を併進施行の關係に依り更に昭和五年度迄二箇年を延長し尙多少の殘工事に對しては昭和六年度に於て繼續施行せり。

二　施設

一　擴張速成工事

本事業は東京市繼續帝都復興費中水道復興費千萬圓の內四百七十萬圓を以て速成工事として前述の第二期に屬する工事中最も急を要する下貯水池の築造及配水本管の敷設(和田堀新宿線)境淨水場濾過池三面を大正十三年度より昭和三年度に至る五箇年繼續事業として實施せり、其の工程左の如し。

イ　村山貯水池築造　昭和元年度竣工

ロ　配水管敷設(二千五百七十間)　同

其の他の復興事業を併進施行の關係に依り更に昭和五年度迄二箇年を延長し尚多少の殘工事に對しては昭和六年度に於て繼續施行せり。

二　施　設

一　擴張速成工事

本事業は東京市繼續帝都復興費中水道復興費千萬圓の內四百七十萬圓を以て速成工事として前述の第二期に屬する工事中最も急を要する下貯水池の築造及配水本管の敷設(和田堀新宿線境淨水場濾過池三面を大正十三年度より昭和三年度に至る五箇年繼續事業として實施せり、其の工程左の如し。

イ　村山貯水池築造　昭和元年度竣工

ロ　配水管敷設(二千五百七十間)　同

ハ　境淨水場濾過池三面　昭和三年度竣工

二　復舊工事

本工事は水道復興費千萬圓の內五百三十萬圓を以て大正十二年度より昭和三年度迄六箇年の繼續事業にして工事內容左の如し。

イ　新水路

玉川新水路全延長二千三百三十間の內笹塚外五箇所の隧道決潰竝全水路を通じて築堤破壞個所の修理をなすものなり(昭和元年度竣工)

ロ　淀橋淨水場

(一)　沈澄池　沈澄池全四面(平均一面に付面積六、九二九坪)の修理を爲す(昭和元年度竣工)

(二)　喞筒室、汽罐室　現喞筒室及汽罐室等は煉瓦造の破損せるものを鐵筋混凝土造(喞筒室二一六坪、汽罐室竝篩炭室四三五坪)に改造す(昭和三年度竣工)

(三)　濾過池　濾過池全二十四面(平均一面に付一、四〇四坪)の修理を爲す(昭和二年度竣工)

(四)　電動喞筒　電動喞筒は將來高地給水の安全を確保する爲にして、電動喞筒機(約千九百馬力)一臺を新設す(昭和元年度竣工)

(五)　淨水池　淨水池の內一面(容積百萬立方尺)の修理を爲す(昭和元年度竣工)

(六)　淨水渠竝配水渠　淨水渠延長八百七十四間、排水渠延長二千四百四十一間を修理す(昭和二年

ハ　市內鐵管の鉸直修繕、鐵管引上工事、鐵管橋梁添架工事、其の他附屬器具修理漏水調査等をなす（昭和三年度竣工）

三　水道鐵管工事

本工事は燒失區域內に於ける既設水道鐵管の移轉竝增設を實施せむとするものにして、水道鐵管工事費豫算千五百萬圓を以て大正十五年度より昭和三年度に至る三箇年に完成の豫定なりしも區劃整理及其の他の復興事業を併進せざるべからざる關係上昭和五年度迄更に二箇年延長施行せしも多少の殘工事は昭和六年度に於て施行せり、其の工事內容左の如し。

鐵管總延長　四十五萬四千四百二十五間

內譯

街路敷に屬する分　移轉延長　一三〇、五四一間
　　增設延長　三〇八、一五六間
橋梁添架竝連絡に屬する分　移轉延長　七、六四一間
　　增設延長　一、八八八間
運河改修に屬する分　移轉延長　六、一九八間

而して街路敷に屬する配水小管は幅員六間以上の道路敷に於ては步車道を區劃せるものは複線式に兩側步道敷に各一條を敷設し以て路面鋪裝工事施行後に於ける鐵管の修理、給水管の取付等に依る道路の破壞及之に伴ふ交通上の障碍の減少を計る設計を爲せり。

第二項　下水道

一　事業概要

本市の下水道計畫は明治二十一年市區改正委員會の設置と共に調査に著手し明治四十一年漸く基本設計の確立を見るに至れり、本計畫の實施に當りては全計畫を三期に分ち施行する方針を採り明治四十四年第一期事業に、大正九年第二期事業に著手し、又第三期事業の計畫を確立し、一面未だ事業の著手に至らざる區域に於ても雨水の氾濫特に甚だしき八箇所に對しては別に下水渠一部速成工事とし

兩側歩道敷に各一條を敷設し以て路面鋪裝工事施行後に於ける鐵管の修理、給水管の取付等に依る道路の破壞及之に伴ふ交通上の障碍の減少を計る設計を爲せり。

第二項　下水道

一　事業概要

本市の下水道計畫は明治二十一年市區改正委員會の設置と共に調査に著手し明治四十一年漸く基本設計の確立を見るに至れり、本計畫の實施に當りては全計畫を三期に分ち施行する方針を採り明治四十四年第一期事業に、大正九年第二期事業に著手し、又第三期事業の計畫を確立し、一面未だ事業の著手に至らざる區域に於ても雨水の氾濫特に甚だしき八箇所に對しては別に下水渠一部速成工事として大正五年度より工事に著手し同九年度に於て完成せり、然るに第一期事業は大正十二年度に於て大部分完成し第二期事業亦半に達し、第三期事業將に實施期に入らむとして偶々大震火災に遭遇せるを以て之等の工事を打切り之を復興計畫に移し復興事業として豫算總額四千三百五十萬圓(國庫より二分の一の補助を受く)を以て既成部分の災害復舊第一期事業に屬する殘工事及第三期事業の一部を施行することに決し、大正十二年度より昭和三年度に至る六箇年繼續事業としたるも區劃整理の關係竝工事實施上の實績に依り豫算額を四千二十一萬千三百二十一圓に更正減額し年期を昭和四年度迄延長することゝし同年三月市會の議決を經たり、本事業中第二期に屬する殘工事及第三期事業の一部は區劃整理竝街路工事の關係に依り更に一箇年延長の必要を生じ同五年三月市會の議決を經て年度割を更正したるも尙多少の殘工事を生じたるを以て之は昭和六年度に於て繼續施行するものなり。

又水道應急整理工事として完成したる既設下水管渠の移轉竝增設を要し別に豫算百六十萬圓を以て大正十五年度より昭和三年度に至る三箇年繼續事業たりしが他の復興事業關係に依り更に年期を一箇年延長施行せり。

下水系統

第一區

(一)　區域

芝・麻布・赤坂・麹町・四谷・牛込・小石川・日本橋の八區竝本鄕・神田・京橋の大部分及下谷の一部

(二)　面積　千四百十八萬六千坪
(三)　喞筒場數　麹町區錢瓶町及芝區芝浦第四號埋立地先
(四)　處分場　府下六鄕川口

第二　區域

(一)　區域　淺草區の全部及下谷區の大部分、神田・本鄕區の一部
(二)　面積　約二百四十九萬五千坪
(三)　喞筒場數　神田區和泉町及淺草區田町
(四)　處分場　府下北豐島郡三河島町

第三　區域

(一)　區域　本所・深川區の全部及京橋區の內月島
(二)　面積　約三百七十八萬七千坪
(三)　喞筒場數　本所區業平橋附近及三ノ橋附近、深川區豐住町、京橋區月島初見橋附近
(四)　處分場　府下南葛飾郡砂町荒川放水路口

二　施設

一　災害復舊工事

明治四十四年度より大正十二年度に至る繼續事業として施行したる第一期下水改良事業(下水道設計第二區の內淺草の大部分、下谷・神田・本鄕の一部)及下水渠一部速成工事の內震災に因り破壞又は燒失したる施設の復舊工事にして、其の被害の主なるものは、三河島汚水處分場に於ては給水槽の倒潰及沈澱池・濾過床の龜裂、淺草喞筒場に於ては本館建物・喞筒諸機械・附屬建物の燒失及排水下水管渠・附屬構造物等の損傷なり、而して之等に對して豫算三十七萬四千圓(事務費及諸費を除く)を以て震災後直に其の復舊に著手し、大正十二年度に於て完成の豫定なりしも、材料勞力の供給困難なりしと一部設計變更等の爲豫算を三十一萬八千三百六十九圓に減額すると同時に年期を一箇年繰延べ大正十三年度に於て工事の終了を見たり、之が主要工事左の如し。

(1)　三河島汚水處分場

災害復舊工事

明治四十四年度より大正十二年度に至る繼續事業として施行したる第一期下水改良事業(下水道設計第二區の內淺草の大部分、下谷・神田・本鄕の一部)及下水渠一部速成工事の內震災に因り破壞又は燒失したる施設の復舊工事にして、其の被害の主なるものは、三河島汚水處分場に於ては給水槽の倒潰及沈澱池・濾過床の龜裂、淺草喞筒場に於ては本館建物・喞筒諸機械・附屬建物の燒失及排水下水管渠附屬構造物等の損傷なり、而して之等に對して豫算三十七萬四千圓(事務費及諸費を除く)を以て震災後直に其の復舊に著手し、大正十二年度に於て完成の豫定なりしも、材料勞力の供給困難なりしと一部設計變更等の爲豫算を三十一萬八千三百六十九圓に減額すると同時に年期を一箇年繰延べ大正十三年度に於て工事の終了を見たり、之が主要工事左の如し。

(1) 三河島汚水處分場

沈澱池竝導水渠合流渠修理

壁部	据置	約	五、三三三尺
笠石	据替	約	五、四〇〇尺
壁龜裂		約	六四箇所
沈澱池床		約	六箇所
導水渠合流橋梁		約	八箇所
濾過池修築		約	二四箇所

高置給水槽折損修築

排水渠竝コンクリート管修理　約　二五箇所

主喞筒送水管据付修理　約　九本

護岸木柵修理其の他

(2) 淺草喞筒場

雨水渠門扉修理			一組
喞筒竝附屬機械修理	喞筒		九臺
	起重機		一臺
	電動機		九臺
電動機配電盤	配電盤		一〇臺

場内電線路其の他		
喞筒場本館	約	一五八坪
事務所	約	五四五坪
倉庫及便所	約	四八坪
公舍		三棟

(3)

下水管渠、倉庫、門其の他		
事務所、附屬家	修理	
人孔	約	三〇〇箇所
桝竝取付管	約	一、二〇〇箇所
角落竝柄蓋	約	一〇箇所
橋梁	約	二箇所
雨水開渠	約	一、八〇〇尺
藍染排水路	約	三〇〇尺
枝線路	約	一〇、〇〇〇尺
幹線路	約	一、〇〇〇尺
速成線路	約	一、〇〇〇尺

備考

右は都市計畫事業として大正十二年度及大正十三年度の二箇年に繼續執行するものにして、都市計畫に依り決定せられたるものなり。

二　第一期下水道事業殘工事

東京市下水道設計第二區(淺草の大部、下谷、神田、本郷の一部)の工事は明治四十四年度より大正十二年度に至る十三箇年繼續の第一期事業として執行し、震災前に於て既に其の大部分を竣功したるも尙管渠約四千四百五十尺、人孔四十四個、取付管約千三百五十尺及三河島汚水處分場事務所、公舍、附屬建物の新設工事等若干の未成部分ありしが爲、是等殘工事全部を復興事業の一部とし、豫算二十二萬

幹線路修理		約	一、〇〇〇尺
速成線路修理		約	一、〇〇〇尺
備考			
右は都市計畫事業として大正十二年度及大正十三年度の二箇年に繼續執行するものにして、都市計畫に依り決定せられたるものなり。			
二 第一期下水道事業殘工事			

東京市下水道設計第二區(淺草の大部、下谷・神田・本鄉の一部)の工事は明治四十四年度より大正十二年度に至る十三箇年繼續の第一期事業として執行し、震災前に於て既に其の大部分を竣功したるも尙管渠約四千四百五十尺、人孔四十四個、取付管約千三百五十尺及三河島汚水處分場事務所、公舍、附屬建物の新設工事等若干の未成部分ありしが爲、是等殘工事全部を復興事業の一部とし、豫算二十二萬六千三百十七圓(事務費及諸費を除く)を以て大正十二年度に之が完成の豫定なりしも材料勞力の供給困難なりしと設計一部變更等の爲更に年期を一箇年繰延べ大正十三年度に於て工事の終了を見たり。

三 第二期事業殘工事

大正九年度より昭和二年度に至る繼續事業として施行中に係る第二期下水道改良事業(東京市下水道設計第一區の內、麹町區丸ノ內・日本橋・京橋の全部、芝の一部)は既に幹線竝錢瓶町喞筒場工事に著手し、震災當時迄の實績二割一分六厘に達し、相當進捗を見たりと雖殘工事は之を打切り、他は之を帝都復興計畫に移し、芝浦喞筒場の位置其の他多少の設計變更をなし、豫算千五百十一萬圓事務費及諸費を除く)事業年度を大正十二年度より昭和三年度に至る六箇年繼續事業として工事を執行の所、豫算を千三百四十萬九千八百二十三圓に更正減額し、設計變更其の他の事情に依り昭和三年三月市會に於て豫算を千二百八十九萬七千六百八十圓に減額し年期を昭和四年度迄一箇年の延長を見たりと雖、區劃整理の關係竝工事實施上の實績に鑑み同五年三月市會の議決を經て年期を更に一箇年延長し昭和五年度に於て完成を見る豫定なりしが殘工事を生じたるを以て之は昭和六年度に於て施行せり、之が主要工事左の如し。

施行地域　日本橋區・京橋區(月島を除く)全部、麹町區丸ノ內・芝區の一部

面積　約二百四十六萬二千坪

下水線路　東京市に於ける復興事業竝豫算

類別	總延長（約）	震災前竣成延長（約）	未竣成延長（約）
幹線路	四五、九五六尺	四、二三二尺	四一、七二四尺
枝線路	六〇七、一九〇	一〇八、三三〇	四九八、八六〇
合計	六五三、一四六（一〇八、八五八間）	一二、五六二（一八、七〇〇間）	五四〇、五八四（九〇、〇九八間）

卸筒場
錢瓶町卸筒場
位置　麹町區錢瓶町
面積　約四千百五十坪
下水量　第二期工事區域内　旱天時最大　毎秒現在三〇　將來六五・五六立方尺
雨天時最大　毎秒現在五三　將來一一四立方尺
集水池　一池幅二十尺　長四十尺　深二十四尺五寸
沈砂池　二池各幅十五尺　長百三十三尺　深十四尺五寸
卸筒　五臺
芝浦卸筒場
位置　芝浦三號埋立地先
面積　約五千四百六十坪
下水量　第二期工事區域内　旱天時最大　毎秒現在三六　將來七九立方尺
雨天時最大　毎秒現在一四四立方尺
沈砂池　二池各幅二十三尺　長九十五尺　深十七尺五寸
卸筒　六臺

四　第三期事業の一部

吐口一時的施設
沈澱池　二池各有蓋長二七〇尺　幅七〇尺　水深七尺
滓槽　一個三十五尺角　深十二尺乃至十六尺

位置	芝浦三號埋立地先
面積	約五千四百六十坪
下水量	第二期工事區域內　旱天時最大　毎秒現在三六　將來七九立方尺 雨天時最大　毎秒現在一四四立方尺
沈砂池	二池各幅二十三尺　長九十五尺　深十七尺五寸
喞筒	六臺

吐口一時的施設

沈澱池　二池各有蓋長二七〇尺　幅七〇尺　水深七尺

滓渣槽　一個三十五尺角　深十二尺乃至十六尺

四　第三期事業の一部

既定第一期及第二期下水道改良事業施行區域以外に對しては曩に大正十一年度に於て實施調査を完了し、第三期下水道改良事業として將に實施期に入らむとして這般の災厄に遭遇したるを以て之亦復興計畫に移し市區竝隣接町村の將來の發展を顧慮し、

(一)　排水面積竝下水道延長の增加

(二)　市區域外一部下水の收容

(三)　第一區汚水處分場位置變更

(四)　第三區喞筒場の設置

(五)　第三區汚水處分場位置變更

(六)　上述設計變更竝街路計畫に伴ふ幹枝線の變更等を必要とするに至りし爲既定設計の一部變更を行ひ、差當り燒失區域の內第一區及第三區に排水上必要なる基幹工事を執行するこゝし、豫算二千六百十八萬六千圓(事務費及諸費を除く)事業年度を大正十二年度より昭和三年度に至る六箇年繼續事業としたるも、區劃整理の關係竝工事實施上の實績に依り昭和三年三月の市會に於て豫算を二千百六十八萬四千二百十九圓に更正減額し、年期を昭和四年迄一箇年延長を爲せりと雖右年度內には工事の完了を見る能はず同五年三月三十一日市會の議決を經て更に豫算を二千百四十九萬七千百十五圓に更正減額し年期を一箇年延長し昭和五年度に於て事業の終了を見る豫定なりしが殘工事を生じたるを以て之は昭和六年度に於て施行することゝせり、之が主要

工事左の如し。

第一區工事

施行區域　神田區の大部、麹町區芝區の一部

面積　約七十萬一千坪

下水線路　施行區域内幹線全部、枝線約五割

第三區工事

施行區域　本所深川兩區

面積　約三百五十萬三千坪

下水線路　施行地區域内幹線全部、枝線約四割五分

幹線路　三五、三〇二尺

枝線路　一八一、二六三尺

計　**二一六、五六五尺**

分區別	幹線路	枝線路	計
高	一五、八四二尺	一九、七〇五尺	三五、五四七尺
中	二〇、一三二	六三、一五八	八三、二九〇
低	一〇、一八七	八二、八六三	九三、〇五〇
計	**五六、一六一**	**一六九、七二六**	**二二五、八八七**

汚水處分場

位置及面積　砂町荒川放水路口　約七萬五千坪（現在四萬五千坪將來三萬坪增設）

設備能力　旱天時一日最大四百二十萬立方尺　雨天時最大每秒百五十立方尺

主要設備

面積　約三百五十萬三千坪
下水線路　施行地區域內幹線全部、枝線約四割五分
幹線路　三五、三〇二尺
枝線路　一八一、二六三尺
計　二一六、五六六尺
汚水處分場　位置及面積　砂町荒川放水路口　約七萬五千坪（現在四萬五千坪將來三萬坪增設）
設備能力　旱天時一日最大四百二十萬立方尺雨天時最大每秒百五十立方尺
主要設備　沈砂池　二池各長六十尺　幅十八尺　深八尺五寸
喞筒　四臺
沈澱池　三池各長三六〇尺　幅九〇尺　將來增設を要す
殺菌設備　鹽素殺菌法
滓渣槽　一個徑八十尺　深八尺五寸　將來增設一個
業平喞筒場　位置及面積　本所區中ノ鄕八軒町　約一、四六五坪
設備能力　雨水喞筒　最大雨水量每秒七〇〇立方尺揚程十尺
汚水喞筒　最大汚水量每秒三一立方尺揚程十八尺
沈砂池　三臺各四〇〇馬力電動機附
三之橋喞筒場　位置及面積　本所區德右衞門町　約一、五二九坪
設備能力　雨水喞筒　最大雨水量每秒九一三立方尺揚程十尺
沈砂池　最大汚水量每秒七五立方尺揚程十八尺
四臺五五乃至一一〇馬力電動機附
三臺二五乃至七五馬力電動機附
四個各幅十五尺　長百尺　深二十二尺
四個各幅二十尺　長百尺　深二十四尺五寸

第五章　東京市に於ける復興事業竝豫算

木場喞筒場　深川區扇橋町末廣橋南
位置及面積　最大雨水量毎秒八五一立方尺揚程十尺
設備能力　最大汚水量毎秒一四一立方尺揚程十八尺
雨水喞筒　四臺各四五〇馬力電動機付
汚水喞筒　四臺二二、五乃至四五馬力電動機付
沈砂池　四個各幅十六尺　長九十尺　深二十七尺

五　下水道應急整理工事

本工事は區劃整理に伴ひ街路の改廢其の他家屋移轉等直接支障となる既設下水管渠の移轉整理を行ふものにして資源を政府の補償金に需め豫算百六十萬圓を以て大正十五年度より昭和三年度に至る三箇年の繼續事業として施行中の處他の復興事業關係に依り更に年期を一箇年延長し昭和四年度を以て竣功せり、其の竣功移轉管渠延長一萬六千七百五十三間なり。

第三項　小公園

一　事業概要

本事業は大震災に因る燒失區域内即ち麹町、神田、日本橋、京橋、芝、本郷、下谷、淺草、本所、深川の各區に亘り九百坪内外の小公園五十二箇所(合計面積約四萬四千餘坪)を小學校に隣接し、兒童の利用に重きを置きたる施設をなせるものにして、本市繼續帝都復興費中公園費千三百七十五萬二千百七十五圓(國庫より三分の一の補助を受く)を以て大正十二年度より昭和五年度に至る八箇年に亘り五十二箇所の用地取得竝公園施設をなすものなりと雖田原、御徒町、小島、金龍、入谷、蠣殻町及富士の七小公園は中途計畫變更等の爲豫定の進捗を見る能はずして殘工事を生じたるを以て、之は既定豫算の範圍に於て昭和六年度に於て施行せり。

本事業は東京都市計畫竝都市計畫事業として大正十三年七月三日内閣の認可を得同年同月四日内務省告示第四百二十四號を以て新設竝執行年割の決定を告示せられ、事業の一部は其の年割の範圍内に於て土地區劃整理事業として是を執行し得ることゝなれり。

百坪內外の小公園五十二箇所(合計面積約四萬四千餘坪)を小學校に隣接し、兒童の利用に重きを置きたる施設をなせるものにして、本市繼續帝都復興費中公園費千三百七十五萬二千百七十五圓(國庫より三分の一の補助を受く)を以て大正十二年度より昭和五年度に至る八箇年に亘り五十二箇所の用地取得竝公園施設をなすものなりと雖田原、御徒町、小島、金龍、入谷、蠣殻町及富士の七小公園は中途計畫變更等の爲豫定の進捗を見る能はずして殘工事を生じたるを以て、之は既定豫算の範圍に於て昭和六年度に於て施行せり。

本事業は東京都市計畫竝都市計畫事業として大正十三年七月三日內閣の認可を得同年同月四日內務省告示第四百二十四號を以て新設竝執行年割の決定を告示せられ、事業の一部は其の年割の範圍內に於て土地區劃整理事業として是を執行し得ることゝなれり。

尙政府に於ても復興事業として濱町公園(約一萬一千坪)隅田公園(五萬二千七百坪)錦糸公園(一萬七千坪)の三公園合計面積八萬七百坪を新設し、政府の帝都復興事業費中公園費一千百九十萬圓を以て大正十二年度より昭和五年度に至る八箇年に亘り全部の公園施設を了するものなり。

備考

復興計畫前後に於ける本市の公園

種別	既設市公園		復興計畫に依る公園		計		準公園		合計	
公園面積數	三三箇所	六四八、六三六坪	五五箇所	二四、九二三坪	八八箇所	七七三、五九七坪	二箇所	一八八、六五九坪	九九箇所	九六三、二五三坪
市面積に對する公園面積割合		〇・〇二七	—		〇・〇三三		—		〇・〇四〇	
市人口一人當り公園面積		〇・二八坪	—		〇・三四坪		—		〇・四三坪	

本表は東京市面積二四、三二四、八九九坪人口二、二九四、六〇〇人(昭和四年十一月一日現在)として計算せり。

準公園は富士見町公園、明治神宮外苑、御渡歐記念園(四谷區尾張町)、水野ケ原兒童遊園、藏前兒童遊園、法恩寺兒童遊園、常盤橋門跡、元衞町廣場、上野廣小路廣場、中ノ島廣場及九段廣場を指すものとす。

二　施設

本事業敷地は小學校に隣接したる土地を選定し、一般公園と異り校庭の延長として平日晝間は主として兒童の運動遊戲場となり、他は方面的休養公園として休日又は兒童放課後竝夜間は一般市民の散策休養の場所たらしめ、且非常時は防火其の他避難場たらしむる等特殊機能を有する小公園にして、各面積の約四割を樹林花園に充て殘餘を廣場とし、小學校に接する部分の外圍は校内取締に必要なる程度の柵となし、二箇所以上の連絡通路を設け、道路側は非常の際容易に乘越え得る低き鐵柵となし、二箇所以上の出入口を設け尙飮用水栓、照明裝置、公衆用便所、園丁詰所等の一般公園的施設をも設置し、何れも其の環境を顧慮して各々特色を發揮せしめたる設備を爲すものなり、小公園の名稱、位置及面積左の如し。

公園名	位置	面積 平方米 坪	工事費	起工年月 竣功年月	施設概況
上六	麴町區上六番町	二、七二八・二三 八二五・二九	三、五〇八円	三、六 四、三	徒渉池一、砂場一、運動器三
西小川	神田區西小川町一丁目	二、〇八四・四三 六三〇・五四	一一、三七九	四、一三 五、九	砂場一 運動器五
錦華	同　裏猿樂町	二、七五八・九八 八三四・五九	一六、九四四	三、五 四、二	砂場一 運動器三
淡路	同　淡路町二丁目	二、五〇〇・七九 七五六・四九	一三、二八七	四、六 五、三	同
神田	同　新銀町 關口町	二、二六三・三一 六八四・六五	一三、五七〇	五、六 五、一三	同

練成	同	五軒町	一、九九三・三九 六〇三・〇〇	一三、五七〇	五、六 五、三	同
芳林	同	末廣町	一、九五三・八二 五九一・〇三	一〇、五七六	四、一〇 五、七	同
常盤	日本橋區	本銀町一丁目 本石町一丁目	二、〇四九・七二 六二〇・〇四	一三、一七〇	五、七 六、一	同
久松	同	久松町	一、九八四・〇〇 六〇〇・一六	一一、〇八二	四、二 五、〇	同
十思	同	小傳馬上町	二、〇八四・二六 六三〇・四九	一〇、九七三	四、二 五、九	同
箱崎	同	箱崎町三丁目	二、四三五・五〇 七三六・七四	一八、五六八	三、一〇 四、二	同
蠣殼町	同	蠣殼町三丁目	四、一五四・二八 一、二五六・二七	一〇、六八二	五、九 六、三	同
鐵砲洲	京橋區	新湊町一丁目	二、九一三・四〇 八八四・三三	一三、〇八二	四、九 五、八	同
京橋	同	金六町	二、一九三・六九 六六三・五九	一一、四〇八	四、九 五、九	同
築地	同	築地一丁目	二、九〇五・七五 八七八・九九	一三、五三九	四、二 五、九	同
越前堀	同	越前堀一丁目 銀座一丁目	三、〇六〇・二三 九二五・七二	一三、一九〇	四、一〇 五、七	同
月島第一	同	月島東仲通 三、四丁目	三、七六八・六〇 一、一四〇・〇〇	二六、五一九	一五、八 元、三	同
月島第二	同	月島西仲通 八、九丁目	四、七一〇・一四 一、四二五・〇〇	三八、九九四	一五、二 一五、七	水泳場(二五×一〇米)一、徒渉池一、砂場一、運動器四

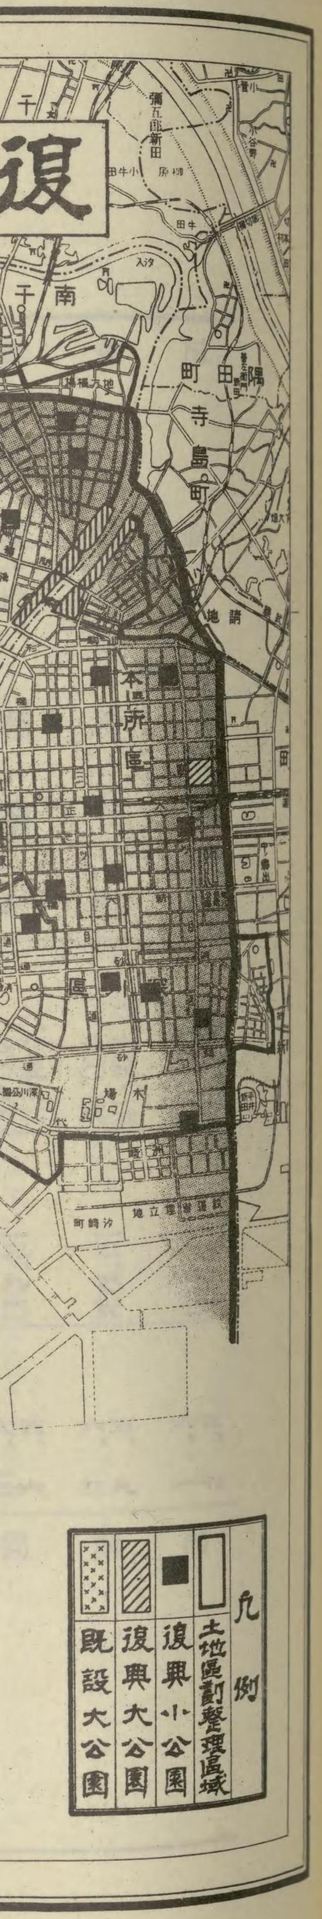

櫻田	芝區愛宕下町一丁目	二、六七一・〇七 八〇八・〇〇	一三、七〇〇	五、六 五、一三	砂場一 運動器三
南櫻	同　南佐久間町二丁目	二、九〇四・八三 八七八・七一	二〇、〇五七	三、一〇 四、九	同
新花	本郷區湯島新花町	二、九四七・七七 八九一・七〇	二四、〇五八	一四、三 一五、八	同
元町	同　元町一丁目	三、五一九・五〇 一、〇六四・六五	三五、一六二	三、六 五、三	砂場二 運動器五
東盛	下谷區金杉下町	三、〇二〇・一六 九一三・六〇	一八、一三一	三、二 三、一二	砂場一 運動器三
山伏	同　山伏町	二、三一四・二一 七〇〇・〇五	一一、一六八	四、一二 五、一〇	同
入谷	同　入谷町 金杉上町	一、六七八・五一 五〇七・七五	一一、九七〇	五、九 六、三	同
西町	同　西町 南稲荷町	二、九〇七・九七 八七九・六六	一一、九〇七	四、一〇 五、九	同
御徒町	同　御徒町二丁目	三、三〇五・二二 九九九・八三	一五、六二三	五、八 六、一	同
石濱	淺草區玉姫町	二、九七一・四七 八九八・八七	一三、七九五	四、三 五、七	同
千束	同　千束町二丁目	二、二二一・三二 六七一・九五	一〇、二二三	四、六 五、三	同
小島	同　小島町	二、八〇一・〇九 八四七・三三	一三、二八〇	五、八 六、一	同
富士	同　象潟町	二、四〇六・三一 七二七・九一	一三、四二八	五、一一 六、三	同

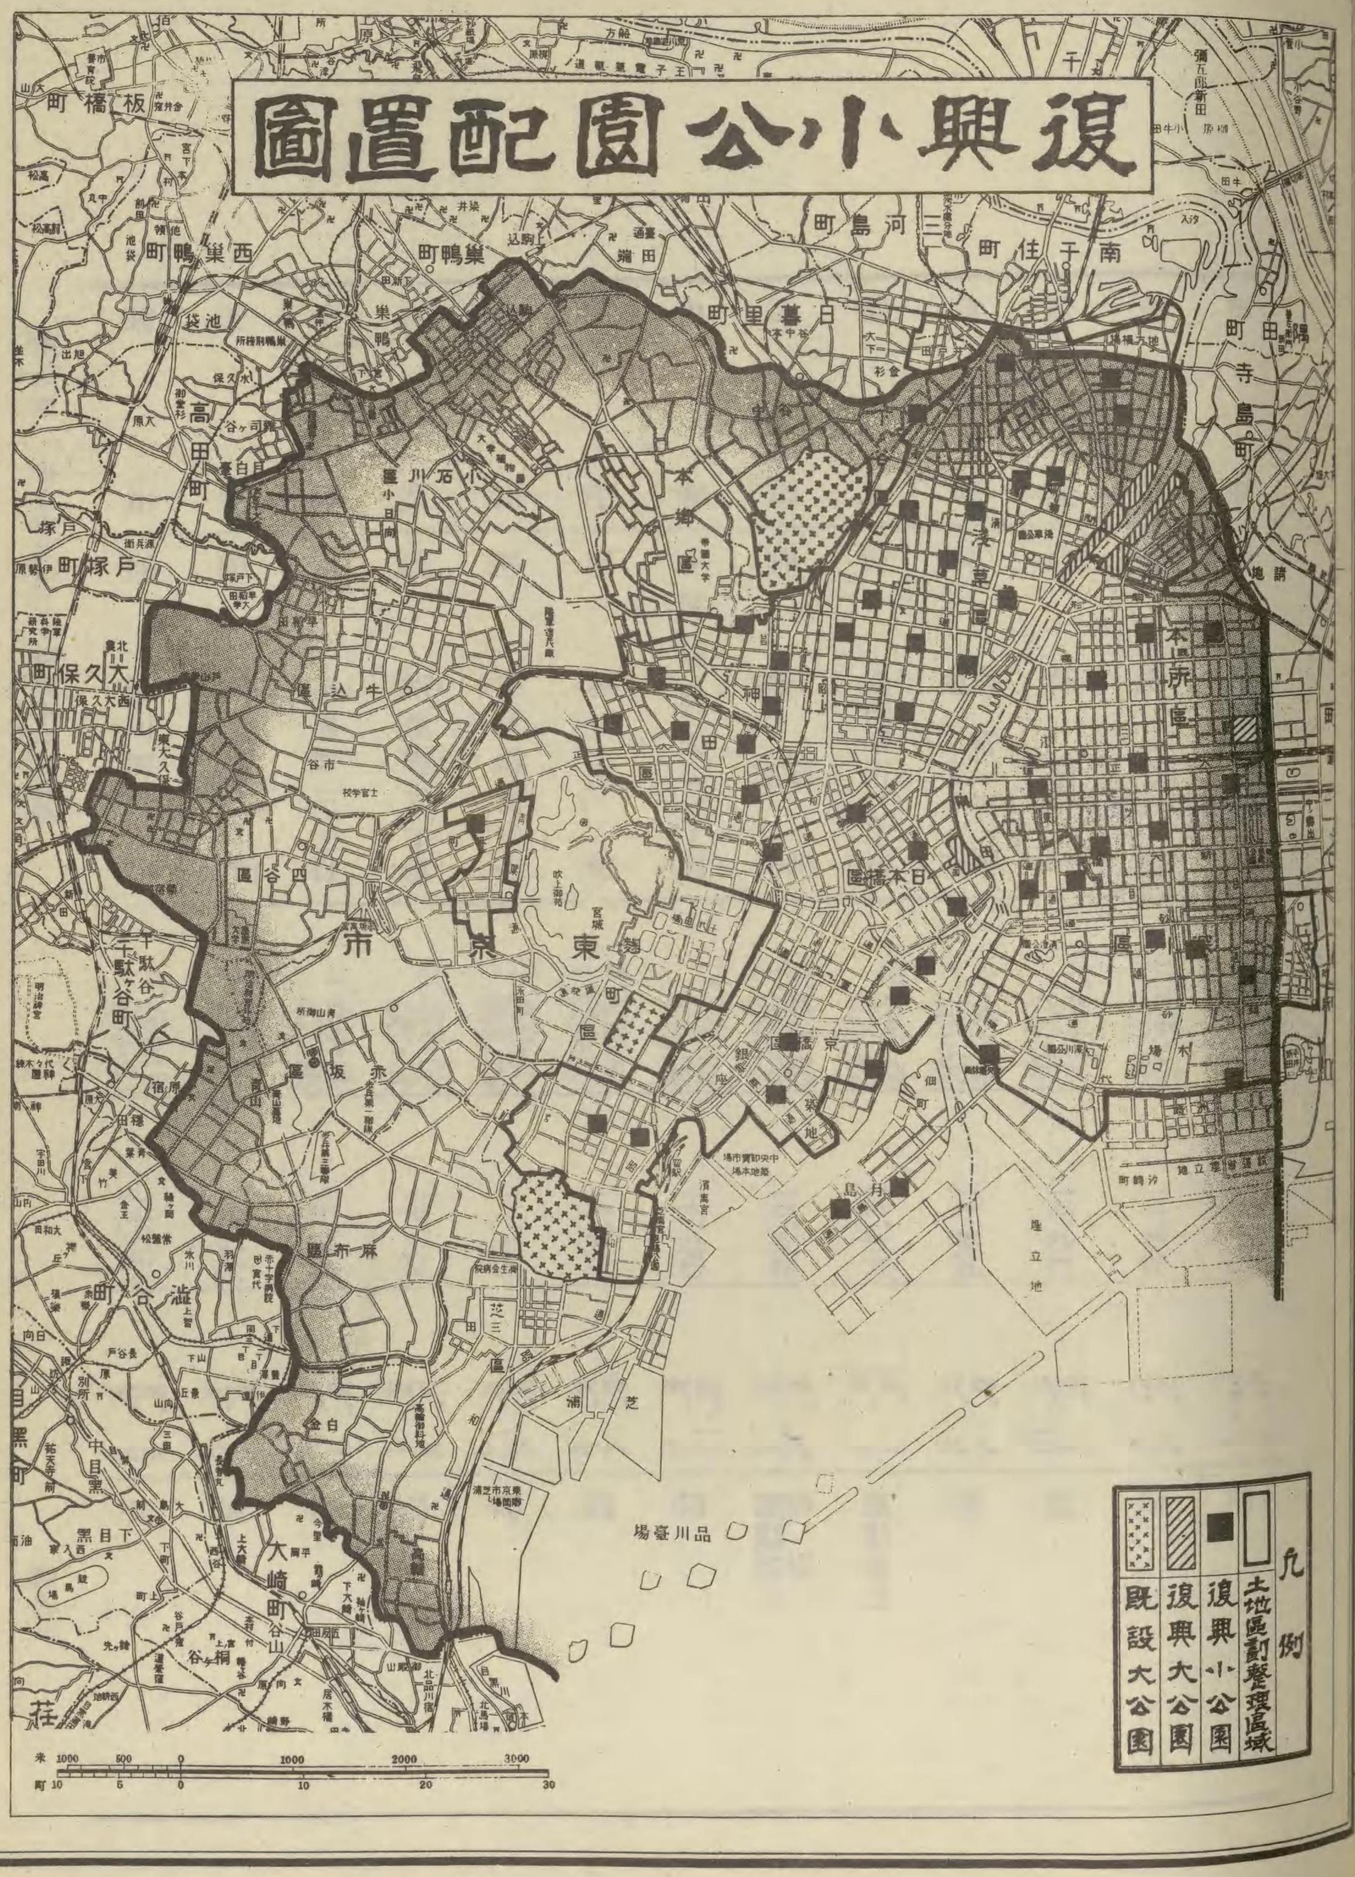

千	東	同	千束町二丁目	二、二二一・三二 六七一・九五	二、四〇六・三一 七二七・九一
小	島	同	小島町	二、八〇一・〇九 八四七・三三	一三、二八〇
富	士	同	象潟町	二、四〇六・三一 七二七・九一	一二、四二八

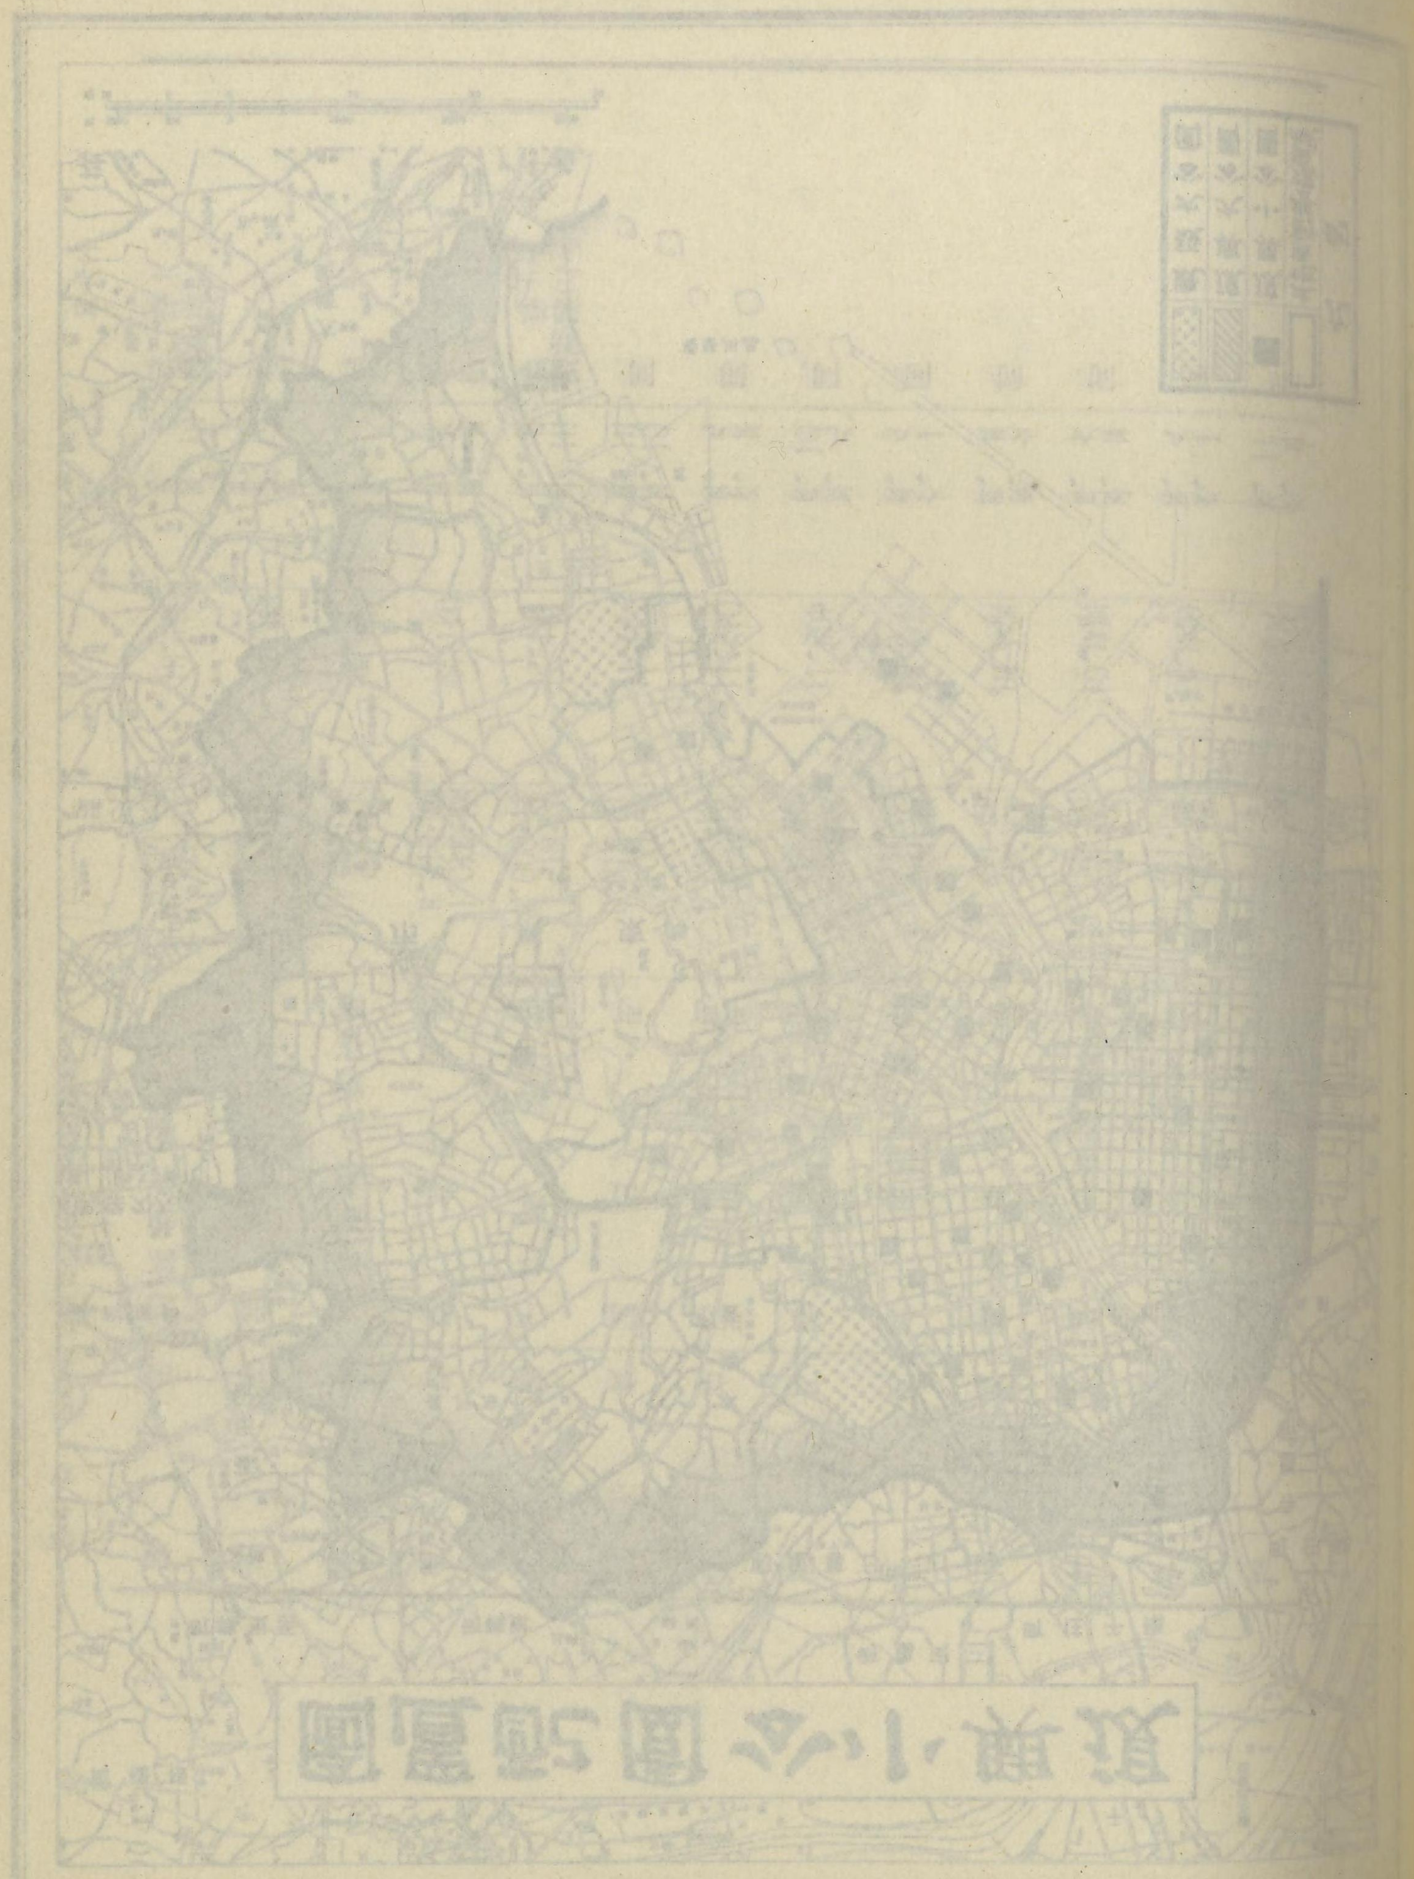

頁	區	町
一	麹町區	永田町一丁目
二	同	平河町
三	同	麹町
四	同	隼町
五	同	三番町
六	同	六番町
七	同	一番町
八	麹町區	富士見町一丁目
九	同	富士見町二丁目
一〇	同	富士見町三丁目
一一	同	富士見町四丁目
一二	同	富士見町五丁目
一三	同	富士見町六丁目
一四	同	富士見町
一五	同	飯田町一丁目
一六	同	飯田町二丁目
一七	同	飯田町三丁目
一八	同	飯田町四丁目
一九	同	飯田町五丁目
二〇	同	飯田町六丁目
二一	同	飯田町
二二	同	九段
二三	同	九段北一丁目
二四	同	九段北二丁目
二五	同	九段北三丁目
二六	同	九段北四丁目
二七	同	九段北
二八	同	九段南一丁目
二九	同	九段南二丁目
三〇	同	九段南三丁目
三一	同	九段南四丁目
三二	同	九段南
三三	同	一番町
三四	同	二番町
三五	同	三番町
三六	同	四番町
三七	同	五番町
三八	同	六番町
三九	同	七番町
四〇	同	八番町
四一	同	九番町
四二	麹町區	十番町
四三	同	紀尾井町
四四	同	上六番町
四五	同	上二番町
四六	同	上三番町
四七	同	上四番町
四八	同	上五番町
四九	同	上七番町
五〇	同	上八番町
五一	同	上九番町
五二	同	上十番町
五三	同	上
五四	同	下六番町
五五	同	下二番町
五六	同	下三番町
五七	同	下四番町
五八	同	下五番町
五九	同	下七番町
六〇	同	下八番町
六一	同	下九番町
六二	同	下十番町
六三	同	下
六四	同	一丁目
六五	同	二丁目
六六	同	三丁目
六七	同	四丁目
六八	同	五丁目
六九	同	六丁目
七〇	同	七丁目
七一	同	八丁目
七二	同	九丁目
七三	同	十丁目
七四	同	十一丁目
七五	同	十二丁目
七六	同	十三丁目
七七	同	十四丁目
七八	同	十五丁目
七九	同	十六丁目
八〇	同	十七丁目
八一	同	十八丁目
八二	同	十九丁目
八三	同	二十丁目
八四	同	二十一丁目
八五	同	二十二丁目
八六	同	二十三丁目
八七	同	二十四丁目
八八	同	二十五丁目
八九	同	二十六丁目
九〇	同	二十七丁目
九一	同	二十八丁目
九二	同	二十九丁目
九三	同	三十丁目
九四	同	三十一丁目
九五	同	三十二丁目
九六	同	三十三丁目
九七	同	三十四丁目
九八	同	三十五丁目
九九	同	三十六丁目
一〇〇	同	三十七丁目
一〇一	同	三十八丁目
一〇二	同	三十九丁目
一〇三	同	四十丁目
一〇四	同	四十一丁目
一〇五	同	四十二丁目
一〇六	同	四十三丁目
一〇七	同	四十四丁目
一〇八	同	四十五丁目
一〇九	同	四十六丁目
一一〇	同	四十七丁目
一一一	同	四十八丁目
一一二	同	四十九丁目
一一三	同	五十丁目
一一四	同	五十一丁目
一一五	同	五十二丁目
一一六	同	五十三丁目
一一七	同	五十四丁目
一一八	同	五十五丁目
一一九	同	五十六丁目
一二〇	同	五十七丁目
一二一	同	五十八丁目
一二二	同	五十九丁目
一二三	同	六十丁目
一二四	同	六十一丁目
一二五	同	六十二丁目
一二六	同	六十三丁目
一二七	同	六十四丁目
一二八	同	六十五丁目
一二九	同	六十六丁目
一三〇	同	六十七丁目
一三一	同	六十八丁目
一三二	同	六十九丁目
一三三	同	七十丁目
一三四	同	七十一丁目
一三五	同	七十二丁目
一三六	同	七十三丁目
一三七	同	七十四丁目
一三八	同	七十五丁目
一三九	同	七十六丁目
一四〇	同	七十七丁目
一四一	同	七十八丁目
一四二	同	七十九丁目
一四三	同	八十丁目
一四四	同	八十一丁目
一四五	同	八十二丁目
一四六	同	八十三丁目
一四七	同	八十四丁目
一四八	同	八十五丁目
一四九	同	八十六丁目
一五〇	同	八十七丁目
一五一	同	八十八丁目
一五二	同	八十九丁目
一五三	同	九十丁目
一五四	同	九十一丁目
一五五	同	九十二丁目
一五六	同	九十三丁目
一五七	同	九十四丁目
一五八	同	九十五丁目
一五九	同	九十六丁目
一六〇	同	九十七丁目
一六一	同	九十八丁目
一六二	同	九十九丁目
一六三	同	百丁目
一六四	同	百一丁目
一六五	同	百二丁目
一六六	同	百三丁目
一六七	同	百四丁目
一六八	同	百五丁目
一六九	同	百六丁目
一七〇	同	百七丁目
一七一	同	百八丁目
一七二	同	百九丁目
一七三	同	百十丁目
一七四	同	百十一丁目
一七五	同	百十二丁目
一七六	同	百十三丁目
一七七	同	百十四丁目
一七八	同	百十五丁目
一七九	同	百十六丁目
一八〇	同	百十七丁目
一八一	同	百十八丁目
一八二	同	百十九丁目
一八三	同	百二十丁目
一八四	同	百二十一丁目
一八五	同	百二十二丁目
一八六	同	百二十三丁目
一八七	同	百二十四丁目
一八八	同	百二十五丁目
一八九	同	百二十六丁目
一九〇	同	百二十七丁目
一九一	同	百二十八丁目
一九二	同	百二十九丁目
一九三	同	百三十丁目
一九四	同	百三十一丁目
一九五	同	百三十二丁目
一九六	同	百三十三丁目
一九七	同	百三十四丁目
一九八	同	百三十五丁目
一九九	同	百三十六丁目
二〇〇	同	百三十七丁目
二〇一	同	百三十八丁目
二〇二	同	百三十九丁目
二〇三	同	百四十丁目
二〇四	同	百四十一丁目
二〇五	同	百四十二丁目
二〇六	同	百四十三丁目
二〇七	同	百四十四丁目
二〇八	同	百四十五丁目
二〇九	同	百四十六丁目
二一〇	同	百四十七丁目
二一一	同	百四十八丁目
二一二	同	百四十九丁目
二一三	同	百五十丁目
二一四	同	百五十一丁目
二一五	同	百五十二丁目
二一六	同	百五十三丁目
二一七	同	百五十四丁目
二一八	同	百五十五丁目
二一九	同	百五十六丁目
二二〇	同	百五十七丁目
二二一	同	百五十八丁目
二二二	同	百五十九丁目
二二三	同	百六十丁目
二二四	同	百六十一丁目
二二五	同	百六十二丁目
二二六	同	百六十三丁目
二二七	同	百六十四丁目
二二八	同	百六十五丁目
二二九	同	百六十六丁目
二三〇	同	百六十七丁目
二三一	同	百六十八丁目
二三二	同	百六十九丁目
二三三	同	百七十丁目
二三四	同	百七十一丁目
二三五	同	百七十二丁目
二三六	同	百七十三丁目
二三七	同	百七十四丁目
二三八	同	百七十五丁目
二三九	同	百七十六丁目
二四〇	同	百七十七丁目
二四一	同	百七十八丁目
二四二	同	百七十九丁目
二四三	同	百八十丁目
二四四	同	百八十一丁目
二四五	同	百八十二丁目
二四六	同	百八十三丁目
二四七	同	百八十四丁目
二四八	同	百八十五丁目
二四九	同	百八十六丁目
二五〇	同	百八十七丁目
二五一	同	百八十八丁目
二五二	同	百八十九丁目
二五三	同	百九十丁目
二五四	同	百九十一丁目
二五五	同	百九十二丁目
二五六	同	百九十三丁目
二五七	同	百九十四丁目
二五八	同	百九十五丁目
二五九	同	百九十六丁目
二六〇	同	百九十七丁目
二六一	同	百九十八丁目
二六二	同	百九十九丁目
二六三	同	二百丁目
二六四	同	二百一丁目
二六五	同	二百二丁目
二六六	同	二百三丁目
二六七	同	二百四丁目
二六八	同	二百五丁目
二六九	同	二百六丁目
二七〇	同	二百七丁目
二七一	同	二百八丁目
二七二	同	二百九丁目
二七三	同	二百十丁目
二七四	同	二百十一丁目
二七五	同	二百十二丁目
二七六	同	二百十三丁目
二七七	同	二百十四丁目
二七八	同	二百十五丁目
二七九	同	二百十六丁目
二八〇	同	二百十七丁目
二八一	同	二百十八丁目
二八二	同	二百十九丁目
二八三	同	二百二十丁目
二八四	同	二百二十一丁目
二八五	同	二百二十二丁目
二八六	同	二百二十三丁目
二八七	同	二百二十四丁目
二八八	同	二百二十五丁目
二八九	同	二百二十六丁目
二九〇	同	二百二十七丁目
二九一	同	二百二十八丁目
二九二	同	二百二十九丁目
二九三	同	二百三十丁目
二九四	同	二百三十一丁目
二九五	同	二百三十二丁目
二九六	同	二百三十三丁目
二九七	同	二百三十四丁目
二九八	同	二百三十五丁目
二九九	同	二百三十六丁目
三〇〇	同	二百三十七丁目
三〇一	同	二百三十八丁目
三〇二	同	二百三十九丁目
三〇三	同	二百四十丁目
三〇四	同	二百四十一丁目
三〇五	同	二百四十二丁目
三〇六	同	二百四十三丁目
三〇七	同	二百四十四丁目
三〇八	同	二百四十五丁目
三〇九	同	二百四十六丁目
三一〇	同	二百四十七丁目
三一一	同	二百四十八丁目
三一二	同	二百四十九丁目
三一三	同	二百五十丁目
三一四	同	二百五十一丁目
三一五	同	二百五十二丁目
三一六	同	二百五十三丁目
三一七	同	二百五十四丁目
三一八	同	二百五十五丁目
三一九	同	二百五十六丁目
三二〇	同	二百五十七丁目
三二一	同	二百五十八丁目
三二二	同	二百五十九丁目
三二三	同	二百六十丁目
三二四	同	二百六十一丁目
三二五	同	二百六十二丁目
三二六	同	二百六十三丁目
三二七	同	二百六十四丁目
三二八	同	二百六十五丁目
三二九	同	二百六十六丁目
三三〇	同	二百六十七丁目
三三一	同	二百六十八丁目
三三二	同	二百六十九丁目
三三三	同	二百七十丁目
三三四	同	二百七十一丁目
三三五	同	二百七十二丁目
三三六	同	二百七十三丁目
三三七	同	二百七十四丁目
三三八	同	二百七十五丁目
三三九	同	二百七十六丁目
三四〇	同	二百七十七丁目
三四一	同	二百七十八丁目
三四二	同	二百七十九丁目
三四三	同	二百八十丁目
三四四	同	二百八十一丁目
三四五	同	二百八十二丁目
三四六	同	二百八十三丁目
三四七	同	二百八十四丁目
三四八	同	二百八十五丁目
三四九	同	二百八十六丁目
三五〇	同	二百八十七丁目
三五一	同	二百八十八丁目
三五二	同	二百八十九丁目
三五三	同	二百九十丁目
三五四	同	二百九十一丁目
三五五	同	二百九十二丁目
三五六	同	二百九十三丁目
三五七	同	二百九十四丁目
三五八	同	二百九十五丁目
三五九	同	二百九十六丁目
三六〇	同	二百九十七丁目
三六一	同	二百九十八丁目
三六二	同	二百九十九丁目
三六三	同	三百丁目
三六四	同	三百一丁目
三六五	同	三百二丁目
三六六	同	三百三丁目
三六七	同	三百四丁目
三六八	同	三百五丁目
三六九	同	三百六丁目
三七〇	同	三百七丁目
三七一	同	三百八丁目
三七二	同	三百九丁目
三七三	同	三百十丁目
三七四	同	三百十一丁目
三七五	同	三百十二丁目
三七六	同	三百十三丁目
三七七	同	三百十四丁目
三七八	同	三百十五丁目
三七九	同	三百十六丁目
三八〇	同	三百十七丁目
三八一	同	三百十八丁目
三八二	同	三百十九丁目
三八三	同	三百二十丁目
三八四	同	三百二十一丁目
三八五	同	三百二十二丁目
三八六	同	三百二十三丁目
三八七	同	三百二十四丁目
三八八	同	三百二十五丁目
三八九	同	三百二十六丁目
三九〇	同	三百二十七丁目
三九一	同	三百二十八丁目
三九二	同	三百二十九丁目
三九三	同	三百三十丁目
三九四	同	三百三十一丁目
三九五	同	三百三十二丁目
三九六	同	三百三十三丁目
三九七	同	三百三十四丁目
三九八	同	三百三十五丁目
三九九	同	三百三十六丁目
四〇〇	同	三百三十七丁目
四〇一	同	三百三十八丁目
四〇二	同	三百三十九丁目
四〇三	同	三百四十丁目
四〇四	同	三百四十一丁目
四〇五	同	三百四十二丁目
四〇六	同	三百四十三丁目
四〇七	同	三百四十四丁目
四〇八	同	三百四十五丁目
四〇九	同	三百四十六丁目
四一〇	同	三百四十七丁目
四一一	同	三百四十八丁目
四一二	同	三百四十九丁目
四一三	同	三百五十丁目
四一四	同	三百五十一丁目
四一五	同	三百五十二丁目
四一六	同	三百五十三丁目
四一七	同	三百五十四丁目
四一八	同	三百五十五丁目
四一九	同	三百五十六丁目
四二〇	同	三百五十七丁目
四二一	同	三百五十八丁目
四二二	同	三百五十九丁目
四二三	同	三百六十丁目
四二四	同	三百六十一丁目
四二五	同	三百六十二丁目
四二六	同	三百六十三丁目
四二七	同	三百六十四丁目
四二八	同	三百六十五丁目
四二九	同	三百六十六丁目
四三〇	同	三百六十七丁目
四三一	同	三百六十八丁目
四三二	同	三百六十九丁目
四三三	同	三百七十丁目
四三四	同	三百七十一丁目
四三五	同	三百七十二丁目
四三六	同	三百七十三丁目
四三七	同	三百七十四丁目
四三八	同	三百七十五丁目
四三九	同	三百七十六丁目
四四〇	同	三百七十七丁目
四四一	同	三百七十八丁目
四四二	同	三百七十九丁目
四四三	同	三百八十丁目
四四四	同	三百八十一丁目
四四五	同	三百八十二丁目
四四六	同	三百八十三丁目
四四七	同	三百八十四丁目
四四八	同	三百八十五丁目
四四九	同	三百八十六丁目
四五〇	同	三百八十七丁目
四五一	同	三百八十八丁目
四五二	同	三百八十九丁目
四五三	同	三百九十丁目
四五四	同	三百九十一丁目
四五五	同	三百九十二丁目
四五六	同	三百九十三丁目
四五七	同	三百九十四丁目
四五八	同	三百九十五丁目
四五九	同	三百九十六丁目
四六〇	同	三百九十七丁目
四六一	同	三百九十八丁目
四六二	同	三百九十九丁目
四六三	同	四百丁目
四六四	同	四百一丁目
四六五	同	四百二丁目
四六六	同	四百三丁目
四六七	同	四百四丁目
四六八	同	四百五丁目
四六九	同	四百六丁目
四七〇	同	四百七丁目
四七一	同	四百八丁目
四七二	同	四百九丁目
四七三	同	四百十丁目
四七四	同	四百十一丁目
四七五	同	四百十二丁目
四七六	同	四百十三丁目
四七七	同	四百十四丁目
四七八	同	四百十五丁目
四七九	同	四百十六丁目
四八〇	同	四百十七丁目
四八一	同	四百十八丁目
四八二	同	四百十九丁目
四八三	同	四百二十丁目
四八四	同	四百二十一丁目
四八五	同	四百二十二丁目
四八六	同	四百二十三丁目
四八七	同	四百二十四丁目
四八八	同	四百二十五丁目
四八九	同	四百二十六丁目
四九〇	同	四百二十七丁目
四九一	同	四百二十八丁目
四九二	同	四百二十九丁目
四九三	同	四百三十丁目
四九四	同	四百三十一丁目
四九五	同	四百三十二丁目
四九六	同	四百三十三丁目
四九七	同	四百三十四丁目
四九八	同	四百三十五丁目
四九九	同	四百三十六丁目
五〇〇	同	四百三十七丁目
五〇一	同	四百三十八丁目
五〇二	同	四百三十九丁目
五〇三	同	四百四十丁目
五〇四	同	四百四十一丁目
五〇五	同	四百四十二丁目
五〇六	同	四百四十三丁目
五〇七	同	四百四十四丁目
五〇八	同	四百四十五丁目
五〇九	同	四百四十六丁目
五一〇	同	四百四十七丁目
五一一	同	四百四十八丁目
五一二	同	四百四十九丁目
五一三	同	四百五十丁目
五一四	同	四百五十一丁目
五一五	同	四百五十二丁目
五一六	同	四百五十三丁目
五一七	同	四百五十四丁目
五一八	同	四百五十五丁目
五一九	同	四百五十六丁目
五二〇	同	四百五十七丁目
五二一	同	四百五十八丁目
五二二	同	四百五十九丁目
五二三	同	四百六十丁目
五二四	同	四百六十一丁目
五二五	同	四百六十二丁目
五二六	同	四百六十三丁目
五二七	同	四百六十四丁目
五二八	同	四百六十五丁目
五二九	同	四百六十六丁目
五三〇	同	四百六十七丁目
五三一	同	四百六十八丁目
五三二	同	四百六十九丁目
五三三	同	四百七十丁目
五三四	同	四百七十一丁目
五三五	同	四百七十二丁目
五三六	同	四百七十三丁目
五三七	同	四百七十四丁目
五三八	同	四百七十五丁目
五三九	同	四百七十六丁目
五四〇	同	四百七十七丁目
五四一	同	四百七十八丁目
五四二	同	四百七十九丁目
五四三	同	四百八十丁目
五四四	同	四百八十一丁目
五四五	同	四百八十二丁目
五四六	同	四百八十三丁目
五四七	同	四百八十四丁目
五四八	同	四百八十五丁目
五四九	同	四百八十六丁目
五五〇	同	四百八十七丁目
五五一	同	四百八十八丁目
五五二	同	四百八十九丁目
五五三	同	四百九十丁目
五五四	同	四百九十一丁目
五五五	同	四百九十二丁目
五五六	同	四百九十三丁目
五五七	同	四百九十四丁目
五五八	同	四百九十五丁目
五五九	同	四百九十六丁目
五六〇	同	四百九十七丁目
五六一	同	四百九十八丁目
五六二	同	四百九十九丁目
五六三	同	五百丁目
五六四	同	五百一丁目
五六五	同	五百二丁目
五六六	同	五百三丁目
五六七	同	五百四丁目
五六八	同	五百五丁目
五六九	同	五百六丁目
五七〇	同	五百七丁目
五七一	同	五百八丁目
五七二	同	五百九丁目
五七三	同	五百十丁目
五七四	同	五百十一丁目
五七五	同	五百十二丁目
五七六	同	五百十三丁目
五七七	同	五百十四丁目
五七八	同	五百十五丁目
五七九	同	五百十六丁目
五八〇	同	五百十七丁目
五八一	同	五百十八丁目
五八二	同	五百十九丁目
五八三	同	五百二十丁目
五八四	同	五百二十一丁目
五八五	同	五百二十二丁目
五八六	同	五百二十三丁目
五八七	同	五百二十四丁目
五八八	同	五百二十五丁目
五八九	同	五百二十六丁目
五九〇	同	五百二十七丁目
五九一	同	五百二十八丁目
五九二	同	五百二十九丁目
五九三	同	五百三十丁目
五九四	同	五百三十一丁目
五九五	同	五百三十二丁目
五九六	同	五百三十三丁目
五九七	同	五百三十四丁目
五九八	同	五百三十五丁目
五九九	同	五百三十六丁目
六〇〇	同	五百三十七丁目
六〇一	同	五百三十八丁目
六〇二	同	五百三十九丁目
六〇三	同	五百四十丁目
六〇四	同	五百四十一丁目
六〇五	同	五百四十二丁目
六〇六	同	五百四十三丁目
六〇七	同	五百四十四丁目
六〇八	同	五百四十五丁目
六〇九	同	五百四十六丁目
六一〇	同	五百四十七丁目
六一一	同	五百四十八丁目
六一二	同	五百四十九丁目
六一三	同	五百五十丁目
六一四	同	五百五十一丁目
六一五	同	五百五十二丁目
六一六	同	五百五十三丁目
六一七	同	五百五十四丁目
六一八	同	五百五十五丁目
六一九	同	五百五十六丁目
六二〇	同	五百五十七丁目
六二一	同	五百五十八丁目
六二二	同	五百五十九丁目
六二三	同	五百六十丁目
六二四	同	五百六十一丁目
六二五	同	五百六十二丁目
六二六	同	五百六十三丁目
六二七	同	五百六十四丁目
六二八	同	五百六十五丁目
六二九	同	五百六十六丁目
六三〇	同	五百六十七丁目
六三一	同	五百六十八丁目
六三二	同	五百六十九丁目
六三三	同	五百七十丁目
六三四	同	五百七十一丁目
六三五	同	五百七十二丁目
六三六	同	五百七十三丁目
六三七	同	五百七十四丁目
六三八	同	五百七十五丁目
六三九	同	五百七十六丁目
六四〇	同	五百七十七丁目
六四一	同	五百七十八丁目
六四二	同	五百七十九丁目
六四三	同	五百八十丁目
六四四	同	五百八十一丁目
六四五	同	五百八十二丁目
六四六	同	五百八十三丁目
六四七	同	五百八十四丁目
六四八	同	五百八十五丁目
六四九	同	五百八十六丁目
六五〇	同	五百八十七丁目
六五一	同	五百八十八丁目
六五二	同	五百八十九丁目
六五三	同	五百九十丁目
六五四	同	五百九十一丁目
六五五	同	五百九十二丁目
六五六	同	五百九十三丁目
六五七	同	五百九十四丁目
六五八	同	五百九十五丁目
六五九	同	五百九十六丁目
六六〇	同	五百九十七丁目
六六一	同	五百九十八丁目
六六二	同	五百九十九丁目
六六三	同	六百丁目
六六四	同	六百一丁目
六六五	同	六百二丁目
六六六	同	六百三丁目
六六七	同	六百四丁目
六六八	同	六百五丁目
六六九	同	六百六丁目
六七〇	同	六百七丁目
六七一	同	六百八丁目
六七二	同	六百九丁目
六七三	同	六百十丁目
六七四	同	六百十一丁目
六七五	同	六百十二丁目
六七六	同	六百十三丁目
六七七	同	六百十四丁目
六七八	同	六百十五丁目
六七九	同	六百十六丁目
六八〇	同	六百十七丁目
六八一	同	六百十八丁目
六八二	同	六百十九丁目
六八三	同	六百二十丁目
六八四	同	六百二十一丁目
六八五	同	六百二十二丁目
六八六	同	六百二十三丁目
六八七	同	六百二十四丁目
六八八	同	六百二十五丁目
六八九	同	六百二十六丁目
六九〇	同	六百二十七丁目
六九一	同	六百二十八丁目
六九二	同	六百二十九丁目
六九三	同	六百三十丁目
六九四	同	六百三十一丁目
六九五	同	六百三十二丁目
六九六	同	六百三十三丁目
六九七	同	六百三十四丁目
六九八	同	六百三十五丁目
六九九	同	六百三十六丁目
七〇〇	同	六百三十七丁目
七〇一	同	六百三十八丁目
七〇二	同	六百三十九丁目
七〇三	同	六百四十丁目
七〇四	同	六百四十一丁目
七〇五	同	六百四十二丁目
七〇六	同	六百四十三丁目
七〇七	同	六百四十四丁目
七〇八	同	六百四十五丁目
七〇九	同	六百四十六丁目
七一〇	同	六百四十七丁目
七一一	同	六百四十八丁目
七一二	同	六百四十九丁目
七一三	同	六百五十丁目
七一四	同	六百五十一丁目
七一五	同	六百五十二丁目
七一六	同	六百五十三丁目
七一七	同	六百五十四丁目
七一八	同	六百五十五丁目
七一九	同	六百五十六丁目
七二〇	同	六百五十七丁目
七二一	同	六百五十八丁目
七二二	同

田原	同	田原町一丁目	一、七九五・五七 五四三・一六	一一、八六二	五、七 六、一	同
金龍	同	新谷町	二、六四四・一三 八〇〇・〇六	一二、三八五	五、九 六、三	同
松葉	同	松葉町	二、九七五・二一 九〇〇・〇〇	一三、九二〇	五、六 五、一二	同
精華	同	南富坂町 南元町	二、八八二・九四 八七二・〇九	一一、五〇九	四、九 五、九	同
柳北	同	向柳原町二丁目	二、九七九・九三 九〇一・四三	二六、一二八	一四、三 一五、七	運動器三
玉姫	同	玉姫町 淺草町	三、五〇四・四〇 一、〇六〇・〇八	一三、〇〇四	四、九 五、六	砂場一 運動器三
中和	本所區	林町三丁目	二、九七五・三七 九〇〇・〇五	一八、八三〇	三、一〇 五、二	同
業平	同	押上町	三、三〇五・七九 一、〇〇〇・〇〇	一三、五九三	四、八 五、七	同
横川	同	中ノ郷横川町	一、九〇〇・六〇 五七四・九三	一二、一七〇	五、六 五、一二	同
江東	同	相生町三丁目	二、九六九・〇二 八九八・一三	一七、八六六	三、五 四、一	同
茅場	同	茅場町三丁目	二、九八〇・二六 九〇一・五三	一三、二五四	五、一 五、一二	同
若宮	同	若宮町 外手町	四、五五四・三八 一、三七七・七〇	一〇、八九八	五、七 六、二	同
菊川	同	菊川町一丁目	二、九七五・二七 九〇〇・〇二	一三、〇九一	四、六 五、三	同

永倉町	同	永倉町	五十二箇所	二、九七二・七三 八九九・二五	一三、〇〇三	四、九九 五、九	同		
元加賀町	深川區東大工町			二、九七五・二一 九〇〇・〇〇	一四、一二六	二、八二 四、六	同		
八名川町	同	八名川町 西六間堀町		二、九七三・一三 八九九・三七	一二、三三七	五、九九 四、九九	同		
森下町	同	東森下町		二、九七六・〇七 九〇〇・二六	一三、一九	五、九九 四、九九	同		
臨海町	同	蛤町一、二丁目		二、六四一・九二 七九九・一八	一三、三三	四、八五 四、一五	同		
東陽町	同	東平井町		三、〇〇五・五五 九〇九・一八	二八、六六〇	一五、一七 一二、一七	同		
川南町	同	千田町		二、九七五・三三 九〇〇・〇三	一四、三三	五、一三 五、一三	同		
扇橋町	同	石島町		二、九七五・二四 九〇〇・〇二	一四、九七八	四、六 五、三	同		
設計監督費					二〇〇、三九一				
計			五十二箇所	一四六、一六一・〇七 四四、二三・三九	一、〇〇六、三〇三				

備考　當初の計畫にては神田橋本町に橋本公園設置の豫定なりしも敷地の都合に依り之を廢止し、川南公園を追加せしものなり、尙本表には用地費を含まず。

第四項　小學校

一　事業概要

本市は多年二部教授撤廢の方針の下に校舍の完成を期し、大正二年六月十七日市告示第七十七號を以て市立小學校建設費補給規程を制定し、越えて大正十一年八月該規程の一部を改正し以て從來の木造建築補給の外新規に鐵筋混凝土構造に對する補給を認め、以來已むを得ざる事情あるものゝ外木造建築を認めざる方針を採れり。

計	五十二箇所	一、四六、二三・三九	一、〇〇六、三〇二	水泳場一、徒渉池二、砂場五二、運動器一六一

備考　當初の計畫にては神田橋本町に橋本公園設置の豫定なりしも敷地の都合に依り之を廢止し、川南公園を追加せしものなり、尙本表には用地費を含まず。

第四項　小學校

一　事業概要

本市は多年二部教授撤廢の方針の下に校舍の完成を期し、大正二年六月十七日市告示第七十七號を以て市立小學校建設費補給規程を制定し、越えて大正十一年八月該規程の一部を改正し以て從來の木造建築補給の外新規に鐵筋混凝土構造に對する補給を認め、以來已むを得ざる事情あるものゝ外木造建築を認めざる方針を採れり。

各區に於ては本方針に準據して鞆繪(芝區)　月島(京橋區)　下谷高等(下谷區)　本所高等(本所區)　番町(麴町區)　鶴卷(牛込區)　富士(淺草區)の七校は何れも鐵筋混凝土構造を以て改築又は新築に著手し、番町鶴卷の二校は工事完了し他は工事半にして大震災に遭遇したるものなり。

大震災に因り烏有に歸せし小學校は麴町區外九區に亘り、尋常小學校百五校、高等小學校七校にして、是に前述改築又は新築中火災に遭遇せる鞆繪・月島・下谷高等・本所高等・富士の五校を加へ合計百十七校に及べり、而して是等燒失區域內に於ける全小學校を復興事業として耐震耐火構造たる鐵筋混凝土構造及鐵骨構造を以て改築することゝなれり。

本市繼續帝都復興費中小學校建設費四千百五萬六千五百八十三圓(內參千八百六十一萬圓に對しては國庫より四分の一の補助を受く)を以て大正十三年度より昭和五年度に至る七箇年に亘り補給規程に基き建設費を補給し、尙小學校完成資金を區に交付し、市の設計竝監督の下に區の事業として校舍の建設をなさしむ。

尙校舍の建設に附帶せる設備工事一切は別途豫算本市繼續震災復舊費の內小學校設備費八百十九萬一千七百八十六圓を以て之に充當す。

附記

市立小學校の總數は尋常百八十二校、高等併置三校、高等十八校計二百三校の內燒失區域內に於ける前記の百十七校は復興事業として昭和四年度迄に改築又は完成せしむる豫定なりしが、設計

變更の必要を生じ更に工期を一箇年延長して昭和五年度迄に全部の完了を告げたり。

二　施設

各區に於ける校數竝其の位置は土地の狀況、通學區域の關係竝帝都復興計畫等を考慮して已むを得ざるもの、外變更せざる方針を採り、一校當標準學級數二十四(一學級收容兒童約五十人)全部鐵筋コンクリート三階建とし、各校の實狀に鑑み十六乃至三十二學級の範圍に於て各適當に之を定めたり。

小學校の名稱、位置及建物坪數等左の如し。

校名	位置	延建坪	工事費	起工年月	竣工年月
麹町	麹町區元園町一丁目	一、二三四・九八〇坪	二三六、二六六円	一五、八	二、六
六同	上六番町	一、一六五・五二〇	二六八、六七九	一四、一二	一五、八
華神	神田區猿樂町一丁目	一、二八一・〇〇〇	二三四、六四五	一四、一二	一五、九五
路同	淡路町二丁目	九二四・八三四	二四四、〇六六	一五、一	二、一六
田同	新銀町	一、三一八・〇二〇	三三七、二〇四	三、一三	四、一二
櫻同	東松下町	一、二六一・五三〇	三三五、三六二	三、一五	四、五五
成同	五軒町	一、二六三・〇七〇	二九四、四二二	三、一〇	四、一〇九

橋本	同	江川町	一、〇七七・三三〇	二七七、四八八	三、一一	四、一〇
和泉	同	大和町	九三四・四三〇	二三一、六四一	四、四	五、二
小川	同	小川町	一、一〇〇・二八四	二六六、三五〇	二、八	三、一〇
西神田	同	西小川町一丁目	一、三二四・四一〇	三五三、八四九	二、二	二、一二
今川	同	紺屋町	一、一四八・五八〇	三三二、二四六	二、一一	四、三
神龍	同	鎌倉町	九一六・四三九	二三九、三八七	一五、六	二、七
芳林	同	末廣町	一、三五一・四八一	三四五、四五七	二、四	三、一
一橋高等	同	一橋通町	一、五三四・九九〇	四〇九、八七〇	二、一一	四、三
常盤	日本橋區本石町一丁目		一、一二三・五六〇	三〇五、九八一	三、四	四、五
坂本	同	坂本町	九六四・四九〇	二六九、五九四	二、六	三、三
久松	同	久松町	一、三〇七・七八〇	三八二、二三三	三、一	四、五
城東	同	通二丁目	一、〇八四・二六〇	二九一、一三一	二、八	四、四
有馬日本橋高等	同	蠣殼町三丁目	一、八二一・五七〇	四七七、九七六	一五、八	二、九

千代田	同	矢ノ倉町	一、一〇七、七三〇	三〇三、一八二	四、一三	三、一三	三、一三	三、一三	三、一三	三、一三	三、一三	三、一三
十思	同	小傳馬上町	一、〇七一、四四〇	二八六、二三七	三、一〇	二、一〇	二、一〇	二、一〇	二、一〇	二、一〇	二、一〇	二、一〇
東華	同	新葭町	一、〇九二、七〇〇	三〇二、七七九	四、五二	三、五二	三、五二	三、五二	三、五二	三、五二	三、五二	三、五二
濱町	同	濱町三丁目	九〇七、七六二	二六〇、六六〇	二、一五	二、一五	二、一五	二、一五	二、一五	二、一五	二、一五	二、一五
箱崎	同	箱崎町三丁目	九〇五、〇〇〇	二四七、二八八	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二
日本橋女子高等	同	坂本町	一、〇五二、〇三〇	二八三、〇五八	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二
鐵砲洲	京橋區新湊町一丁目		一、一五一、六二〇	二七八、二七〇	四、三四	四、三四	四、三四	四、三四	四、三四	四、三四	四、三四	四、三四
泰明	同	元數寄屋町一丁目	一、一七〇、八八〇	三二一、七六四	四、三六	四、三六	四、三六	四、三六	四、三六	四、三六	四、三六	四、三六
築地	同	築地一丁目	一、四三二、七九〇	三五三、七六三	五、一六	五、一六	五、一六	五、一六	五、一六	五、一六	五、一六	五、一六
京華	同	元島町	一、三四八、一一〇	三六三、〇九六	四、一一	四、一一	四、一一	四、一一	四、一一	四、一一	四、一一	四、一一
京橋昭和	同	南槇町	一、二八三、五一〇	三一二、四一九	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二	三、二二
明石	同	明石町	一、三六〇、三九〇	三五五、〇四六	四、八九	四、八九	四、八九	四、八九	四、八九	四、八九	四、八九	四、八九
明正	同	越前堀一丁目	一、四三六、四〇〇	三八一、八三三	二、三	二、三	二、三	二、三	二、三	二、三	二、三	二、三

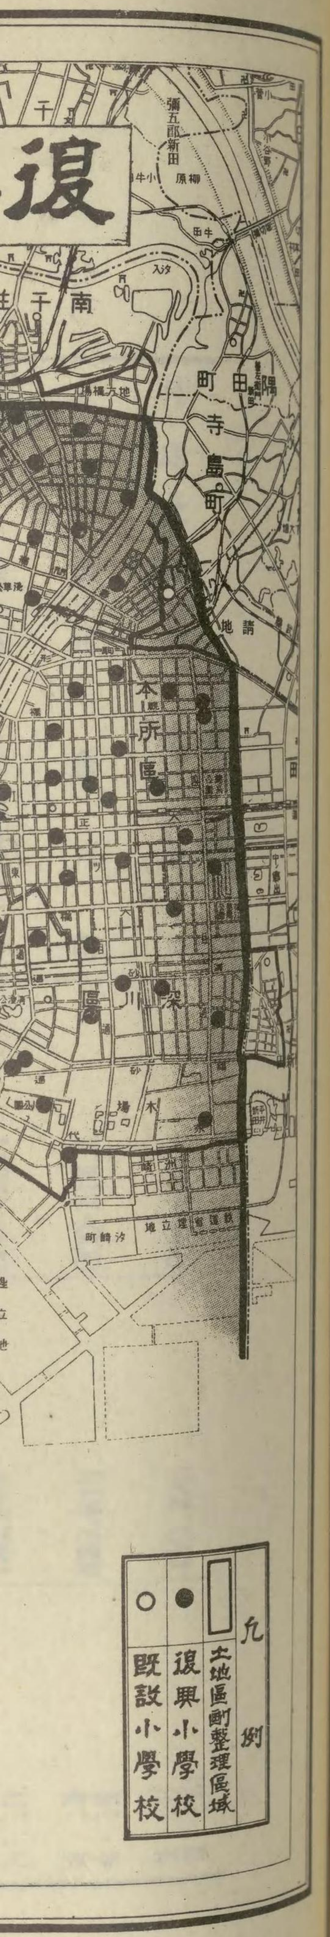

復興小學校配置圖

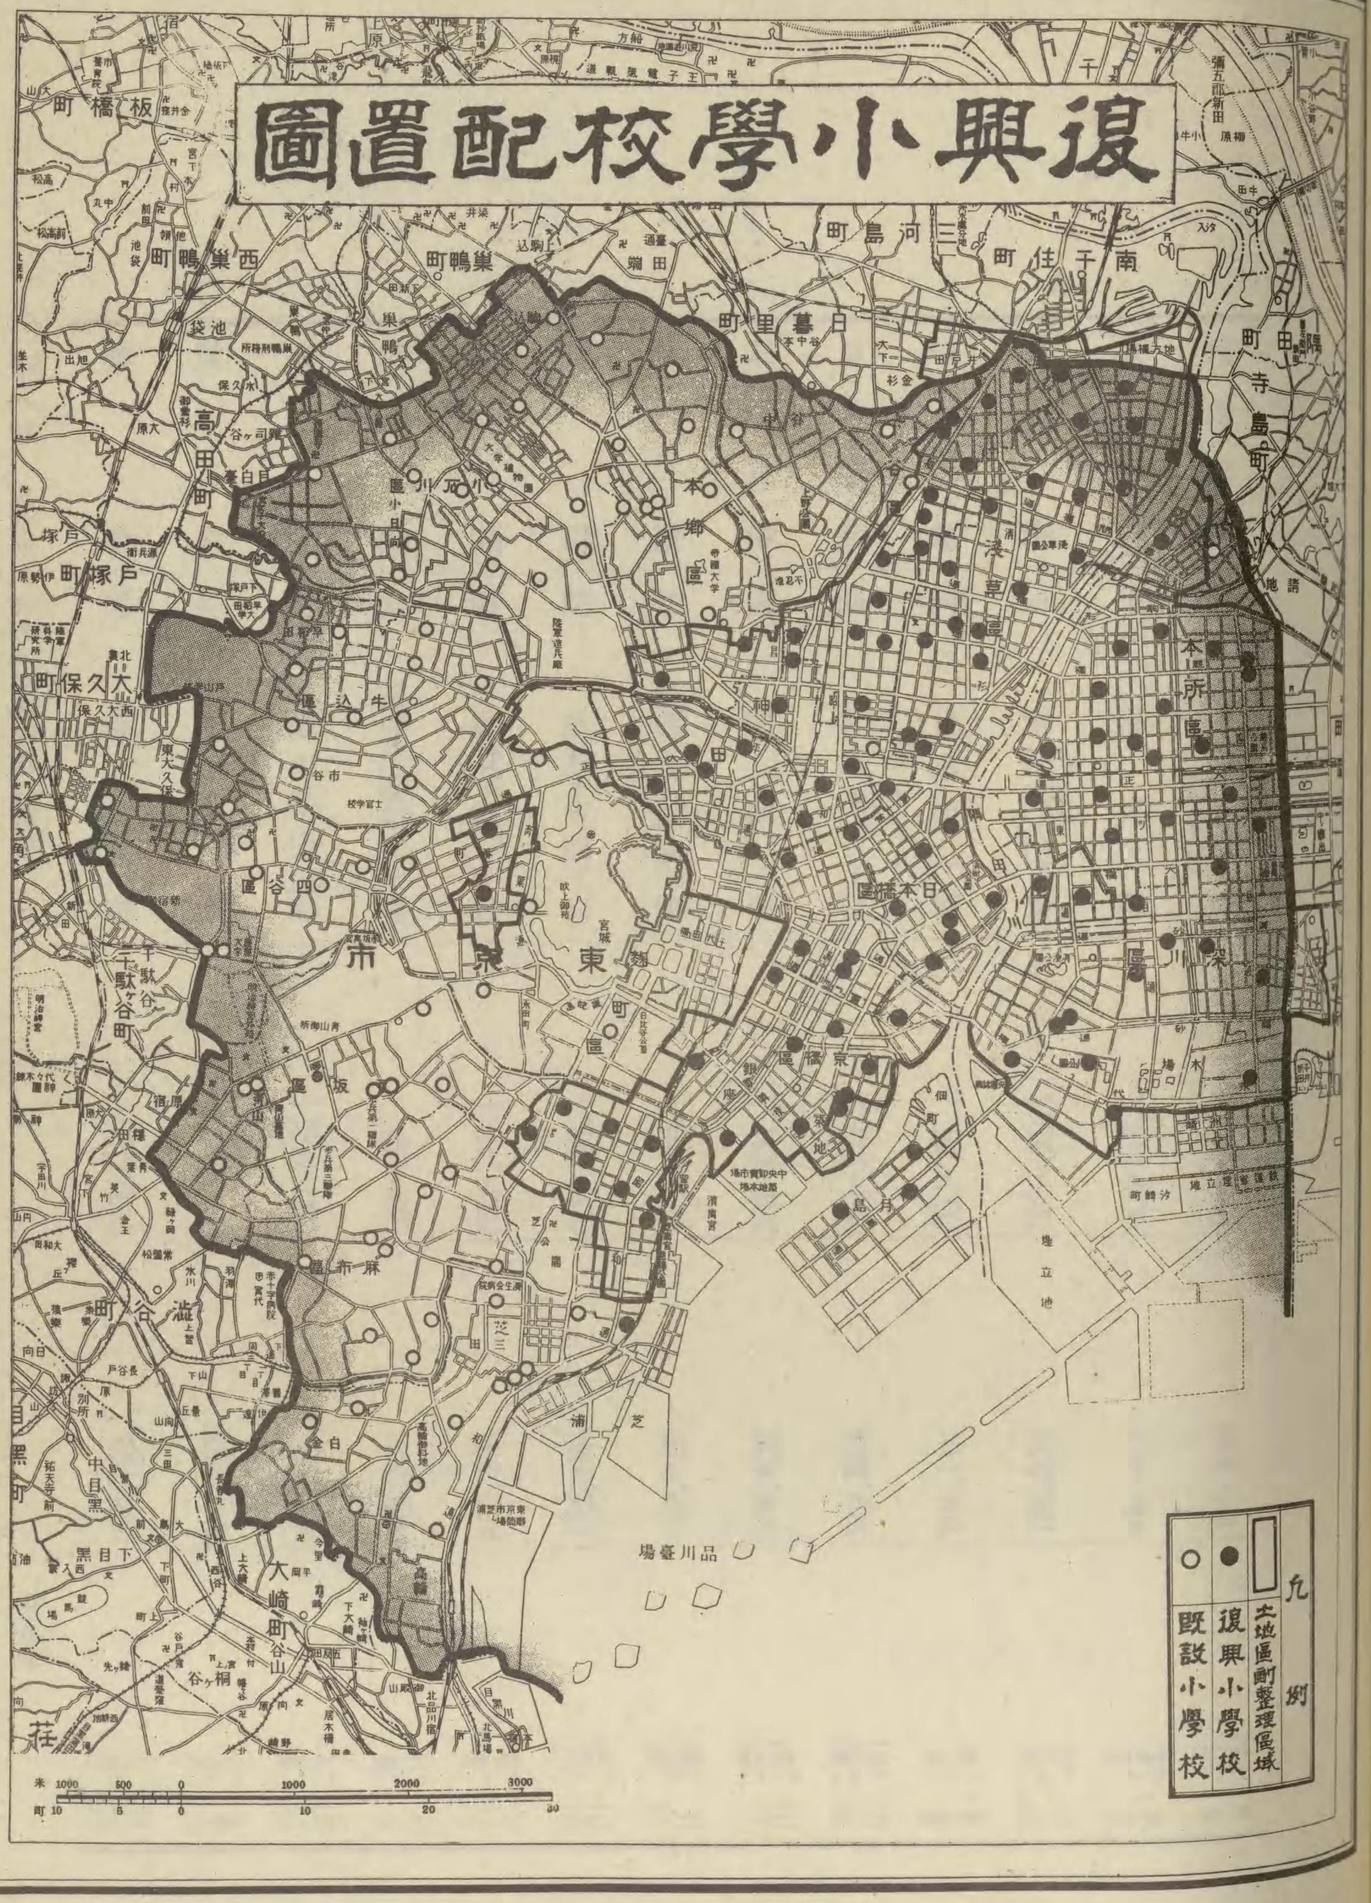

京華	同元島町	一、三四八・一一〇	三六三、〇九六	三、一四、四	
京橋昭和	同南槇町	一、二八三・五二〇	三一二、四一九	三、二四、三	
明石	同明石町	一、三六〇・三九〇	三五五、〇四六	一四、九一五、八	
明正	同越前堀一丁目	一、四三六・四〇〇	三八一、八三三	一五、三二、二	

京月島第二橋同月島西仲通八丁目
同金六町
一〇七・五〇〇
一七三・〇〇〇

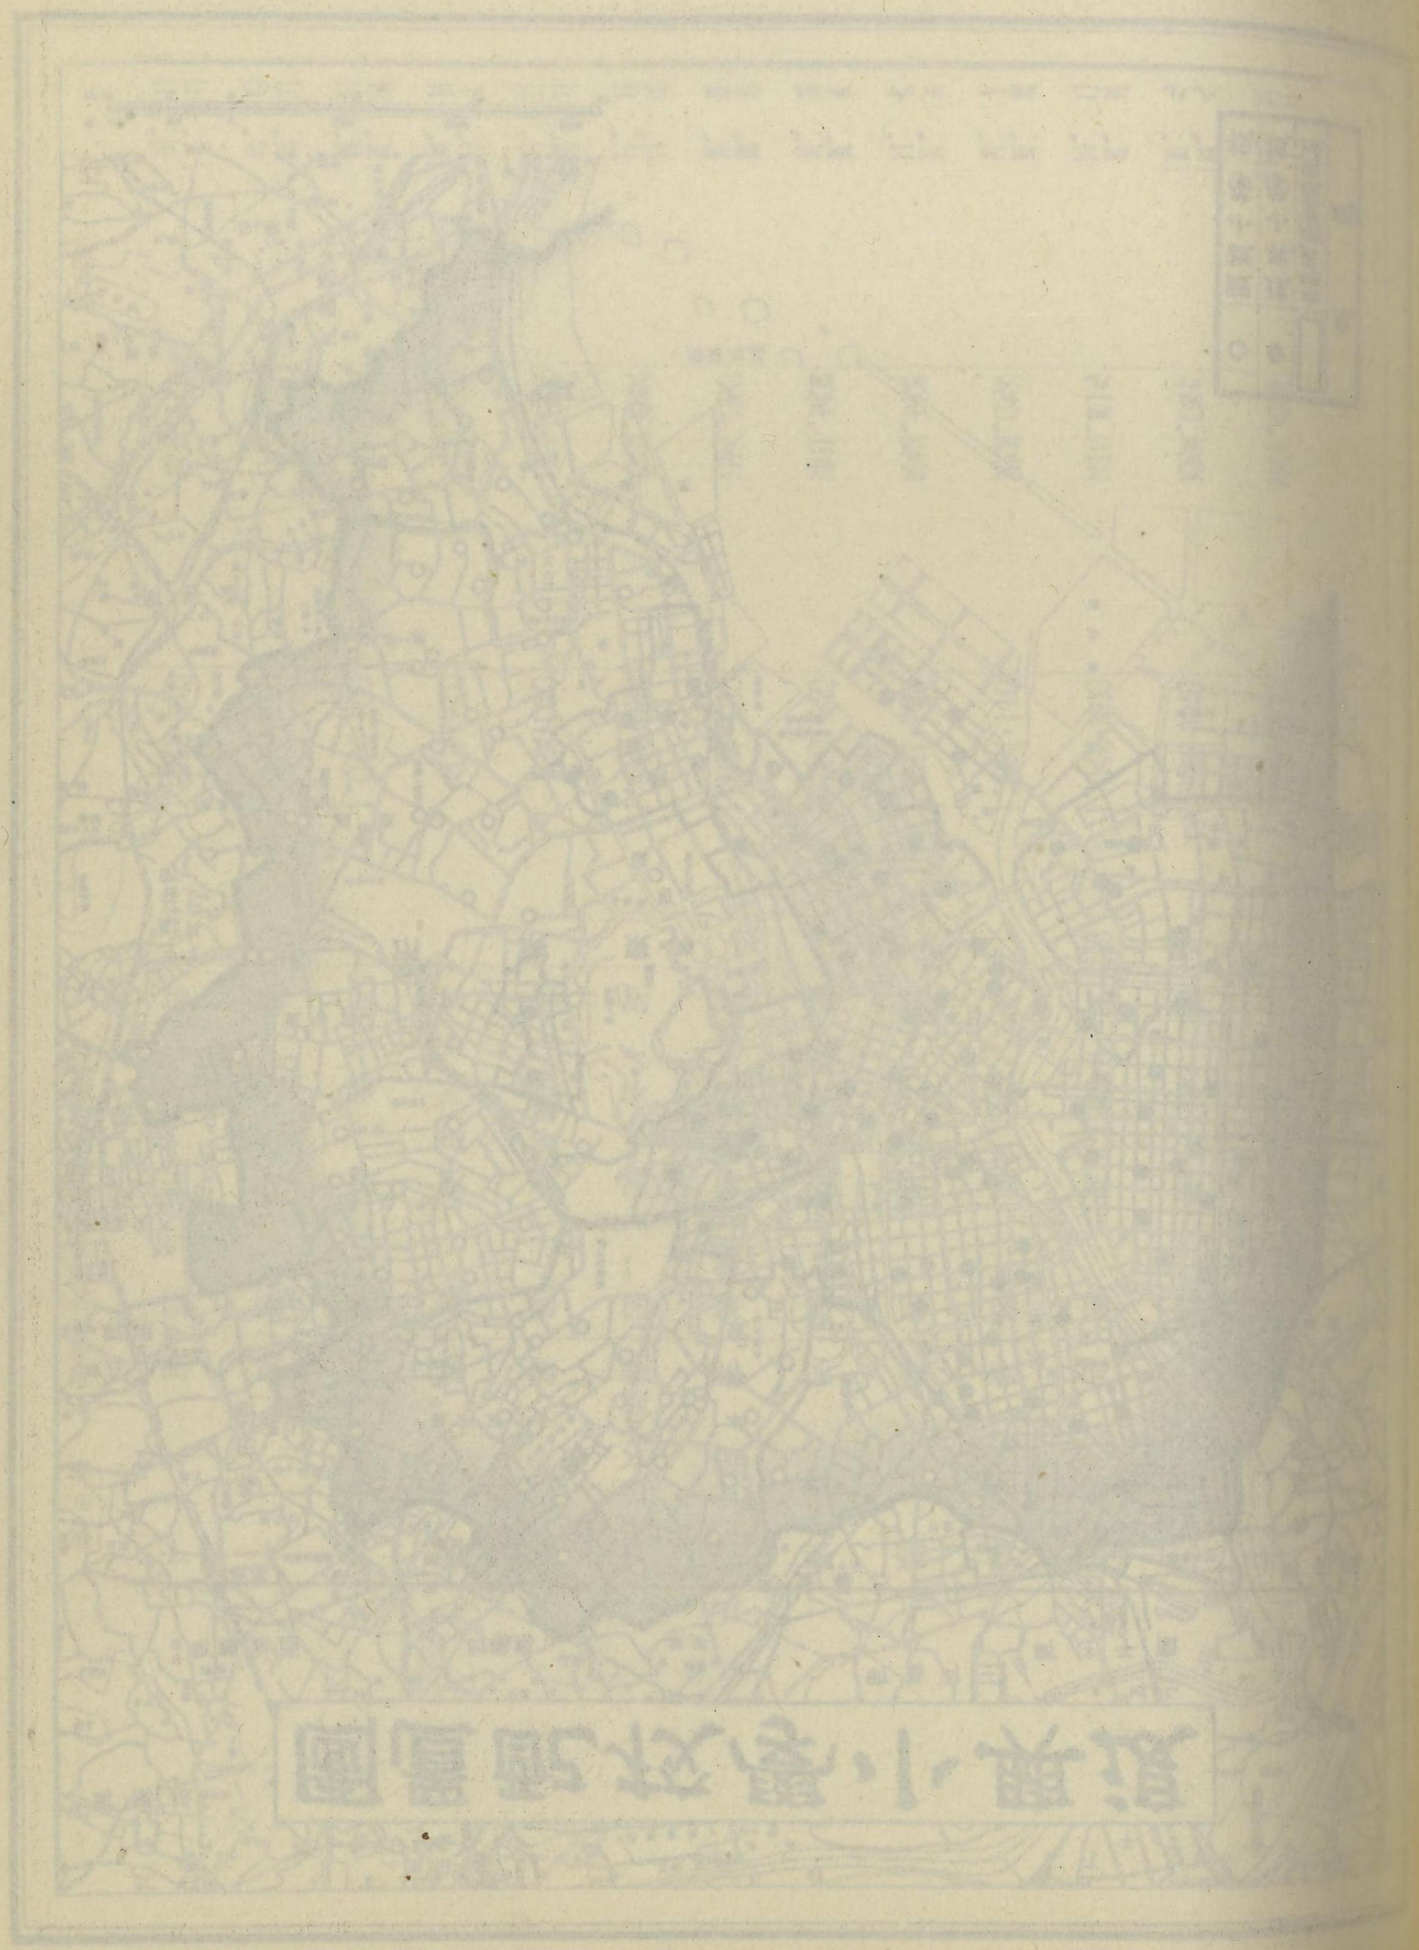

月島第二	同	月島西仲通八丁目	一、〇七七、五四〇	一、二八四、〇七四	一五、二四	一、〇七七、五四〇	一、二八四、〇七四	一五、二四	一、〇七七、五四〇	一、二八四、〇七四	一五、二四
京橋	同	金六町	一、三二三、〇〇〇	三一五、〇四五	三、七五	一、三二三、〇〇〇	三一五、〇四五	三、七五	一、三二三、〇〇〇	三一五、〇四五	三、七五
文海	同	木挽町八丁目	一、〇三七、二九〇	二五九、〇四一	二、二二	一、〇三七、二九〇	二五九、〇四一	二、二二	一、〇三七、二九〇	二五九、〇四一	二、二二
佃島	同	月島西仲通	一、一〇〇、〇〇〇	二一一、七〇六	五、六三	一、一〇〇、〇〇〇	二一一、七〇六	五、六三	一、一〇〇、〇〇〇	二一一、七〇六	五、六三
月島高等	同	月島通三丁目	一、六二一、八八五	四三四、九七四	一三、一〇八	一、六二一、八八五	四三四、九七四	一三、一〇八	一、六二一、八八五	四三四、九七四	一三、一〇八
京橋高等	同	明石町	一、一六四、三三四	三〇七、五九八	一四、一三	一、一六四、三三四	三〇七、五九八	一四、一三	一、一六四、三三四	三〇七、五九八	一四、一三
鞆繪	芝	區西久保巴町	一、五七五、一七〇	三一九、三一二	一三、一二	一、五七五、一七〇	三一九、三一二	一三、一二	一、五七五、一七〇	三一九、三一二	一三、一二
川	同	愛宕下町四丁目	一、三三八、二〇〇	三五一、六五一	元、一三	一、三三八、二〇〇	三五一、六五一	元、一三	一、三三八、二〇〇	三五一、六五一	元、一三
櫻田	同	愛宕下町一丁目	一、〇八一、六四〇	二七六、七七九	四、一三	一、〇八一、六四〇	二七六、七七九	四、一三	一、〇八一、六四〇	二七六、七七九	四、一三
南櫻	同	南佐久間町二丁目	九四一、九六〇	二五六、三七二	三、一二	九四一、九六〇	二五六、三七二	三、一二	九四一、九六〇	二五六、三七二	三、一二
西櫻	同	西久保櫻川町	一、〇三一、二五〇	二八一、九一九	三、一〇	一、〇三一、二五〇	二八一、九一九	三、一〇	一、〇三一、二五〇	二八一、九一九	三、一〇
愛宕	同	芝公園四號地	一、〇二六、一八〇	二六九、八八四	三、四	一、〇二六、一八〇	二六九、八八四	三、四	一、〇二六、一八〇	二六九、八八四	三、四
神明	同	神明町	一、二八一、四一〇	三四一、三二三	二、二二	一、二八一、四一〇	三四一、三二三	二、二二	一、二八一、四一〇	三四一、三二三	二、二二

竹芝町	同	金杉濱町	九八四、四一〇	二三九、六三八	二、二二	四、五四	一、四四一、三〇〇	三七九、四〇二	二、一〇	三、七	一、四五七・四六四	三八九、五二六
愛宕高等	同	愛宕二丁目	一、〇九五・二七〇	二七五、一九二	二、二九	三、九	一、四五五・〇〇〇	三六一、六九七	二、一五	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
元町	本郷區元町一丁目		一、三六三・四〇〇	三三一、六八六	二、二四	三、八	一、四五五・〇〇〇	三四五、五二六	二、一五	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
湯島高等	同	湯島新花町	一、二九五・二一〇	三三〇、九〇八	二、二四	三、八	一、四五五・〇〇〇	三四五、五二六	二、一五	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
練塀	下谷區二長町		一、〇九八・二八〇	二七三、七四七	二、二一	三、七	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
下谷	同	北稻荷町	一、一五三・〇三〇	二九〇、八四五	二、一三	三、七	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
東盛	同	金杉下町	一、四四五・三三〇	三六六、二二四	二、一四	三、七	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
西町	同	西町南稻荷町	一、三四四・六〇〇	三三二、九七七	二、一四	三、七	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
御徒町	同	御徒町二丁目	一、四一一・二五五	三六七、〇五一	二、一四	三、七	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
黒門	同	西黒門町	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、七	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
山伏町	同	新坂本町	一、二八五・〇〇〇	三一五、一四五	二、一三	三、七	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
竹町	同	竹町	一、三八一・二五〇	三四五、五二六	二、一四	三、七	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六
臺東	同	入谷町	一、三七六・九〇〇	三六一、六九七	二、一四	三、七	一、四四一・五四〇	三六六、九二五	二、一四	三、六	一、三七六・九〇〇	三五九、〇九六

龍泉	同	龍泉寺町	一、四四一・三〇〇	三七九、四〇三	三、一〇	一、一	一、一	一、一	一、一	一、一	一、一	一、一	一、一
大正	同	入谷町	一、四五七・四六四	三六九、五二六	三、七	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
上野	同	山伏町	九七一・七八〇	二三七、九六六	一、六	一、六	一、六	一、六	一、六	一、六	一、六	一、六	一、六
下谷高等	同	入谷町	一、四一・五〇〇	二二六、九六九	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
浅草	浅草區	馬道町	一、三一・三七〇	三二七、一一〇	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
柳北	同	向柳原町二丁目	一、五九二・二六〇	三九二、八七六	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
育英	同	猿屋町	一、一五三・七九〇	三〇三、六九四	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
富士	同	馬道町七丁目	一、五一〇・五〇五	二一七、〇二九	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
新堀	同	北三筋町	九〇五・七四〇	一四〇、七八五	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
福井	同	福井町三丁目	九四九・一七〇	一四一、〇一五	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
松葉	同	松葉町	一、三九・〇九〇	三五七、三八一	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
千束	同	千束町	一、〇九・二九〇	四八〇、九七七	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八
石濱	同	玉姫町	一、〇七・五〇四	四四三、二三八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八	一、八

小島	同	小島町	一、一五七・〇六〇	二九一、六一六	二、三八九	二、三	三、四	四、四	三、四	二、一〇	二、三	一、六一四・七〇〇	四〇三、四一八
山谷堀	同	龜岡町一丁目	一、六四五・六〇〇	四一五、九一三	二、二二	二、二	三、四	四、四	三、四	二、一〇	二、三	一、六二三・四〇〇	四六六、五八九
田原	同	田原町二丁目	一、一七六・七九〇	三〇五、八八六	四、五五	四、三	五、四	五、四	五、四	四、三	四、四		
金龍	同	新谷町	一、七〇三・五九〇	四五七、六八一	三、七八	三、三	四、五	四、五	四、五	三、四	三、四		
待乳山	同	地方今戸町	一、一四九・二九〇	三三三、七七六	二、五六	二、三	三、四	三、四	三、四	二、三	二、三		
精華	同	北富坂町	一、四九三・三八〇	三七六、一五四	三、三一	三、三	四、五	四、五	四、五	三、四	三、四		
清島	同	清島町	一、七〇八・九五〇	四五一、八八四	三、九	三、四	四、五	四、五	四、五	三、四	三、四		
淺草	同	淺草町	一、六一六・三四〇	四一六、五八九	三、六三	三、四	四、五	四、五	四、五	三、四	三、四		
田中	同	田中町	一、四八七・九三〇	三八九、三七五	三、四五	三、四	四、五	四、五	四、五	三、四	三、四		
中田	同	森下町	一、一三九・七一〇	三一三、三九〇	二、七五	二、三	三、四	三、四	三、四	二、三	二、三		
正德	同	今戸町	一、一八九・四三〇	三〇五、〇一八	二、七五	二、三	三、四	三、四	三、四	二、三	二、三		
清島	同	本所區表町	一、七一七・二七〇	四三六、六三一	三、四五	三、四	四、五	四、五	四、五	三、四	三、四		
濟美高等	同	今戸町	一、一八九・四三〇	三〇五、〇一八	二、七五	二、三	三、四	三、四	三、四	二、三	二、三		
明德	同	本所區表町	一、七一七・二七〇	四三六、六三一	三、四五	三、四	四、五	四、五	四、五	三、四	三、四		
中和	同	林町	一、五〇六・九九七	三九八、一三九	三、三五	三、三	四、五	四、五	四、五	三、四	三、四		

本所	同 永倉町	一、六二四・七〇〇	四〇三、四一八	三、四	四、四
柳島	同 柳島横川町	一、六二三・四〇〇	四六六、五八九	二、一〇	三、一二
横川	同 中ノ郷横川町	一、五二一・三七〇	三八四、一六三	四、一	四、一二
江東	同 東兩國四丁目	一、六三六・七三〇	四一二、七五一	一五、九	二、一一
二葉	同 石原町二丁目	一、五五七・七四〇	三七〇、七〇四	一五、七	二、九
茅場	同 柳原町二丁目	一、三一五・三四〇	三四二、四三一	一三、八	四、九
綠	同 綠町二丁目	一、六二七・六四〇	四二四、四一三	二、一二	四、二
本横	同 石原町四丁目	一、六七八・三八〇	四二六、七三三	二、一	二、三
外手	同 外手町	一、五三〇・七五四	三五五、七二六	一五、一	一五、三
業平	同 中ノ郷業平町	一、七二一・六三〇	四四七、四七八	一五、一二	二、一
小梅	同 向島小梅町	一、五九八・五〇〇	四〇四、四二九	一五、三	二、四
柳元	同 柳島元町	一、六八六・四七〇	五五九、六六四	二、一二	四、二
菊川	同 菊川町一丁目	一、四四五・一六〇	三七九、九七一	二、八	三、五

濟美高等	同 森下町	一、一三九・七二〇	三一三、三九〇	四、五	五、七
今戸	同 今戸町	一、一八九・四三〇	三〇五、〇二八	四、五	五、三
明德	本所區 表町	一、七二七・二七〇	四三六、六三二	三、一〇	四、一
中和	同 林町	一、五〇六・九九七	三九八、一三九	二、五	三、三

錦糸	同	太平町二丁目	一、二九六・九九〇	三五六、一〇五	三、一〇 四、一〇
日進尋高	同	三笠町	一、三七四・四〇〇	三五二、七九四	三、四 四、五
本所高等	同	横網町一丁目	一、七四二・二五〇	四四三、八四三	一三、八 一四、一一
深川	深川區	東森下町	一、六六〇・一九〇	四三四、三五五	二、三 三、三
東川	同	猿江裏町	一、六九八・二〇〇	四五八、七四四	一五、九 二、六
東陽	同	東平井町	一、五九九・六六〇	四二一、八七四	一四、一三 一五、一一
平久	同	平久町一丁目	一、三九七・三一九	三八二、五二七	二、四 三、三
扇橋	同	石島町	一、二〇七・一七〇	三一六、五七四	一五、九 二、七
臨海	同	蛤町二丁目	一、五四五・三六〇	四二一、一七四	一五、九 二、八
元加賀	同	東大工町	一、七〇〇・五二〇	四六二、九〇七	一五、六 二、四
數矢	同	富岡門前町	一、五七二・九七〇	四三一、四八五	二、九 三、七
八名川	同	八名川町 東森下町	一、六〇〇・三七〇	三七〇、四五七	二、一〇 三、一一
川南	同	千田町	一、五六三・一一〇	四一七、〇〇三	二、四 三、三

大富（元靈岸小學校）	同	東大工町	一、〇八六・六二二	二九七、三三八	四、五 五、六
猿江	同	猿江町	一、三九七・四〇〇	三七五、八二三	三、五 四、七
明川高等	同	西永町	一、七五八・一四九	四七三、〇二九	一五、一〇 二、九
明治 第二明治	同	萬年町二丁目	二、六五二・九八〇	七〇五、八六九	一五、九 二、八
設計監督費				一、一〇五、七五一	
計		一一七校	一五五、二六七・八四九	四〇、九七七、六二一	

第五項　市立病院

一　事業概要

本事業は市の內外に五箇所の市立病院を建設し、實費診療に應ずるものにして、診察料は之を徵收せず、外來患者一日約千人と豫測し內七割は實費患者とし藥價又は手術料等總て實費を徵收し、殘り三割は施療患者とし時に資力なき困窮者に限り外來入院何れも費用を徵收せざるものとす。

治療科目は各病院の位置に依り必要と認むるものを選擇設置し、二乃至三病院を通じ全科を完備せむとするものにして、豫算總額三百十萬圓（國庫より四分の一の補助を受く）を以て大正十三年度より昭和二年度に至る四箇年繼續事業として執行するものなりと雖、用地の獲得・設計變更等の爲豫定の進捗を見るに至らざりしを以て繼續年期を三箇年延長し昭和五年度に於て完成の豫定なりしも附帶工事の一部は之を昭和六年迄延期せり、當初本事業は施療病院一箇所及實費診療所四箇所を建設せむとし、

施療病院新設費六十萬圓實費診療所新設費二百五十萬圓の豫算を計上せしが、此の種の病院に施療又は實費の名稱を付するは徒に患者の自尊心を傷くるのみにして何等得る所なく、且經濟界の變動に伴ひ施療及實費患者の種別に增減を來すべきを以て此の點をも顧慮し前記兩豫算を合併し施療と實費診療とを兼ねたる病院(病床平均二百を有する)五箇所を建設するを得策と認め、豫算を更正し大正十四年三月二十八日市會の議決を經たるものなり。

尙別途計畫に依り傳染病患者を收容する爲前記市立病院中廣尾・大塚・大久保の三病院及本所隔離所に一箇所平均百名を收容する特別病室を附設すべく豫算總額二百十七萬五千五百四十三圓(東京府傳染病豫防費補助規程に依り府より四分の一の補助を受く)を以て大正十四年度より昭和五年度に至る繼續費として市立病院と共に建設するものとす。

二　施設

(一)　東京市立廣尾病院

所在　東京府豐多摩郡澁谷町豐澤六八

敷地　六千七百一坪九勺

建物設備

建物種別	延建坪	著手年月日 竣工年月日	工事費	型式
本館	七三一・七五坪	一五、二、一七 二、六、二七	一四四、七四五・六一〇円	鐵筋混凝土造三階建地下室付
普通病舍	一、三四四・四六〇	一五、二、一七 一五、二、一八	三三、七六一・六七〇	同
看護婦寄宿舍	二六〇・九〇六	一五、七、一四 二、五、二五	五八、四七〇・三九〇	同　二階建

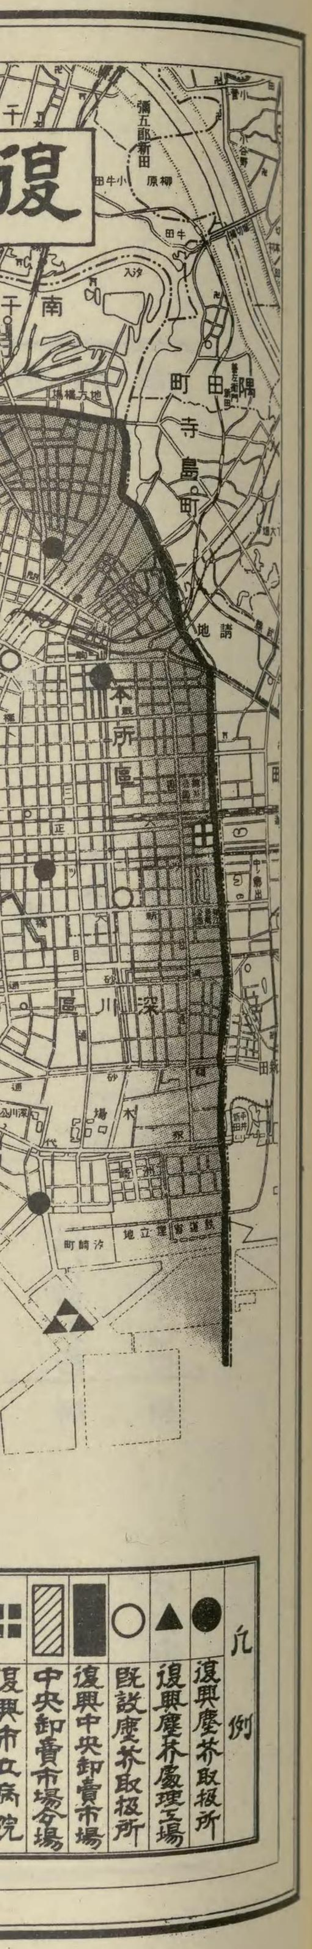

復興慶林處分設備病院市場配置圖

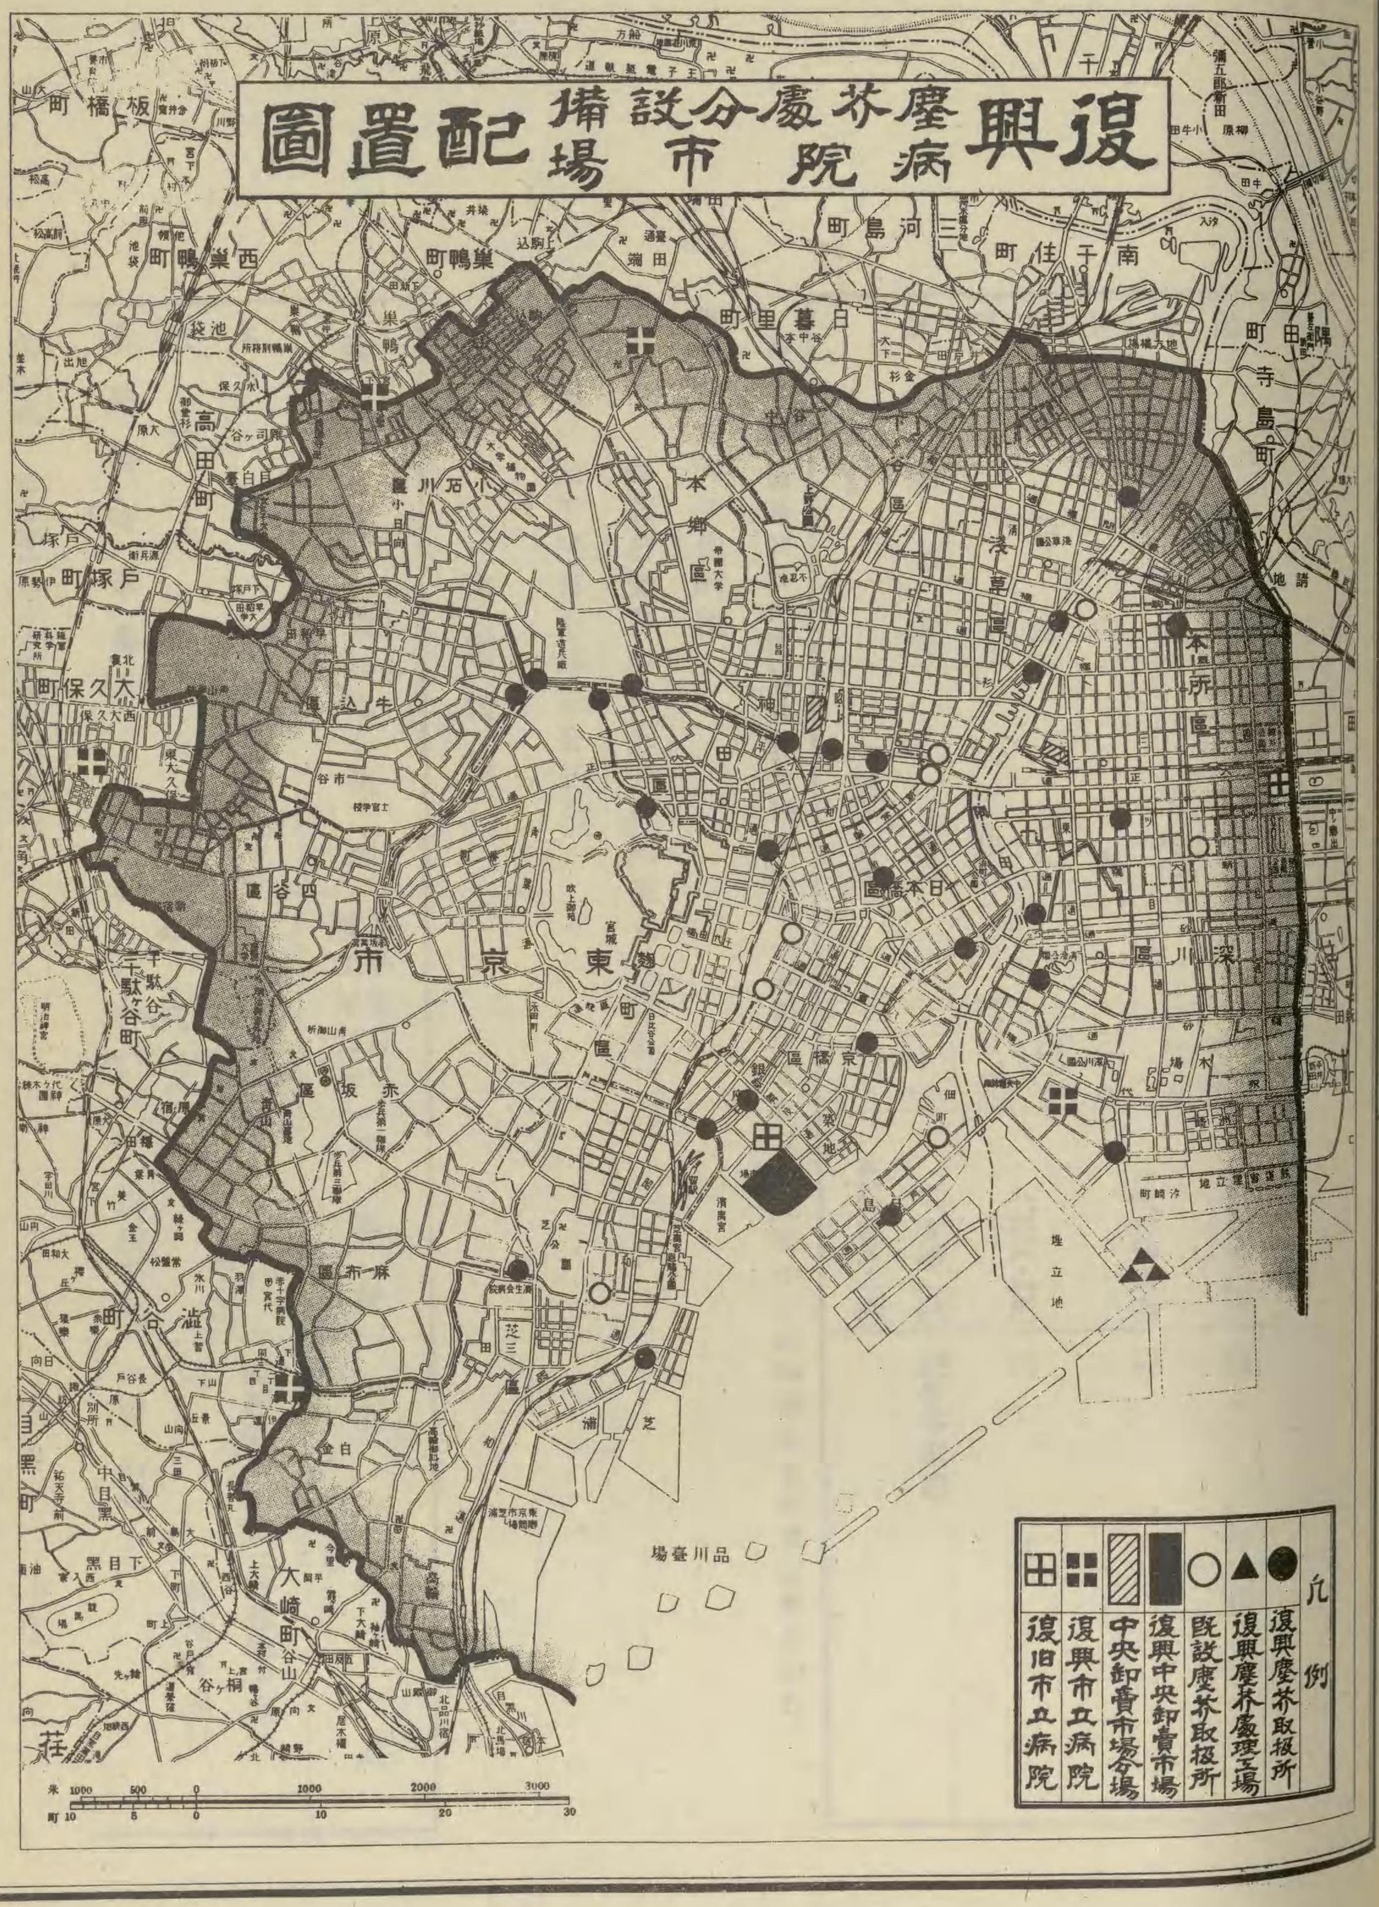

建物種別	延建坪	著手竣工年月日	工事費	型式
本館	七三一・七二五坪	一五、二、一七 二、六、一七	一四四、七四五・六一〇円	鐵筋混凝土造三階建地下室付
普通病舍	一、三三四・四六〇	一五、二、一七 一五、一一、一八	三三二、七六一・六七〇	同
看護婦寄宿舍	二六〇・九〇六	一五、七、一四 二、五、二五	五八、四七〇・三九〇	同

二階建

煙	汽	屍
罐		
室	室	突
四一・六五四		
九八・九二〇		
一基		
一五、七、一四		
二、五、二五		
二、六、二七		
二、二、二		
一四、八五七・〇二〇	同	
四五、六九四・八七〇	同	
同	平家建	

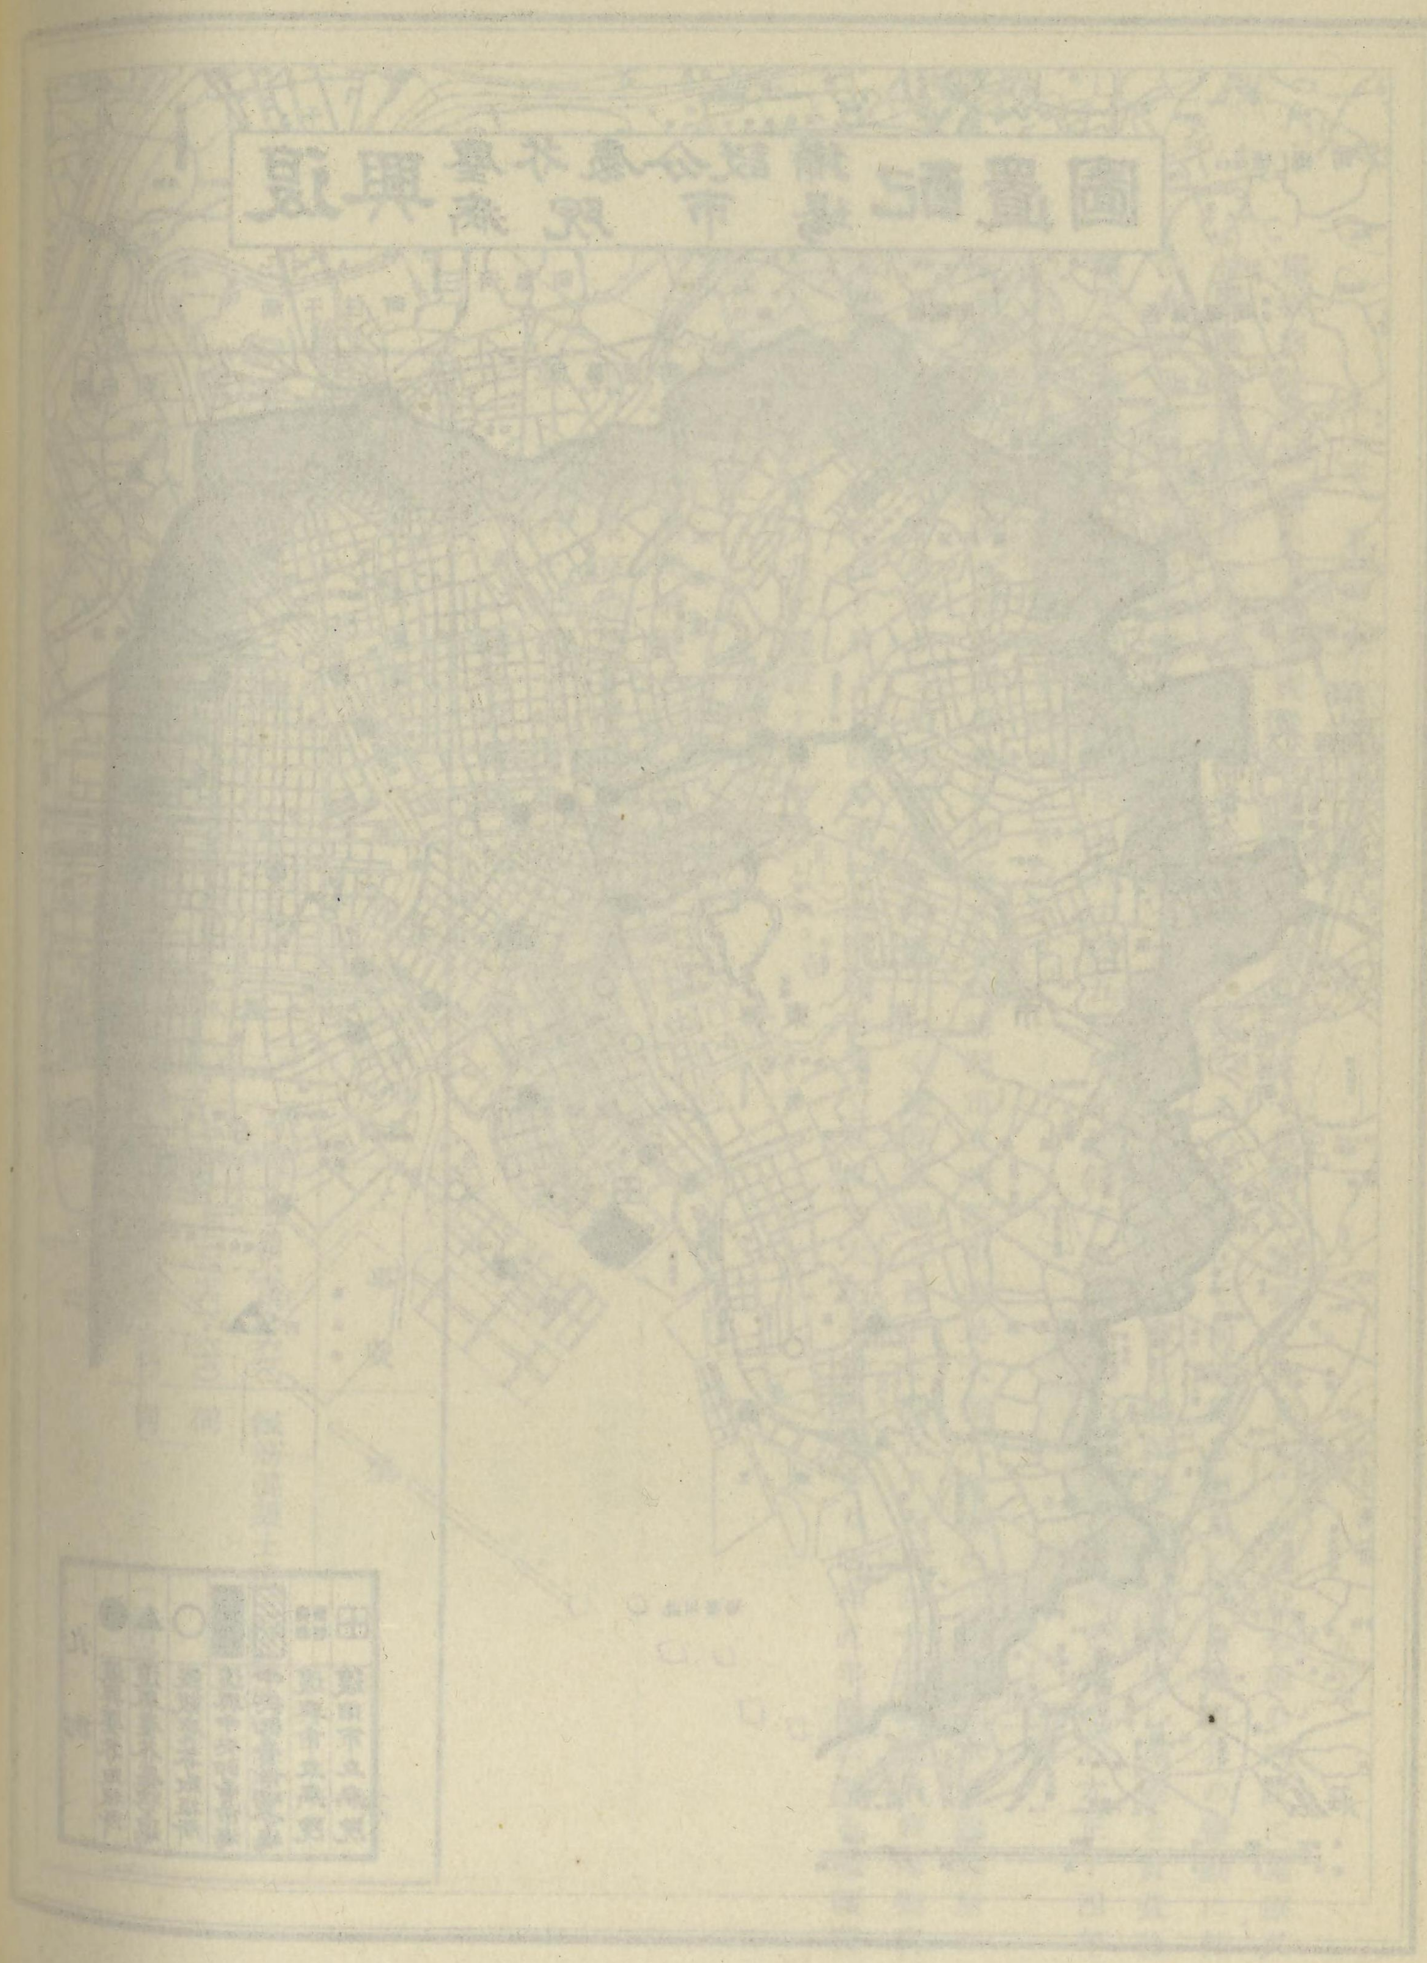

(二)

屍室	四一・六五四	一五、七、一四 二、五、二五	一四、八五七・〇二〇	同	平家建
汽罐室	九八・九二〇	二、六、二七	四五、六九四・八七〇	同	同
煙突	一基	二、一二、二			
守衛詰所	九・〇〇〇坪	二、一〇、二〇	九、二二四・四三〇	同	同
門	二箇所	三、二、二九			
燒却爐上家	九・三三〇坪	二、一〇、一八 二、一二、七	二、七八四・一六〇	鐵骨平家建	
計	二、四七六・九九五坪		五八八、五二八・一五〇		

備考　本館及其の他附屬建物は特別病室と共用するを以て工費中には特別病室負擔工費を含む。

東京市立大久保病院

所在　東京府豐多摩郡大久保町東大久保五三〇

敷地　三千三百七坪三合三勺

建物設備

建物種別	延建坪	著手年月日 竣工年月日	工事費	型式
本館	六五九・八二五坪	一五、五、一一 二、六、九	二二六、五〇四・〇八〇円	鐵筋混凝土造三階建地下室付
普通病舍	三六八・四四五	一五、五、一一 二、三、三一		同　一部地下室付
看護婦寄宿舍	二六四・〇〇〇	五、五、一一 二、六、九	二三、〇四五・三三〇	木造二階建

汽罐室	七五・三三八	二、六、二七	二四、六四九・九二〇	鐵筋混凝土造二階建
煙突	一基	二、一一、二四		
守衛詰所	二・四〇〇坪	二、一〇、二〇	一三、三〇〇・二八〇	同　平家建
門	二箇所	三、三、三〇		
生子板塀	四箇所			
燒却爐上家	八・三三〇坪	二、一〇、二〇 三、三、三〇	一、二七二・一六〇	鐵骨平家建
便所其の他	三・八九〇	三、八、六 三、一二、一一	一、六二三・一七〇	鐵筋混凝土造平家建
計	一、三九一・二二八坪		二八九、三九四・九四〇	

備考　本館及其の他附屬建物は特別病室と共用するを以て工事費中には特別病室負擔工事費を含む。

(三)

東京市立大塚病院

所在　東京市小石川區大塚辻町一八

敷地　八千九百六十二坪六合五勺

建物設備

建物種別	延建坪	著手年月日 竣工年月日	工事費	型式
本館	五四四・〇〇〇坪	二、六、二五 三、一二、三	一一四、五八五・四六〇	鐵筋混凝土造二階建地下室付
普通病舍	七四三・六〇〇	二、六、二五 三、一二、三	一五六、五五二・五九〇	同　三階建同
看護婦寄宿舍	四二九・三二六	一五、九、一 二、四、一七	九六、一二四・四七〇	同　二階建同

（四）

建物種別	延建坪	著手年月日 竣工年月日	工事費	型式
本館及病舍	六七〇・〇六七坪	四、一、一四 四、一二、九	一八九、五六七・五七〇円	鐵筋混凝土造三階建一部平家建
屍煙室	二三・三九七	四、一一、一 五、二、二八	一九、〇三三・三八〇	鐵筋混凝土造平家建
門扉	六九三・四六四坪		二〇八、六〇〇・九五〇	

備考　本館及其の他附屬建物は特別病室と共用するを以て工事費中には特別病室負擔工事費を含む。

東京市立深川病院

所在　東京市深川區古石場町二三ノ一

敷地　千八百十二坪一合八勺

建物設備

建物種別	延建坪	著手年月日 竣工年月日	工事費	型式
屍汽罐室	三〇・四五〇	三、六、五 四、三、三〇	三一、〇三〇・五一〇	同　平家建
煙突	一一八・四二八	三、九、一四 四、二、二	一八、三七二・五一〇	同
守衞詰所	一基 七・六三〇坪	四、三、一三 四、七、一三	三、〇六四・六一〇	同
門塀	二箇所 四・一間	四、三、一二 四、七、一二	九、七四七・九四〇	同
燒却爐上家	一八・二八六坪	四、七、一四 九、一三	三、三四二・六五〇	鐵骨平家建
計	一、八九一・七一〇坪		四三、八一〇・七七〇	

建物種別	延建坪	著手年月日 竣工年月日	工事費	型式
本館	五四四・〇〇〇坪	二、六、一五 三、一二、三	一一四、五八五・四六〇	鐵筋混凝土造二階建地下室付
普通病舍	七四三・六〇〇	二、六、二五 三、二、三	一五六、五五二・五九〇	同　三階建同
看護婦寄宿舍	四二九・三二六	一五、九、一 二、四、一七	九六、一二四・四七〇	同　二階建同

（五）東京市立駒込病院

所在　東京市本郷區駒込動坂町三六

敷地　九千九百一坪

建物設備

建物種別	延建坪	著手竣工年月日	工事費	型式
病舍竝幹部室	六九三・二〇三坪	四、八、一四 五、二、三〇	一五五、一〇〇・〇〇〇円	鐵筋混凝土造三階建一部地下室付
看護婦寄宿舍	五六六・四三一	同	一三八、一〇六・六九〇	同　三階建
汽罐室	一六七・九九	同	四〇、七二六・一〇〇	同　二階建
煙突	一基	同	一五、〇三七・八〇〇	
門衞所	一四・八三坪	五、一〇、一 五、一三、三	三、三一〇・〇〇〇	同　平家建
消毒婦詰所	一九・九六五	同	三、八〇〇・〇〇〇	同
倉庫	一三・七〇五	同	一、八六〇・〇〇〇	同
燒却爐上家	二〇・〇〇〇	六、一、一五 六、三、一五	三、〇〇〇・〇〇〇	鐵骨平家建
計	一、四九五・〇八四坪		三五〇、九五〇・五九〇	

第六項　社會事業施設

一　事業概要

本市經營に係る社會事業施設の大半は震火災に依り燒失したるを以て之が應急の施設として、內務省交付金、震災善後會義捐金、其の他の寄付金、委託金等を以て當面の必要に應じ差當り職業紹介所、託兒所、兒童健康相談所、公衆食堂、簡易宿泊所、質屋、浴場等の施設を復舊することゝしたるも帝都復興計畫の確立に伴ひ、改めて復興事業として施設せらるゝに至りたるを以て、大正十三年三月市會の決議を經て、豫算總額四百五十二萬五千圓、執行年度を大正十三年度より昭和三年度に至る五箇年繼續事業として

第六項　社會事業施設

一　事業概要

本市經營に係る社會事業施設の大半は震火災に依り燒失したるを以て之が應急の施設として、内務省交付金、震災善後會義捐金、其の他の寄付金、委託金等を以て當面の必要に應じ差當り職業紹介所、託兒所、兒童健康相談所、公衆食堂、簡易宿泊所、賓屋、浴場等の施設を復舊することゝしたるも帝都復興計畫の確立に伴ひ、改めて復興事業として施設せらるゝに至りたるを以て、大正十三年三月市會の決議を經て、豫算總額四百五十二萬五千圓、執行年度を大正十三年度より昭和三年度に至る五箇年繼續事業として左の事業を執行することゝなれり。

事業種別	豫算額	設置箇所	建物構造	建物延坪
職業紹介所	四三四、二五〇円	一五	鐵筋混凝土	九七五坪
託兒所竝健康兒童相談所	七七五、五〇〇	一〇	同	一、四〇〇
婦人授産場	四八七、〇〇〇	五	同	八〇〇
公衆食堂	四八三、四〇〇	一〇	同	一、〇〇〇
簡易宿泊所	一、四四八、四〇〇	一〇	同	三、三三三
質屋	一七〇、三五〇	七	同	二六六
浴場	五八三、九〇〇	一〇	同	一、〇〇〇
設計監督費	一四二、二〇〇			
計	四、五二五、〇〇〇	六七		八、七七四

然るに其の後事業の進捗狀況に伴ふ完成期間の一箇年延長及計畫變更の必要を生じ、昭和三年三月市會の決議を經て豫算及事業内容を左の如く更正せり。

事業種別	豫算額	設置箇所	建物構造	建物延坪
職業紹介所	四二四、〇五〇円	三	鐵筋混凝土	九六七坪
託兒所竝兒童健康相談所	七六〇、六二〇	一〇	同	一、三六二
婦人授産場	四七六、九二〇	五	同	七九〇
公衆食堂	四七一、七一〇	一〇	同	一、〇〇〇
簡易宿泊所	一、三九八、九〇〇	一〇	同	三、二八三
質屋	一六九、五九〇	七	同	二六六
浴場	五八一、七六四	一〇	同	一、〇〇〇
設計監督費	二四一、四四六			
計	四、五三五、〇〇〇	六四		八、六六八

其の後浴場施設は民間浴場の復舊分布狀態に依り十箇所の建設を必要とせざると、知識階級失業者救濟の爲新に授職場一箇所新設することゝなりたる外、社會の趨勢に伴ひ事業内容に一部變更の必要を生じたる結果更に事業年度を一箇年延長し、昭和五年度迄繼續執行することゝし、昭和五年三月市會の決議を經て左の如く豫算の更正及事業内容の變更を見るに至れりと雖、其の後に至り簡易宿泊所二箇所、浴場一箇所は中止し、託兒所竝兒童健康相談所二箇所、婦人授産場一箇所、公衆食堂三箇所の殘工事は既定豫算の範圍内に於て和昭六年度に於て施行せり。

事業種別	豫算額	設置箇所	建物構造	建物延坪
職業紹介所	四二四、〇五〇円	三	鐵筋混凝土	一、〇四二坪
託兒所竝兒童健康相談所	九六〇、七四〇	一四	同	一、八七八
婦人授産場	五四四、一〇〇	六	同	八五〇

會の決議を經て左の如く豫算の更正及事業内容の變更を見るに至れりと雖、其の後に至り簡易宿泊所二箇所、浴場一箇所は中止し、託兒所竝兒童健康相談所二箇所、婦人授産場一箇所、公衆食堂三箇所の殘工事は既定豫算の範圍内に於て和昭六年度に於て施行せり。

事業種別	豫算額	設置箇所	建物構造	建物延坪
職業紹介所	四二四、〇五〇円	一三	鐵筋混凝土	一、〇四二坪
託兒所竝兒童健康相談所	九六〇、七四〇	一四	同	一、八七八
婦人授産場	五四四、一〇〇	六	同	八五〇
公衆食堂	四六三、五一〇	一〇	同	一、〇〇四
簡易宿泊所	一、四〇六、七八〇	一三	同	三、七四七
質屋	一五二、二五〇	七	同	二七七
浴場	二一一、六八四	三	同	二四〇
授職場	一四九、〇〇〇	一	同	二五〇
設計監督費	三三、八八六			
計	四、三五五、〇〇〇	六六		九、二八七

備考　本事業中職業紹介所に對しては建設費の二分の一、其の他は四分の一の國庫補助を支給せらる。

二　施設

(一)　職業紹介所

職業紹介所は明治四十四年淺草及芝區に各一箇所を創設し、次で大正九年に至り經濟界の恐慌に伴ひ失業者頻出せるに依り、中央職業紹介所を初め市内適當の地を選び合計十二箇所の設置を計畫し、震災前に於て中央・上野・玉姫・芝園・大塚・新宿・淺草・江東・厩橋の九職業紹介所の開設を見たり。

然るに大正十二年の震火災に因り芝園・大塚・新宿の三箇所を除き他は全部烏有に歸したるを以て直に應急施設として臨時職業紹介所十七箇所を設け燒失を免れたる三箇所を合し二十箇所を以て職業紹介事務に當れり。

復興計畫に於ては當初十五箇所の新築及改築を行ひ、之に燒失を免れたる前記三箇所の內芝園、新宿（新宿職業紹介所は後に花園職業紹介所と改め、大塚職業紹介所は改築す）の二箇所を合せ、都合十七箇所を以て勞働者、婦人、少年、俸給生活者及技術勞働者等の職業紹介を爲すの外、附帶事業として勞働賃金竝就職旅費の貸與、少年の性能診査、人事相談、職業指導等を併せ實施するものなりと雖、其の後計畫に變更を來したる結果左の十三箇所に改め、建物は全部鐵筋混凝土造となし附帶設備をたすものなり。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪數	建物構造	起工年月日 竣工年月日
神田職業紹介所	神田區鎌倉河岸二七號	八八、六七一・四九円	二四〇・〇〇坪	二五五・二三四坪	鐵筋混凝土造三階建	二五、一一、三 二、七、二〇
上野職業紹介所	下谷區上野三橋町一三	二三、二六四・〇六	四七・四九	六九・二七〇	同	二、一二、三 二、八、二七
淺草公園職業紹介所	淺草區淺草公園六區三號	一九、〇三五・五四	二九・三〇	五六・三五五	同	二、一二、九 二、一一、二
江東橋職業紹介所	本所區入江町二四	一八、五七・四四	六〇・〇〇	六三・一〇〇	同	二、四、七 二、一〇、六
玉姬職業紹介所	淺草區玉姬町一二六	一九、六八五・〇〇	二一〇・〇〇	五九・三五〇	同	二、八、四 三、二、一九
芝浦職業紹介所	芝區芝浦町一ノ一	一七、八四四・六二	九七・〇〇	五九・四八六	同	二、八、三〇 三、二、一六
大塚職業紹介所	小石川區大塚辻町一八	二三、一八五・五一	五〇・〇〇	四八・五一〇	同	二、一〇、一四 四、九、二三
深川職業紹介所	深川區富川町三一	二四、三四一・〇〇	四八・〇〇	五三・九〇四	同	三、三、一四 四、九、二三

玉姫職業紹介所	淺草區玉姫町一二六	一九、六八五・〇〇	一三〇・〇〇	五九・三五〇	同	[illegible] 三、二、一九
芝浦職業紹介所	芝區芝浦町一ノ一	一七、八四四・六二	九七・〇〇	五九・四八六	同	三、八、三〇 三、二、一六
大塚職業紹介所	小石川區大塚辻町一八	三、一八五・五一	五〇・〇〇	四八・五三〇	同	二、一〇、一四 四、九、二
深川職業紹介所	深川區富川町三一	二四、三四一・〇〇	四八・〇〇	五三・九〇四	同	三、三、一四 四、九、二

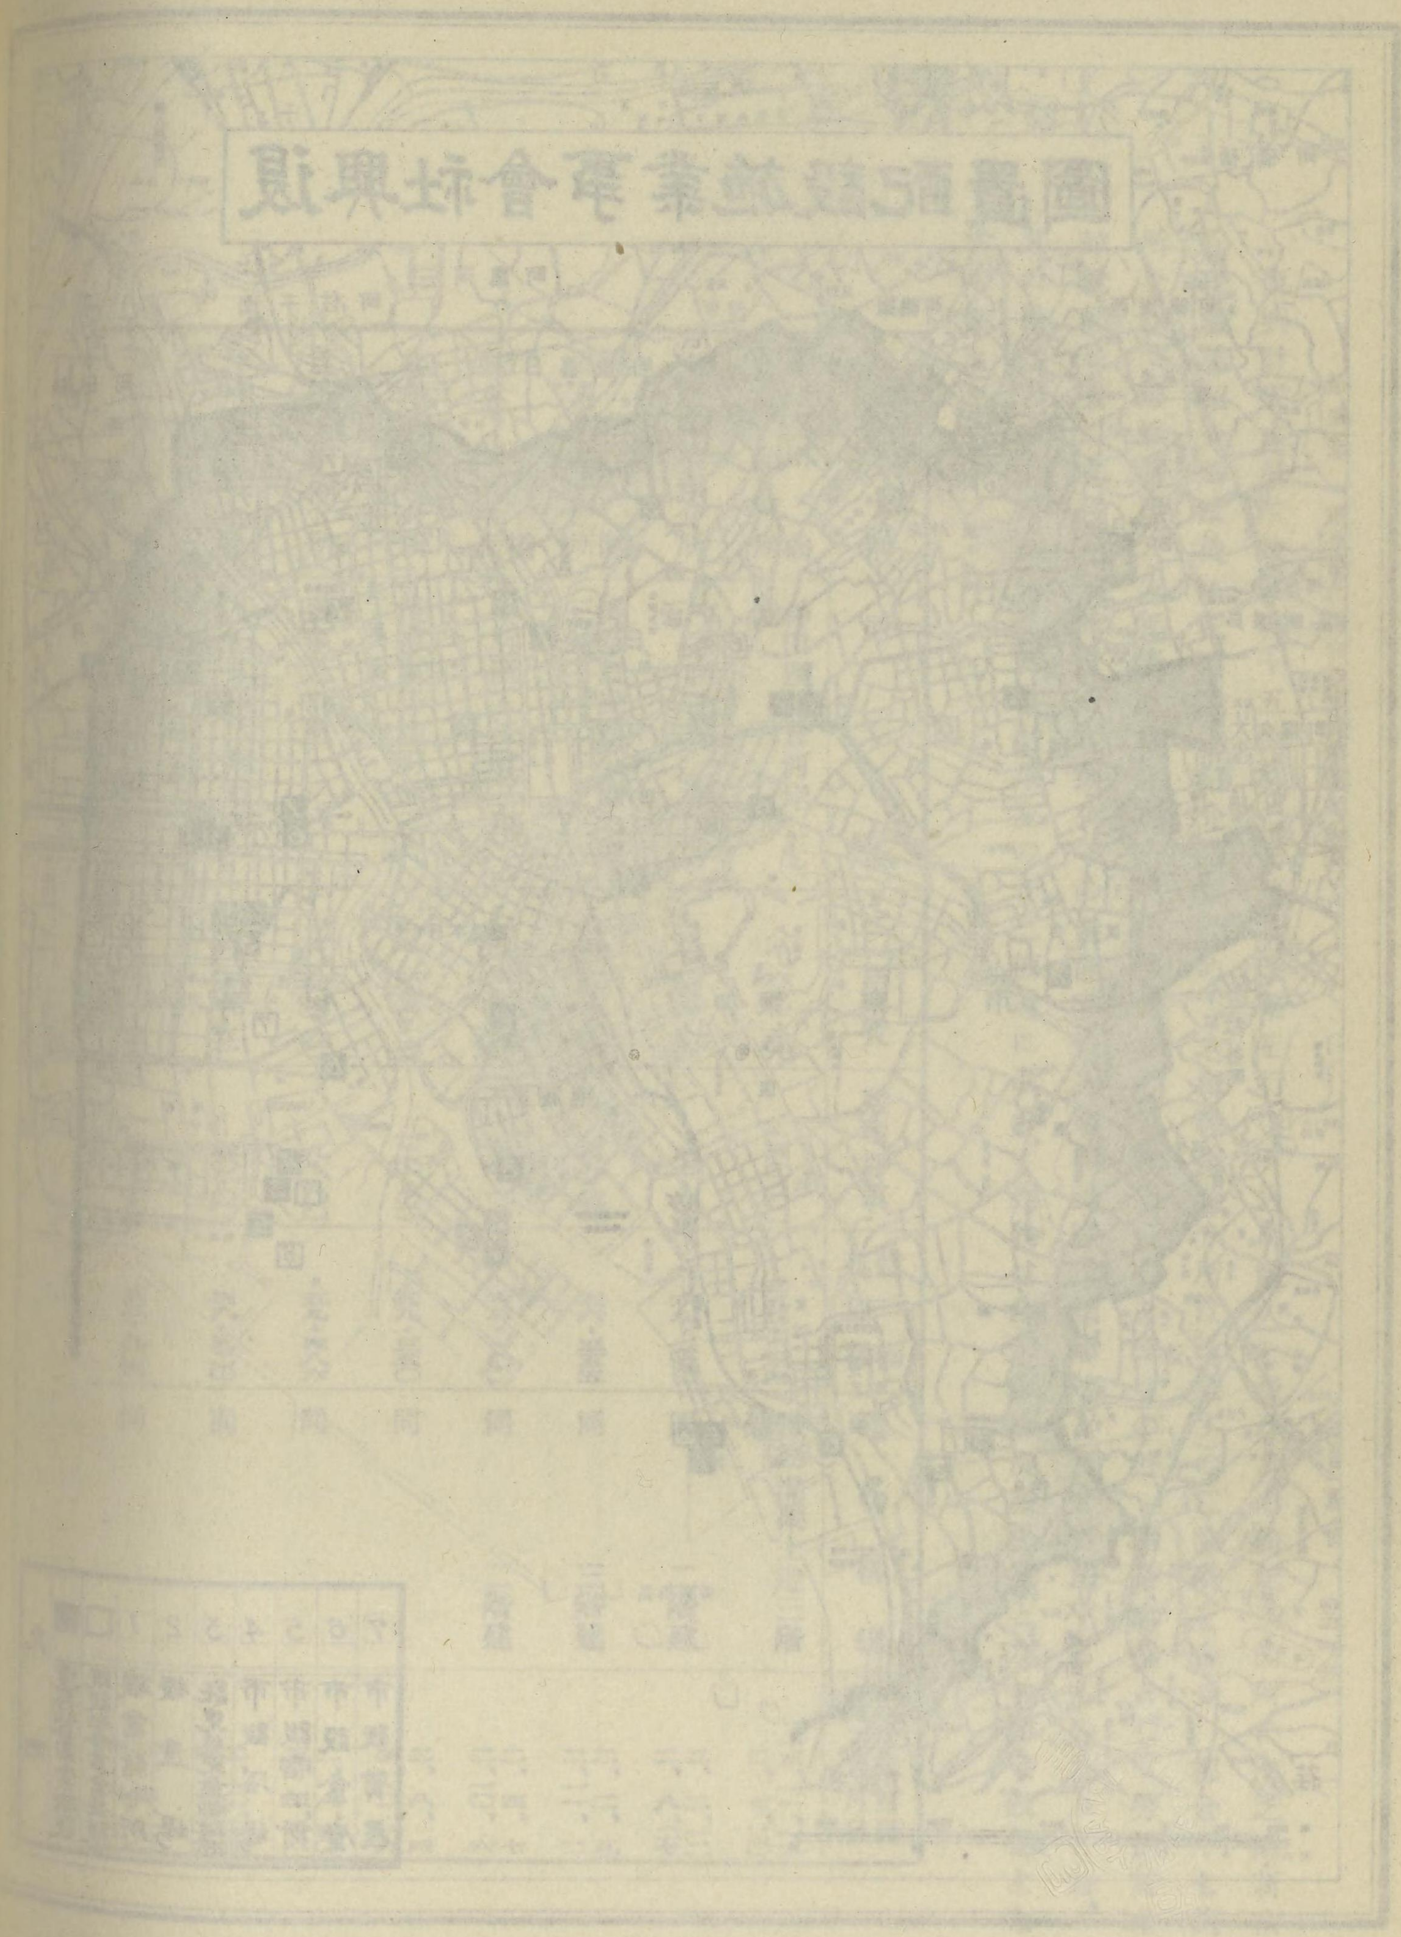

業平橋職業紹介所	本所區中ノ郷業平町一二四ノ三	三〇、〇三〇・〇〇	五〇・〇〇	五〇・〇〇〇	同
綠町職業紹介所	本所區綠町一ノ一七	二五、六六七・〇〇	四一・六八	四九・六三一	同
					五、四、二〇
					五、九、二〇
					四、八、二〇
					五、一、三一
					三、四、一四

職業紹介所	平橋	本所區中ノ郷業平町一二四ノ三	三〇、〇三〇・〇〇	五〇・〇〇	五〇・〇〇〇	同		五、四一〇
職業紹介所	綠町	本所區綠町一ノ一七	二五、六六七・〇〇	四一・六八	四九・六三一	同		五、九一〇
職業紹介所	本郷	本郷區元町一ノ一六	六〇、七七三・二六	八五・〇〇	一三〇・六八〇	同	三階建	四、八一〇
職業紹介所	新宿	府下千駄ケ谷町廐通一〇〇三ノ二	三五、九三〇・〇〇	一〇三・三五	七四・五九一	同	二階建	三、四一四
職業紹介所	小石川	小石川區小石川町一	三八、〇八四・九八	六〇・四〇	七一・〇〇〇	同		五、八一五
設計監督費			二五、九五〇・〇〇					三、二五
計			四五〇、〇〇〇・〇〇	一、〇三一・三三	一、〇四一・一三			五、四一〇

(二) 託兒竝兒童健康相談所

本事業の目的とする處は小額收入の家庭に於ける學齡未滿の幼兒又は生後六箇月以上の乳兒に對し晝間保育をなし、以て父母をして安んじて業務に從事せしむると共に兒童の健康及育兒方法等に付諸般の相談に應じ、一般家庭に於ける育兒知識の指導普及を助長せしむるにあり。

而して託兒所は大正十年六月本所區入江町に開設せるを始めとし、次で深川區富川町に開設したるが何れも震火災に依り燒失せり、震災後益々其の緊要なるを認め、右二箇所を復舊すると共に、一面震災善後會交付金七萬五千圓を以て月島、玉姫町、龍泉寺、押上町、古石場町第一及第二、西平井町、千田町の八箇所を建設せり。

兒童健康相談所は大正十二年六月初めて江東橋兒童健康相談所を開設し、漸次明石町、富川町、玉

姫町の三箇所を開設したるも之亦震災の爲焼失したるを以て、其の後築地、四谷の五箇所を開設せり。

復興計畫に於ては託兒所及兒童健康相談所を廢合し、託兒竝兒童健康相談所十箇所を建設する計畫なりしと雖其の後四箇所を追加し十四箇所を設置するものにして、一箇所受託兒童平均八十人とし、建物は全部鐵筋混凝土造とし、兒童の運動場、遊戲室、唱歌、談話、手技等を練習する保育室竝乳兒及匍匐兒室、健康相談所等を設け、其の他附帶設備を爲すものなり。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪數	建物構造	起工年月日 竣工年月日
		円	坪	坪		
月島託兒竝兒童健康相談所	京橋區月島通七ノ四	六六、三一八・三九	一八〇・〇〇	一九六・三七八	鐵筋混凝土造二階	一五、七、一六 二、一、三一
大塚同	小石川區大塚仲町三六	六六、九四七・五二	二七〇・〇〇	二三二・一二三	同	一五、一二、一六 二、六、一
龍泉寺同	下谷區龍泉寺町三七八	八〇、六三・〇〇	二七六・〇〇	二三二・七三一	同	三、七、一三 四、七、二五
玉姫町同	淺草區玉姫町一二六	五九、二七二・六九	一八五・〇三	一八八・一五	同	三、二、九 四、九、六
牛込區東榎町一六	牛込區東榎町一六	八〇、〇六七・五五	二一六・一六	二三二・四四六	同	四、五、一三 四、一一、一〇
深川區古石場町一七	深川區古石場町一七	五二、〇七五・〇〇	二五二・〇〇	二三二・七〇五	同	四、六、三 五、一、二七
本所區入江町二四	本所區入江町二四	六二、八八五・〇〇	二七八・一一	一七七・一二六	同	四、一一、八 五、二、七
深川區富川町四九	深川區富川町四九	六八、一〇七・〇〇	二七九・二六	一九二・二三七	同	四、六、二五 五、二、二六
白金三光町同	芝區白金三光町二七	八五、九〇四・九五	二七四・二八	一三二・四四六	同	四、五、一〇 五、二、二八
押上町同	本所區押上町二〇四	七〇、五六六・五〇	二七〇・五〇	一三二・四四六	同	四、七、三〇 五、三、二

白金三光町同	芝區白金三光町二七	八五、九〇四・九五	二七四・二八	一二三・四四六	同	四、五一〇、二一八	
押上町同	本所區押上町二〇四	七〇、五六六・五〇	二七〇・五〇	一二三・四四六	同	四、七三〇、三、二	
本村町同	深川區本村町一八九	四四、二〇〇・〇〇	二三六・〇〇	一二三・〇〇〇	同	五、六一〇、四一四	
藍染町同	本郷區根津藍染町八	六六、二〇〇・〇〇	二〇〇・〇〇	一二三・〇〇〇	同	五、七一〇、三三	
久堅町同	小石川區久堅町八九	六四、二〇〇・〇〇	二〇〇・〇〇	一二三・〇〇〇	同	五、一三、二六、八一三	
明石町同	京橋區築地明石町四一	九三、三七二・四〇	二〇三・〇〇	一三二・〇〇〇	同	六、六一、元	
設計監督費		六六、三二五・〇〇				工事中	
計		一、〇三七、〇五五・〇〇	三、三一〇・三六	一、九一七・七五三			

(三) 婦人授産場

本事業は主として生計の不如意なる家庭の婦人を收容し、ミシン裁縫其の他の手藝を教授し、授産も尙漸次希望に依り之を家庭に移し、本市より材料を供給して指定の物品を製作せしめ、之に對する相當工賃を支拂ひ、以て福利增進を圖らむとする施設にして、本授産場は震災前に於ては僅かに淺草區玉姫町職業紹介所内に於て小規模に細民婦女子に紙箱を製作せしめつゝありしも震災に因り焼失するに至れり。

震災後内務省社會局指定交付金十萬五千圓竝震災善後會交付金七萬圓合計十七萬五千圓を以て中央

淺草・小石川・本所・深川の五授産場を設置したり。

復興計畫に於ては當初十五箇所を建設する豫定なりしも後計畫を變更し、結局右五箇所を改築する外に新に四谷授産場を設置するものにして、建物は全部鐵筋混凝土造とし之に附帶設備を爲すものなり。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪數	建物構造	起工年月日 竣工年月日
中央授産場	芝區白金志田町一二	八三、八七六・三一円	二三一・〇四坪	一七五・五〇〇坪	鐵筋混凝土造三階建	一四、八、二八 一五、六、三〇
淺草同	淺草區田中町一二八	一〇二、九七九・九九	三一三・二三	一六八・九〇〇	同	一五、七、一五 二、三、三一
小石川同	小石川區大塚辻町一八	九二、四六八・九六	二五〇・〇〇	一六一・〇八一	同	三、二、二〇 九、六
本所同	本所區押上町一〇一	八六、九二一・一九	二五〇・〇〇	一七八・三七八	同	四、一、一六 四、八、二五
深川同	深川區千田町一二〇	九六、八五三・五五	二三〇・二〇	一八五・九四〇	同	四、二六 六、一、三
四谷同	四谷區谷町一ノ三四	八二、〇〇〇・〇〇	二三〇・〇〇	一四〇・〇〇〇	同	五、四、二六 六、一、三
設計監督費		三三、〇二五・〇〇				一、九 六、一二、二六
計		五七七、一三五・〇〇	一、三七五・四七	一、〇〇九・八八九		

(四)　公衆食堂

公衆食堂は少額所得者階級の生活緩和の一助となすを目的とし、大正七年雜部金を以て神樂坂及上野に創設し、次で日本橋外四箇所に開設準備中震災に遭遇し、神樂坂を除く他の全部は烏有に歸したり。

震災後震災善後會交付金十五萬圓を以て、丸ノ內・日本橋・神田・上野・兩國・九段・數寄屋橋・三味線堀・本所・深

四谷同	四谷區谷町一ノ三四	八二、〇〇〇・〇〇	二一〇・〇〇	一四〇・〇〇〇	同	同	同	同
設計監督費		三三、〇一五・〇〇						
計		五七七、一三五・〇〇	一、三七五・四七	一、〇〇九・八八九				

(四) 公衆食堂

公衆食堂は少額所得者階級の生活緩和の一助となすを目的とし、大正七年雜部金を以て神樂坂及上野に創設し、次で日本橋外四箇所に開設準備中震災に遭遇し、神樂坂を除く他の全部は烏有に歸したり。

震災後震災善後會交付金十五萬圓を以て、丸ノ內·日本橋·神田·上野·兩國·九段·數寄屋橋·三味線堀·本所·深川の十箇所を臨時開設せしが、之を復興計畫に移し復興事業として左の十箇所に新改築をなすものにして、建物は全部鐵筋混凝土造となし、之に附帶設備を爲すものなり。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建延坪數	建物構造	起工年月日 竣工年月日
神田公衆食堂	神田區鎌倉河岸二七	五九、八九五・五四 円	一四九・九二 坪	一五三・一四 坪	鐵筋混凝土造二階建	二、一五 二、七、二〇
三味線堀同	淺草區小島町八七	三二、三四・一三	七〇・〇〇	八八・六三六	同	一五、九、二 二、三、三
相生町同	本所區相生町五ノ三三	四七、〇〇四・二〇	八四・〇〇	七七・五一六	同	三、八、一五 四、四、二五
柳島同	本所區柳島元町一三九	五四、五八一・四九	五〇・八八	六八・九八五	同	二、一三、一七 四、二、二三
九段同	麹町區飯田町二丁目廿河岸一號	四七、三三七・五一	一四〇・七九	一二七・八八一	二階建	三、六、四 四、五、三
新宿同	府下千駄ヶ谷町甲州街道一、〇〇三	三一、六六・〇〇	五二・〇〇	六〇・七七九	同	五、七、二五 六、三、一七
上野同	下谷區車坂町二五	五〇、一七三・八二	六二・一七	一三二・六八五	三階建	四、一一、一三 五、七、一二
茅場町同	日本橋區南茅場町二三	四六、二〇七・四八	八四・三二	一二〇・〇〇〇	同	五、八、二八 六、四、三

芝園町同	芝區田町四ノ一七	四八、八二〇・〇〇	一七八・〇〇	七四・〇〇〇	同　二階建　六、六、二六工事中
龜住橋同	深川區黑江町六四ノ二	四五、五三九・八四	七〇・〇〇	一一〇・〇〇〇	同　六、九、一工事中
設計監督費		三七、〇四〇・〇〇			
計		五〇〇、五五〇・〇〇	九四二・〇八	一、〇〇三・六二三	

尙公衆食堂は右復興事業として執行するものゝ外內務省より交付の義捐金二十五萬圓を以て建設したる眞砂町・猿江町・大塚・芝浦・丸ノ內の五箇所及震災を免れたる神樂坂と都合六箇所を有す。

（五）簡易宿泊所

簡易宿泊所は少額收入の勞働者其の他の獨身生活者に對し充分なる休養を興へ保健を維持し得る低廉なる宿舍を供給するの趣旨を以て、淺草・芝の職業紹介所內に勞働者の宿泊所を附設せしが、其の後時勢の推移に伴ひ單獨に簡易宿泊所を獨立せしむるの必要を認め、先づ本所・深川の兩區に各一箇所を建設することゝし、本所簡易宿泊所を大正十一年五月開設し、深川簡易宿泊所を同十二年九月開設の豫定なりしが、震火災に因り前者は燒失し、後者は損傷を蒙りしを以て應急的救濟策として大阪府より寄贈されたる組立バラツク三十一棟を以て下谷・淺草・本所・深川の四區に亘り十一箇所の臨時簡易宿泊所を開設せしが、復興計畫に依り施設するの計畫成りたるを以て、之等臨時施設は濱園宿泊所を殘し他は全部撤去せり。

復興事業に於ては工事中震災に遭遇したる深川簡易宿泊所（鐵筋混凝土ブロニツク二階建にして工事殆ど竣成を見むとして該災害に類燒し、造作の大半を燒失したるも建築物には輕微なる損傷を蒙りしのみなり）及前記濱園宿泊所を修理竝增築せる外別に九箇所を選定新設の上全市十一箇所とし、一箇所收容人員平均二百人の計畫を以て鐵筋混凝土造とし、之に附帶設備を爲すものなり。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪數	建物構造	起工年月日 竣工年月日

豫定なりしが、震火災に因り前者は燒失し、後者は損傷を蒙りしを以て應急的救濟策として大阪府より寄贈されたる組立バラック三十一棟を以て下谷・淺草・本所・深川の四區に亘り十一箇所の臨時簡易宿泊所を開設せしが、復興計畫に依り施設するの計畫成りたるを以て、之等臨時施設は濱園宿泊所を殘し他は全部撤去せり。

復興事業に於ては工事中震災に遭遇したる深川簡易宿泊所(鐵筋混凝土ブロニツク二階建にして工事殆ど竣成を見むとして該災害に類燒し、造作の大半を燒失したるも建築物には輕微なる損傷を蒙りしのみなり)及前記濱園宿泊所を修理竝增築せる外別に九箇所を選定新設の上全市十一箇所とし、一箇所收容人員平均二百人の計畫を以て鐵筋混凝土造とし、之に附帶設備を爲すものなり。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪數	建物構造	起工年月日 竣工年月日
富川町宿泊所	深川區富川町五二	四一、四〇七・三三円	一六一・六七坪	三〇〇・九七〇坪	鐵筋ブロツク造增築及同二階建復舊	一四、五、一九 一四、九、二九
田中町同	淺草區田中町三八	一六七、二四四・七四	二三五・〇〇	四一六・八七〇	鐵筋混凝土造三階建	二、六、一三 三、六、三〇
向島同	本所區小梅瓦町七七ノ二	一三三、七五四・六一	二一六・二三	二七一・五九四	同	三、九、七 四、五、一
龍泉寺同	下谷區龍泉寺町三七八	一七一、二七五・〇五	二五八・七七	四七二・九二六	同	三、七、一四 四、七、二五
濱園同	深川區濱園町一	一三七、〇三九・九六	一七五・五七	三六〇・一〇〇	同	四、八、五 五、三、三〇
江東橋同	本所區入江町二四	一六四、六四七・〇〇	一六八・〇六	四七六・〇〇〇	同	四、一一、一八 五、二、一〇
芝浦同	芝區芝浦町一丁目一ノ五	一六一、六三二・八〇	二一二・八四	四三三・六二七	同	四、八、二七 五、七、一
新宿同	府下千駄ヶ谷町廏通一〇〇三	一〇五、一四九・〇〇	一五〇・四五	二六七・六四五	同	五、七、一五 六、三、一七
千田町同	深川區千田町二二〇	一四四、五九四・四二	二一〇・〇〇	三一〇・〇〇〇	同	五、六、一九 六、三、一九
靈岸町同	深川區靈岸町一六六ノ三	一四一、〇五七・五九	二一八・三五	三三一・〇〇〇	同	五、六、一八 六、三、三〇

橋場町同	中止				
伊勢崎町同	中止				
設計監督費		二四、二一〇・〇〇			
計		一、四七〇、九二三・五〇	二、〇三六・九四	三、六四九・六六	

(六)　質屋

市設質屋は庶民の金融機關の一にして、主として少額所得者階級に對し低率の利子且有利なる條件の下に少額の融通を爲すものなり。

本施設は、震災に依り金融機關を失へる下層階級の困却甚しき窮狀に鑑み、之が救濟の應急手段として震災善後會交附金中十五萬圓を以て淺草外四箇所に取敢へず開設したるものなるが、爾來利用者數も漸增し其の成績の見るべきものあるを以て復興計畫に於ては以上の外更に二箇所を加へ、合計七箇所を改築及新設するものにして、建物は全部鐵筋混凝土造となし、附帶設備を行ふものなり。

尙內務省より交付せられたる震災義捐金六十二萬圓に依り別に十一箇所を新設するを以て、市設質屋は近く全市に於て十八箇所の開設を見るに至るものとす。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪	建物構造	起工年月日 竣工年月日
月島質屋	京橋區月島二號地	一四、九三四・八四 円	三二・九三 坪	四二・〇〇〇 坪	鐵筋混凝土造二階建	一四、八、四 一四、一二、一四
大塚同	小石川區大塚仲町三六	二三、九六二・一六	一〇〇・〇〇	四二・〇〇〇	同	一五、一〇、一二 二、二、二六
田中町同	淺草區田中町三八	二四、四二〇・一三	六五・〇〇	三六・三五〇	同	二、六、一三 三、六、二五

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪	建物構造	起工年月日 竣工年月日
月島質屋	京橋區月島二一號地	一四、九三四・八四 円	三三・九三 坪	四二・〇〇〇 坪	鐵筋混凝土造二階	一四、八、四 一四、一二、二四
大塚同	小石川區大塚仲町三六	二三、九六二・一六	一〇〇・〇〇	四二・〇〇〇	同	一五、一〇、一二 二、二、二六
田中町同	淺草區田中町三八	二四、四二〇・一三	六五・〇〇	三八・三五〇	同	二、六、一三 三、六、一三
龍泉寺町同	下谷區龍泉寺町四二九	二〇、六七一・〇〇	六一・〇〇	三六・八六二	同	三、七、一四 四、七、二五
富川町同	深川區富川町二一	三二、八四五・八八	四八・〇〇	四二・五二九	同	四、三、一四 四、九、二二
既橋町同	本所區松倉町二ノ三三	二三、三九六・〇〇	四五・一〇	三八・二六六	同	四、三、一三 四、一〇、三〇
新宿同	府下千駄ケ谷町既通一、〇〇二	三二、〇二〇・〇〇	四〇・〇〇	三七・四一六	同	四、一〇、三一 五、四、一九
設計監督費		九、七七六・〇〇				
計		一六二、〇三六・〇〇	三九三・〇三	二七七・四三三		

倘內務省より交付せられたる震災義捐金六十二萬圓に依り別に十一箇所を新設するを以て、市設質屋は近く全市に於て十八箇所の開設を見るに至るものとす。

(七) 浴場

浴場は震災當時浴場營業者の復興進捗せざりし爲細民の衞生狀態を顧慮して震災義捐金中內務省より交付されたる三十一萬八千圓を以て二十九箇所に假設したるも、其の後一般營業者の復興するに隨ひ、之を閉鎖せり。

本事業は新規に十箇所を撰定し、全部鐵筋混凝土造二階建(古石場は平家建)一箇所平均百坪を標準とし、之に必要なる諸設備を完備するものとして計畫せしも、震災後民間浴場の急速なる復興及之が分布の狀態に鑑み、將又社會政策上よりするも强ひて十箇所の建設を必要とせざるを以て、左記二箇所

の建設に止むるに至れり。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪數	建物構造	起工年月日 竣工年月日
月島浴場	京橋區月島仲通八丁目一	三六、五〇四・〇六円	一三〇・〇〇坪	八五・一八〇坪	鐵筋混凝土造二階建	一五、七、一三 二、一、二四
古石場同	深川區古石場町二二	四六、二九五・四四	一九五・二〇	六九・〇〇〇	同	四、六、二六 五、二、四
大塚同	中止				平家建	
設計監督費		一六、一八〇・〇〇				
計		九八、九七九・五〇	三二五・二〇	一五四・一八〇		

(八)　授職場

近時財界不況の深刻化に伴ひ、智織階級失業者の激増を來し、職業紹介所に於ても就職斡旋の途なき者に對して、官公署、民間會社等と連絡を採り、筆耕・飜譯・廣告・圖案等の委託を受け又は臨時事務的職業の請負代辨等を爲し、之等失業者の技能に應じて職業を與ふる途を講ずる爲、差向き授職場一箇所を設置することゝし、小石川元陸軍造兵廠跡百八十九坪餘を陸軍省より買收し、鐵筋混凝土造三階建一棟を建設せり。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪數	建物構造	起工年月日 竣工年月日
飯田橋授職場	小石川區小石川町一	一四九、〇〇〇・〇〇円	一八九・六〇坪	二五〇・〇〇〇坪	鐵筋混凝土三階建	五、八、一 六、三、二五
設計監督費		一〇、四九〇・〇〇				

職業の請負代辨等を爲し、之等失業者の技能に應じて職業を與ふる途を講ずる爲、差向き授職場一箇所を設置することゝし、小石川元陸軍造兵廠跡百八十九坪餘を陸軍省より買收し、鐵筋混凝土造三階建一棟を建設せり。

名稱	所在	工事費	敷地坪數	建物延坪數	建物構造	起工年月日 竣工年月日
飯田橋授職場	小石川區小石川町一	一四九、〇〇〇・〇〇 円	一八九・六〇 坪	二五〇・〇〇〇 坪	鐵筋混凝土三階建	五、八、一 六、三、二五
設計監督費		一〇、四九〇・〇〇				
計		一五九、四九〇・〇〇	一八九・六〇	二五〇・〇〇〇		

備考　昭和六年四月二十日飯田橋職業紹介所とを併合し名稱を東京市知識階級職業紹介所と改む。

第七項　中央卸賣市場本場建設

一　事業概要

本事業は食料必需品に關し、需給を圓滑にし價格を公正ならしむるため配給機關を整備し、需給兩者の福利を增進し生活を安定ならしむるの趣旨に基き、大正十二年三月公布せられたる中央卸賣市場法に依據し、大正十三年四月三十日內閣認可東京都市計畫中央卸賣市場決定に基き京橋區築地四丁目內に中央卸賣市場本場を建設するものにして、繼續帝都復興費中中央卸賣市場建設費千五百萬圓を以て大正十三年度より同十五年度に至る三箇年の繼續事業として執行する計畫なりし處敷地買收關係に多くの日子を要したると、計畫の一部變更ありし爲昭和二年二月豫算を千六百五十萬圓に改むると同時に年度割を變更して昭和三年度迄延長せしが、更に昭和三年三月年度割を變更して昭和五年度迄延長したり、然るに其の後更に設計の變更を爲したる爲昭和五年三月豫算額を千五百萬圓に改め年度割を變更して昭和六年度迄延長することゝなしたるものにして、經費の四分の一卽ち三百七十五萬圓は國の補助を受け他の千百二十五萬圓は市債に依り支辨するものなり。

二　施設

一　建設費總額　一五、〇〇〇、〇〇〇圓

二　用地費　八、三八九、三五一圓

建築費　三、六四八、七七五圓

築地本場建設計畫概要

所在　京橋區築地五丁目一番地

坪數　五萬九千百二坪

敷地の當否が市場の機能に大なる影響を有するは論を俟たざる所にして、この見地より過去の狀況を參酌して將來の配給狀態を考慮し、水陸運輸に最も便利の地たる本地域を擇定するに至りたるものにして、隅田川口に臨み汐留驛に近く中央卸賣市場の敷地としては市內稀に見る好適の位置といふべし、該地は元海軍省用地にして、之が買收に關し大正十三年以來海軍省及大藏省當局と交涉を重ねたる結果昭和二年の終に至り漸く協定を見るに至れりと雖、市の豫算は其の見積低く爲に多大の不足を生じ、當初計畫の九萬八千坪を得るに至らず、已むなく前記五萬九千百二坪に減少し、其の內五千三十一坪は海軍省諒解の下に水面埋立を爲すこととし、二萬二千五百十八坪は代地交換に依り取得(市より月島竝芝浦の埋立地約三萬八千坪を提供す)三萬千四十八坪及鐵道引込線用地として五百五坪は買收することゝなれり。

築地本場は魚類、肉類、鳥類、卵、蔬菜、果實等を取扱ふ計畫にして、汐留驛より約一哩の引込線と隅田川の河岸に五十九間の繫船岸壁、六十間餘の橫棧橋及浮棧橋一個竝縱棧橋九個とを設け、神田、江東兩分場と共に相俟て其の機能を充分に發揮するの設備を以てす、構內の建物は鐵筋混凝土造及鐵骨造とし、卸賣人賣場、仲買人賣場、冷藏庫、倉庫、バナナ醱酵室、貨荷保管所を設け、其の他附屬商賣場、食堂、車馬置場、本市事務所、各組合事務所、巡査派出所、郵便局、銀行の出張所を設置し、尙水道及下水溝を隨所に通じ、通路鋪裝に依り入出荷の船車卸竝場內運搬を簡便容易ならしむるの外、魚腸骨、廢棄物の處理、夜間の照明裝置其の他附帶施設に就きてもその完璧を期し遺憾なからしむ。

と共に相俟て其の機能を充分に發揮するの設備を以てす、構内の建物は鐵筋混凝土造及鐵骨造とし、卸賣人賣場、仲買人賣場、冷藏庫、倉庫、バナナ醱酵室、實荷保管所を設け、其の他附屬商賣場、食堂、車馬置場、本市事務所、各組合事務所、巡査派出所、郵便局、銀行の出張所を設置し、尚水道及下水溝を隨所に通じ、通路鋪裝に依り入出荷の船車卸竝場内運搬を簡便容易ならしむるの外、魚腸骨、廢棄物の處理、夜間の照明裝置其の他附帶施設に就きてもその完璧を期し遺憾なからしむ。

築地本場建設計畫概要

一 建設費總額 一五、〇〇〇、〇〇〇圓

一	用地費	八、三八九、三五一圓
二	建築費	三、六四八、七七五圓
三	設備費	二、〇八八、七八七圓
四	設計竝監督費	八七三、〇八七圓

二 建物の概要

種別	構造	數量	單價	金額
一 建築ノ部				
(一) 卸賣人賣場				
イ、魚類	鐵筋混凝土及鐵骨建	延坪 一八、〇三七坪	鐵筋 一八五圓	二、八四七、七二五円
第一卸賣人賣場	鐵骨平家建	三、八四七坪	鐵骨 一四四圓	六三、五七一
第二卸賣人賣場		二、六八六坪	平均 一六七圓强	四三、八四〇
ロ、青果		二、二二六坪		三五五、六四〇
第一卸賣人賣場	鐵骨平家建	五六〇坪	一一〇圓	六七、二〇〇
第二卸賣人賣場		一、〇二五坪		一六六、九八一
ハ、肉、鳥、卵	魚類ニ同シ	六六〇坪	一六七圓强	一一〇、四〇六
ニ、其他	同	三六五坪	一五五圓	五六、五七五
(二) 仲買人賣場		七九坪	一六七圓强	一三、二二五
		五七坪		九、五三六
		七、九〇九坪		一、一三八、八九六

イ、魚類	鐵骨平家建	二、七五〇坪	一四圓	三九六、〇〇〇			
ロ、青果同	同	一、〇二〇坪	同	一四六、八八〇			
ハ、肉同	同	四七坪	同	六、七六八			
ニ、鳥同	同	三五坪	同	五、〇四〇			
ホ、卵同	同	三五坪	同	五、〇四〇			
ヘ、通路同	同	四、〇三三坪	同	五七九、一六八			
(三)附屬商賣場							
イ、魚類同	同	五一八坪	同	一一四、五九二			
ロ、青果其他同	同	三八三坪	同	八四、七二七			
(四)倉庫							
イ、鹽干魚	鐵筋混凝土二階建ホーム鐵骨下屋造	一三五坪	一三圓二〇	二九、八六五			
ロ、青果、卵同	同	七一〇坪	同	一三八、七〇〇			
(五)事務所其他							
イ、市事務所	卸賣場ノ階上鐵筋混凝土造	一五五坪	鐵筋二〇〇圓鐵骨一四〇圓	一〇七、七〇〇			
ロ、集會所同	同	五五五坪	同	三一、〇〇〇			
ハ、貸事務所同	同	一、七五五坪	一〇〇圓	三七〇、七〇九			
ニ、其他同	同	二三坪	同	四六、四一〇			
(六)買荷保管所							
イ、魚類	鐵骨平家建	一二坪	一〇圓	八一、五〇〇			

ロ、集會所	同	一二九坪	同	二七、〇九〇	
ハ、貸事務所	同	九八六坪	同	二〇七、〇六〇	
ニ、其他	同	四二九坪	同	九〇、一四九	
(六)買荷保管所	鐵骨平家建	一、〇五〇坪		一一五、五〇〇	
イ、魚類		七五〇坪		八二、五〇〇	

ロ、青果其他	同	三〇〇坪		三三、〇〇〇	
(七)バナナ醱酵室	醱酵室地下鐵筋混凝土造荷捌所地上鐵骨平家建	五〇〇坪	鐵筋鐵骨	一〇五、〇〇〇	
(八)荷揚場上屋	鐵骨平家建	三〇坪	三〇〇圓一三〇圓	三、六〇〇	
(九)牛馬繫留場	同	一〇〇坪	一二〇圓	一五、〇〇〇	
(一〇)便所	鐵筋混凝土洗滌式	七〇坪	一五〇圓	一五、〇〇〇	
(二)警官派出所其他	木造平家建	三三坪	三〇〇圓	二一、〇〇〇	
(三)排水ポンプ室	鐵筋混凝土平家建	一六坪	一三〇圓	三、八四〇	
(三)其他	同	十一箇所	二〇〇圓	三、二〇〇	
二設備ノ部					
(一)樁內鋪裝		二〇、〇〇〇坪		二〇五、一一七	
(二)鐵道引込線		一三六鎖	廢棄物置場地下倉庫地下道補強工事等	二、〇八八、七八七	
(三)橋		二個		四〇〇、〇〇〇	
イ、縱桟橋	鐵筋混凝土造木張	九個		一六八、〇〇〇	
ロ、橫桟橋	鐵筋混凝土造	一個		二六八、九六〇	
ハ、浮桟橋	臺船、連絡橋トモ鋼造	一臺	八、四〇〇圓	七五、六〇〇	
(四)浚渫竝埋立		四二、四一五坪	二〇圓	一五六、〇〇〇	
(五)護岸		二六九間	鐵道省へ委託	三一、三六〇	臺船連絡橋
イ、隅田川沿岸	補強修繕	一〇三間		六、〇〇〇	
ロ、上流護岸		一八七間		二三五、〇〇〇	
ハ、同下流護岸		六九五圓强		一五〇、四〇〇	
				二〇、四〇〇	
				一三〇、〇〇〇	

(六)	荷揚場			一四〇間	八四、〇〇〇	
	イ、築地本川沿荷揚場			五〇間	三〇、〇〇〇	六〇〇圓
	ロ、築地川東支川沿荷揚場			九〇間	五四、〇〇〇	同
(七)	給水設備			一式	一七五、〇〇〇	
(八)	排水設備			一式	一五二、五〇三	
(九)	電氣設備			一式	二〇五、〇九〇	
(一〇)	衞生設備			一式	三三、五五〇	
(二)	其他			一式	二二六、二八五	
三 冷藏庫ノ部						
(一)	冷藏室	鐵筋混凝土建	瓦斯、電話線昇降機等	一、四九〇坪	八〇一、〇五〇	
	イ、鮮魚冷藏室	同		八一〇坪	二七〇、六〇〇	
	ロ、鹽干魚冷藏室	同		三〇二坪	九九、六六〇	三五〇圓
	ハ、青果冷藏室	同		一二六坪	三八、二八〇	同
	ニ、肉冷藏室	同		一〇一坪	三三、三三〇	同
	ホ、鳥卵冷藏室	同		五三坪	一七、四九〇	同
	ヘ、アンチルーム	同		五九坪	一九、四七〇	同
(二)	貯氷室	同		一八九坪	六二、三七〇	同
(三)	製氷室	同		一三〇坪	五三、九五〇	四一五圓
(四)	事務室	同		二三〇坪	五一、九〇〇	二三〇圓
(五)	機械室	同	冷藏機械製氷機械	一三〇坪	一三、一〇〇	一〇〇圓
(六)	プラットホーム	鐵骨下屋造		一三〇坪	二六、〇〇〇	二〇〇圓
(七)	機械費				一四、四〇〇	一一〇圓
					三七〇、〇〇〇	二、八〇〇圓

(五)	機械室	同		一三〇坪	二〇〇圓	二六、〇〇〇
(六)	プラットホーム	鐵骨下屋造		一二〇坪	一二〇圓	一四、四〇〇
(七)	機械費		冷藏機械 製氷機械		一七〇、〇〇〇圓 二〇〇、〇〇〇圓	三七〇、〇〇〇

第八項　中央卸賣市場分場建設

一　事業概要

中央卸賣市場築地本場に神田及江東の二分場を附設するものにして帝都復興費以外別途豫算に屬する繼續中央卸賣市場分場建設費六百四十萬圓を以て大正十三年度より昭和五年度に至る七箇年繼續事業とし、其の財源は全部政府より低利資金の貸付を受けて施行するものなり、而して當初の計畫は豫算七百萬圓を以て大正十二年度より同十四年度に至る三箇年の繼續費として執行することに大正十三年三月市會に於て議決せしが其の後設計變更に依り豫算を六百四十萬圓に減額し、繼續年期を大正十三年度より昭和三年度迄延長することに大正十五年三月市會の議決を經、更に設計變更に依り百五十萬圓を追加して豫算を七百九十萬圓に增額し、繼續年期を昭和四年度迄延長することに昭和四年二月議決し(府參事會代理議決)事業遂行中の處起債に財源を需め追加したる百五十萬圓は政府の一般財政方針に依り當分許可せられざることゝなりたるを以て之を減額して再び六百四十萬圓と爲し、繼續年期を昭和五年度迄とし總經費を減額したる範圍に於て市場經營上差措き難き事業を施行するものなり、而して建物設備は既に大半竣功して附帶的設備を殘すのみなるを以て江東分場は昭和二年十一月神田分場は同三年十二月夫々中央卸賣市場として開設に至る迄の間臨時市設卸賣市場として業務を開始せり。

二　施設

(一)　神田分場

所在　神田區山本町外四箇町及下谷區練塀町

坪數　九千三百三十六坪餘

外に鐵道引込線用地八百四十八坪

本分場は秋葉原驛に接し隅田川支流神田川を控へ飯田町驛と相去ること遠からざるを以て貨物の集散上最も好位置を占む、右敷地の內二千九十九坪は元鐵道用地たりしを市有地と交換し他は民有地を買收せるものなり。

建物の構造は鐵筋混凝土及鐵骨建とし市場の中央に貫通道路を設け、南北に車馬置場を設け周圍に附屬販賣場竝買荷保管所を設置す、市場の中心地の北東中央部に本館を建て之を卸賣人賣場及營業人事務所食堂に當て本館周圍には仲買人賣場を建設す、尙神田川に面したる部分には棧橋、荷揚場を設け秋葉原驛構內鐵道引込線及水運に依り市場としての機能を充實せしむる施設を爲すものなり。

設計概要

種別	構造	數量	摘要
一建物	鐵筋混凝土竝鐵骨造平家	延坪　六、八六八坪 建坪　四、五四八坪	本館前上屋　二五四坪 本館一階　二一〇坪 卸賣場　一三三坪 階段室　三五坪 便所　一五坪 守衛詰所　七坪
卸賣人賣場	鐵筋混凝土竝鐵骨造平家	九三八	卸賣場　二四〇坪
		九三八	

種別	構造	數量 延坪	數量 建坪	摘要
一、卸賣人賣場	鐵筋混凝土竝鐵骨造平家	九三八	九三八	階段室　三五坪 便所　一五坪 守衞詰所　七坪 賣場　二四〇坪 賣場間通路　二三四坪
三、本館	鐵筋混凝土三階建地階付	五六九		
三、仲買人賣場	鐵骨造平家建	一、二八一	一、二八一	地階　一八五坪（食堂七三坪、倉庫七六坪、階段室三六坪） 一階　卸賣人賣場とす 二階　一八五坪（市事務所五七坪 營業人事務所五七坪、廊下四六坪、階段便所二五坪） 三階　一八八坪（營業人事務所五七坪、集合所六〇坪、廊下四六坪、階段便所二五坪） 屋階　一一坪
四、仲買人賣場	鐵骨混凝土造二階建	一、三〇二	一、三〇二	一階とす
五、倉庫竝計算所	同	一、二〇四	—	仲買人賣場二階とす
六、附屬商賣場	鐵筋混凝土造平家建	二四四	二四四	附屬商賣場　二一九坪 食堂　二九坪

種別	構造	數量 延坪	數量 建坪	摘要
一建物		六、八六八坪	四、五四八坪	本館前上屋　二五四坪 本館一階　二一〇坪 卸賣場　一三三坪

七、	其組合事務所の他	鐵筋混凝土造二階建	七一	一	附屬商賣場二階とす 事務所　五一坪　廊下　一一坪 階段室　九坪　屋階　二坪
八、	冷藏庫	鐵筋混凝土造竝鐵骨造三階建	三六五	二九	一階　一二九坪（冷藏室二八坪、豫冷室四坪、貯氷室一七坪、機械室二七坪、ブラインクーラー五坪、事務所一八坪、荷捌所一九坪、大庇一一坪） 二階　一一二坪（冷藏室五六坪、豫冷室七坪、製氷室三七坪、荷捌所一二坪） 三階　一一二坪（冷藏室八九坪、豫冷室一一坪、荷捌所一二坪、屋根一二坪）
九、	芋洗場	鐵骨造平家建	三九	三九	
一〇、	便所	鐵筋混凝土造平家建	二五	二五	
一一、	荷捌場上屋	鐵骨造平家建	五九	五九	
一二、	買荷保管所	鐵骨造平家建	四六九	四六九	
一三、	牛馬繫留所	鐵骨造平家建	六二	六二	
一四、	醱酵所	鐵筋混凝土造地階	二四〇	—	仲買人賣場地階とす
一五、	雜工事				門塀其の他
二	設備				

一四、	醱	酵	所	鐵筋混凝土造地階	二四〇	—	仲買人賣場地階とす
一五、	雜	工	事				門塀其の他
二	**設**		**備**				
一、	樁	内	鋪	裝			市場に沿ふ道路鋪裝
					四、八八九		六五九坪を含む
二、	鐵	道	引	込側線			秋葉原驛構内側線を敷設するものとす
三、	棧	橋	木	造	一個		佐久間河岸荷揚場に架設
四、	護	岸			延三二間		長二〇間　巾一間〇五（二一坪）
五、	設	備			一式		神田川佐久間河岸に築造す
六、	排	水	竝	給水設備	一式		
七、	雜	工	事				時報裝置換氣裝置芋洗機瓦斯工事其の他

(二)　江東分場

所在　本所區横網町

坪數　五千四百坪弱

本分場は東は幅員二十五米の龜澤町電車通に接し、西は江東製氷株式會社に面し其の一隅より幅員

九、	芋	洗	場	鐵骨造平家建	三九	三九	
一〇、	便		所	鐵筋混凝土造平家建	二五	二五	
一一、	荷	捌	場	上屋 鐵骨造平家建	五九	五九	
一二、	買	荷	保	管所 鐵骨造平家建	四六九	四六九	
一三、	牛	馬	繫	留所 鐵骨造平家建	六二	六二	

十五米の道路を以て隅田川岸道路に達し、南は其の一部に隅田川に通ずる幅員約二十八米の堀割を隔て兩國橋驛に隣接し北は遞信省用地、本所高等小學校に接す。

近郊に於ける貨物の出入は主として東西の道路を用ひ又地方荷の集散は兩國橋驛よりの鐵道引込線及隅田川に通ずる堀割を利用せしむるものにして江東方面に於ける最も水陸至便の地を占む。

建物の構造は神田分場と同樣大部分鐵筋混凝土造、一部を鐵骨造とし敷地の中央に賣場を設け其の東に事務所・營業人事務所・食堂を併せたる本館を設置す。

芋洗場を西隅に設けたるは排水に便ならしむるに依るものにして、尙兩國橋驛鐵道引込線に接して荷揚場を設け、隅田川岸に棧橋・堀割に繫船場を設け、水陸共に貨物の荷揚に便ならしむ。

設計概要

種別	類別	構造	數量 延坪	數量 建坪	摘要
一建物					
一、卸賣人賣場	鐵筋混凝土造竝鐵骨造平家建		五〇〇	二、八二九坪	
二、仲買人賣場	鐵筋混凝土造平家建		六〇五	二、一五八坪	
三、倉庫	鐵筋混凝土造二階建		四四七	五〇〇	
四、仲買人賣場間通路屋根	鐵骨造上屋		六九八	六〇五	九棟
五、醱酵室	鐵筋混凝土造地階		二四	—	仲買人賣場二階とす
				六九八	內三一五坪は卸賣人賣場前通路屋根とす
				—	仲買人賣場地階とす
					一階　七九坪（食堂二九坪、附屬商館　七一坪五（營業人事務所四八坪、階段室八坪）
					二階　七二坪（一五坪及三三坪）、豫備室　七九坪、守衞詰所及便所一八坪、

三、倉庫	鐵筋混凝土造二階建	四四七	—	仲買人賣場二階とす
四、仲買人賣場間通路屋根	鐵骨造上屋	六九八	六九八	内三一五坪は卸賣人賣場前通路屋根とす
五、醱酵室	鐵筋混凝土造地階	二四	—	仲買人賣場地階とす
				一階　七九坪（食堂二九坪、附屬商二四坪、守衛詰所及便所一八坪、階段室八坪）
六、本館	鐵筋混凝土造三階建	二三一	七九	二階　七一坪五（營業人事務所四八坪（一五坪及三三坪）、豫備室九坪、階段室九坪、廊下五坪） 三階　七一坪五（市事務室五三坪、豫備室九坪、階段室九坪、屋階九坪）
七、冷藏庫	鐵筋混凝土造二階建	九七	四九	一階　四九坪（冷藏室一一坪、豫冷室一坪、貯氷室六坪、機械室九坪、ブラインクーラー三坪、事務所六坪、大庇五坪、荷捌所八坪） 二階　四四坪（冷藏室三五坪、豫冷室三坪、荷捌所六坪、屋階四坪
八、附屬商賣場	鐵筋混凝土造平家建	二〇	二〇	九坪、四坪、七坪
九、芋洗場	鐵骨造平家建	二六	二六	
一〇、買荷保管所	同	一三	一三	七棟
一一、ポンプ室	鐵筋混凝土造平家建	一	一	
