

▲中華郵政掛號認爲新聞紙類▼

中華民國二十一年五月三十一日 第二卷 第五期

隴海鐵路潼西工程月刊

隴海鐵路潼西段工程局編印



總 理 遺 囑

余致力國民革命凡四十年其目的在使中國成爲一獨立之國家及民族之自由平等。今雖死而不避。死後願國體之永久。國民革命成功之日。四十年之經驗。足以告國人。深望國民。必能領此。民衆之聯合。世界之和平。我輩之共同。奮鬥之志。現任革命。成功之日。凡我同志。務須依照。我革命之。著建國方略。三民主義。及第一。次全國。國代表大會。之宣言。言繼承。最近。求貫徹。最近。張開。國。及。廢。條約。尤。須。其。現。是。所。至。囑。實。

隴海鐵路潼西工程月刊第二卷第五期目錄

工程紀要

(甲) 第一分段橋工進行狀況

(乙) 定綫測量工作情形

(丙) 擬定建築華陰兵工廠岔道辦法

(丁) 華陰以西收購土地辦理情形

(戊) 委託本路管理局兼管本局工段電務

(己) 調查第一分段內餘地

行政紀要

(甲) 記事

(乙) 人員任免調動

(丙) 擇錄重要公文

法規

西京籌備委員會組織條例

鐵道部職工教育委員會組織大綱

修正鐵道部直轄路警管理局組織大綱

專載

工務第一分段工作旬報


潼西定綫測量隊工作旬報

潼西定綫測量隊工作報告第四份

購地辦公處工作旬報

隴海鐵路通西工程月刊

目 錄



二

工程紀要

(甲) 第一段橋工進行狀況

第一段內橋梁涵洞等工程於上月選定包工陳源遠吳靜生董子紀三家分別簽訂承辦合同先後馳赴工場積極備料利用向交通兵團借來之小平車六十輛日夜輸送材料并將較大之橋提前開工

釣橋河四孔五公尺拱橋基脚地質甚佳又不見水施工並不感受若何困難又沙子河爲二十公尺鋼梁橋基脚開挖時發現沙層遂決定簽立木樁又白沙河劉義河兩處大橋亦因地層下有伏泉湧出流水甚旺乃將混凝土基礎改爲三種以臻鞏固并另各加木樁此外有二孔二公尺及二孔三公尺之小涵洞兩座因雨季流水尙不猛烈爲求均合實用節省工款計決將原計劃之中心墩兩端分水尖角取消又有二公尺與三公尺跨度并立之涵洞現經詳察決將二公尺之一孔取消

(乙) 定線測量隊工作情形

定線測量隊本月底已測達臨河附近公里四六一處最前定線已達窰村附近公里四七零處惟本月內迭據隊長李儼報告渭南以西沿途所栽木樵時被鄉民拔去辦理極感困難加之地方不靖盜匪時有出沒以致全隊時懷戒心當經先後文請陝西省政府楊主席飭屬嚴禁鄉民偷拔木樵並轉行綏靖公署飭沿途駐軍派兵隨隊保護以策安全所有往來函電附錄於後

(李儼冬電) 渭南以西木樵隨釘隨失長此以往工作無法繼續請電省府嚴飭各縣加意維護

(本局致楊主席敬電) 本路華西測量定線經函請貴府飭縣佈告對於該隊所栽木樵標誌不得損壞取

拔在案茲據本局測隊電稱渭南以西木樵隨簽隨失工作無法繼續等情爲此電請貴府迅予再行嚴飭沿綫各縣隨時加意保護以利進行是所盼禱

(楊主席復本局蒸電) 電悉渭南以西各處木樵隨栽隨壞有礙工程一節已嚴飭沿綫各縣剴切出示加意保護以利進行特復

(李儼函呈) 渭南四鄉日來頗不平靖五月七日上午渭南西二十里匪徒劫去旅客自行車一輛該客請兵追擊在杜化寺公里四三二附近開鎗轟擊全隊人員適在該處工作王隊員超鎗距離最近幾至中彈五月八日夜新馮村內公里四三三發生劫案五月九日陳隊員政和公畢回來於馬李灘東汽車路上公里四二五被匪攔劫失去掛表一只幸未受傷當晚即以測隊名義向縣署報告并要求保護據稱該處僅有武裝警察二名無法保護等語五月十日早就近向保衛團商撥團兵八名隨隊上工茲將經過情形函陳如上請予批准於必要時請兵保護再者測隊工作日內即越渭南縣境臨潼境內亦不平靜零口新豐且無保衛團請電武警務長來隊一二日接洽保護事宜

(本局致楊主席敬電)

據本路測量隊長李儼報告渭南四鄉不平靖隊員物件被匪劫去臨潼縣境亦不平

靖進行諸多阻礙等情特請電分飭渭南臨潼各縣及沿途駐軍酌派軍警隨隊保護以策安全并希電覆爲荷

(本局發武) 據李隊長報稱渭南臨潼境內匪氛不靖零口新豐且無保衛團請電武警務長來隊接洽保衛事宜等情除電請陝西省政府分飭各縣及沿途駐軍酌派軍警隨隊保護外仰迅往該隊接洽具報

(本局發復) 寒電敬悉已咨請西安綏靖公署轉飭沿途駐軍派兵保護以利進行特復

(本局發李) 據報渭南臨潼四鄉不靖經電請陝西省府分飭駐軍派兵隨隊保護茲准電復已咨請西安綏靖公署轉飭沿途駐軍派兵保護等由仰知照與各駐軍接洽可也

(陝西省政府) 前准貴局寒電內開據測量隊長李儼報告渭南臨潼等縣境不平靖進行測量工作諸多阻礙請飭各縣沿途駐軍保護以策安全等因准此當經咨請西安綏靖公署查照轉飭各該縣沿途駐軍派兵隨測量隊出發藉資保護在案茲准咨復已令飭四十二師轉飭各該縣駐軍派兵保護請查照轉達等因准此相應函達即希查照爲荷

(丙) 擬定建築華陰兵工廠岔道辦法

建築華陰兵工廠岔道一案前奉部令飭將建設經費及將來修養費用查照鞏縣兵工廠前案以用戶担任爲原則當經查案擬具辦法四條呈候部中核定其辦法如下

(一)隴海路潼西段工程局受華陰兵工廠委託代辦岔道之測勘製圖定綫監工及各項設計與估算等應由該廠方面先付路局洋二千元以作經費

(二)所有岔道圖算及估單說明等一經兵工廠認可即由該廠方面查照所估工料價款之數先行付款委託路局代為着手購地興工俟竣工後即交付該廠接收並將所需費用開單向廠結算

(三)岔道完成開始接岔行車時即再由隴海路管理局與該廠續訂租岔與行車各項合同俾利運輸

(四)岔道綫上修養事宜應由該廠自理惟路方工務人員得隨時前往查察以策安全設經路方察出軌道上有缺乏零件或損壞情事即通知該廠修理如欲委託路方代辦則一切修補費用仍由廠方擔任

(丁)華陰以西收購土地辦理情形

關於華陰以西收購土地事宜已於上月派課員李博率同員司前赴華陰先辦丈量手續沿綫土地情形極雜地上墳塚樹木甚多調查頗需時日計截至五月底止已丈抵華縣四零八公里九零零公尺處約長二七公里九零零公尺業主已達三千餘戶至沿縣協助及保衛事宜已准陝西省政府函知分別咨請綏靖公署轉飭沿途駐軍保護並令行各縣縣長協助辦理矣

(附陝西省政府來函) 頃准貴局總字第二一九號公函內開已派購地委員李博前赴華陰以西各縣辦理丈購路線應用土地事宜囑令飭華陰華縣渭南臨潼長安等縣政府於購地委員到達時

飭屬及地方紳耆儘量協助並分行沿途駐軍飭屬隨時保護以利進行等因准此除咨西安綏公署查照轉飭沿途駐軍隨時保護並分令經過各縣縣長協助辦理外相應函復即希查照

(戊)委託本路管理局兼管本局工段電務

本局第一分段敷設電綫工程業經辦理完竣關於以後修養事宜因該項工程設備簡單暫不另設專員特委託本路管理局電務課兼管經商定辦法如下

(一)潼華工程段關於電報桿綫及電報電話機件修養事宜責成隴海管理局車務處電務第三分段秉承電務課辦理之其關於電報電話建設事項由電務課秉承車務處承潼西工程局接洽辦理之

(二)潼西工程局僱用雷匠兩名分駐潼關華陰兩處歸電務第三分段管轄并由駐潼電務掌工指揮之

(三)電匠辛工按月由電務課造具支單送呈潼西工程局核簽

(四)凡關於修養工費由電務第三分段核轉潼西工務段報銷

(五)凡關於潼華工程段應用電料及電報電話機件等由電務課造具領單送呈潼西段工程局核簽

(巳)調查第一分段內餘地

第一分段內沿線餘地曾據工段報告迭有附近鄉民請求租種惟此項餘地必須調查究竟可以

出租若干及各地肥瘠如何並規定租價方能開始出租經飭該分段工程司林建倫切查具報原文如
後

(本局發第一分段工
程司林建倫函示)

關於第一分段內可出租之路有餘地畝數究約有若干應着各監工就地分
頭調查並由段彙齊造圖列表呈報同時再按各地土質肥瘠與出產價值擬定每年租額等則以憑
核辦

行政紀要

(甲) 記事

五月七日 頒發夏季警服

五月十七日 造具本局二十一年六月份預算書呈部

五月十八日 造具本局二十一年二月份決算書呈部

(乙) 人員任免調動

無

(丙) 擇錄重要公文

(一) 鐵道部指令據送員工待遇章則准存查考文

二十一年四月二十八日
業字第一五四一號

總字第二零六號呈督附件均悉應准存候查考嗣後修訂有關員工待遇各規章仍仰隨時呈部備查此令附件存

(二) 北甯路山海關工廠函請購用出品文 二十年四月二十九日

敬啓者欲期我國工業之發展須抱利權不外溢之決心始能達到目的敝廠雖屬鐵路官營原非專供本路建設之需實亦以兼營商業爲主旨溯本廠開辦以來計歷三十八載對於工作以數十年之經驗精益求精製造鋼鐵建築如橋梁房屋結構天橋磅橋轉盤無線電台鐵門鐵窗天氣大閘水櫃水鶴等

及號誌道岔生鐵管號燈火爐暖氣樁架樁鏈軌車行李車道釘螺絲等物凡鐵路工程所需用之各種配件種類繁多不勝枚舉均能承製且出品精良堅固耐久價值亦較舶來品格外低廉素承國有各路如呼海四洮齊克洮昂津浦平漢膠濟等路之購用咸稱美善敝廠荷蒙贊許未敢自足茲更闡智竭慮精益求精以副顧主之雅望近聞貴路工程需要上項出品如蒙惠顧無任歡迎自應悉心承辦冀挽利權相應函達查照并希見復至紉公誼

(三)本局函復北甯路山海關工廠遇有需要即儘先採購出產文

二十一年五月十三日
總字第二七〇號

逕復者接准 貴廠鐵字三零零·三二號函及出品一覽表一份備悉一是本路新工現尙未籌到大宗工款不能積極進行將來大舉興工時所需材料遇有 貴廠出產者自應儘量儘先採用以挽利權相應函復 查照

(四)鐵道部訓令轉奉院令全國人民應縮衣節食充實餉精文

二十一年五月六日
總字第六六一號

為令行事案奉 行政院第一二二二號訓令開為令行事案奉 國民政府洛字第三六號訓令內開為令飭事查自上年九月十八日事變之後日本侵略我國暴力憑陵有加無已政府為保持領土主權之完整自應作長期之準備當此危急存亡之間若非傾全國人力物力胥出於救國一途斷無以抒此大難凡我國民惟有日夜淬厲本同舟共濟之義縮衣節食力事生產充實餉精為抗日之後盾帛冠布履衛文所以中興嘗胆臥薪勾踐所以復霸近如德意志土耳其皆以失敗之餘堅苦奮發造成新邦憂

患圖存前事可法苟能奉行儉約一體勤勞則國難前途庶幾有多除分行外合亟令仰遵照並轉飭所屬分別宣傳曉諭切實遵行是爲至要等因奉此除分令外合行令仰該部即便遵照并轉飭所屬一體遵照辦理此令等因奉此除分令外合行令仰該局遵照并轉飭所屬一體宣傳曉諭切實奉行此令

(五)本局函示武警務長發給夏季警服文

二十一年五月七日
總字第二五八號

江電悉茲檢發該段差道長警單制服附鞋帽裏腿領章開列清單派本局職工劉殿元運送潼關仰點收具報附清單

計開

差道及巡長各一名計發單制服四套裏腿二付帽子二頂領章二付皮頭鞋二雙

巡警十名計發單制服廿套裏腿十付帽子十頂領章十付鞋子十雙

以上總計單制服二十四套裏腿十二付帽子十二頂領章十二付鞋子十二雙

(六)本局呈鐵道部請免重編補助預算文

二十一年五月七日
會字第二五九號

呈爲呈復事案奉 鈞部四月二十二日會字第五六四號訓令限期催造四種補助預算等因奉此查關於本局二十一年度預算之上項補助預算業於二十年工字第十一號呈文呈送 鈞部在案似可無須再行編造奉令前因理合備文呈復仰祈 鑒核指令祇遵

(七)平漢路管理委員會公函撥解第一期協款文

二十一年五月七日
第六零五五號

逕啓者案奉 鐵道部財字第四四六號訓令畧開查隴海鐵路前經 中央限期完成關係至爲重要 潼西一段現正積極進行茲者 國府議決以西安爲陪都該段尤有及早完成之必要仰即查照原案 每月協濟二萬五千元以六個月爲限俾重要工程因查本路前以路收日絀對於前項協款是以呈請 展緩現在既奉 部令飭即查案照解自應遵辦所有第一期本路應撥交 貴局協款洋二萬五千元 茲經開具漢口農工銀行匯票一紙相應隨函附送即希查收示復爲荷

(八)本局函平漢管理委員會收到第一期協款文

二十一年五月十三日
會字第二七四號

逕復者案准 貴會五月七日第六零五五號函撥本局第一期協款二萬五千元囑查收見復等由並 附漢口農工銀行第九十一號匯票一紙到局當經如數照收荷蒙 協助至切感縵除呈部備案外相 應函復即祈 查照爲荷

(九)本局呈報鐵道部收到平漢第一期協款文

二十一年五月十三日
會字第二七三號

呈爲呈報事查平漢路奉令協撥本局工款一案前經呈奉 鈞部本年二月二日財字第二九號及四 月六日財字第一零九號指令轉飭按照原案撥付各在案茲於本月十一日准該路函開本路前以路 收短絀對於前項協款是以呈請展緩現奉 部令飭即查案照解自應遵辦等由並附第一期協款二 萬五千元到局除照收并函復該路外理合備文呈報仰祈 鑒核備案

(十)鐵道部指令據報收到平漢第一期協款應准備案文

二十一年五月二十日
會字第二九五二號

會字第二七三號呈悉據報收到平漢路第一期協助該局工程款二萬五千元應准備案此令

(十一) 鐵道部訓令飭知路警管理局成立日期文 二十一年五月九日
總字第六八八號

爲令行事案據本部路警管理局局長朱暉日呈稱職等奉令組織路警管理局所有籌備情形業經呈報在案現已擇定本京獅子橋梅溪山莊內設局辦事並於五月一日組織成立理合呈報察核俯賜備案並請轉飭各路局知照等情除分行外合亟令仰知照再該路嗣後關於警務文件應仍照舊呈部出部轉行該局辦理併仰遵照此令

(十二) 鐵道部訓令飭知職工教育委員會正式辦公日期文 二十一年五月九日
總字第六九一號

爲令行事案據本部職工教育委員會委員長鄧飛黃呈稱本會奉令組織業已籌備就緒於五月二日在樓子巷本會開始正式辦公理合備文呈報鑒核備案等情除分行外合亟令仰該路知照此令

(十三) 鐵道部指令據送職員薪公畧歷表准予備案文 二十一年五月九日
總字第一七〇八號

總字第二四五號呈表均悉准予備案此令表存

(十四) 鐵道部指令據請轉咨財部填發洋灰護照候咨達併案辦理文 二十一年五月十一日
工字第一七六七號

總字第二三二九號呈單均悉前據該路管理局暨該局等請發購運洋灰免稅護照歷經咨達財政部辦理未予准辦業經將來往咨文抄示該管理局在案案懸日久迄未解決經由本部呈奉 行政院第八

三五號令行財政部酌核辦理具復再行飭遵等因奉此此次該局所請填發購運洋灰三千桶免照仰仍候咨達財政部併案辦理此令

(十五) 陝西建設廳函復收到購地圖並令市政工務處妥議地價文二十一年五月十三日
逕復者案准貴同總字第二二四號公函檢送西安購地圖囑備案等由准此除原圖收存并令西安市政工務處妥議地價外相應函復即希查照爲荷

(十六) 鐵道部訓令轉行購運軍用品請領護照辦法文

二十一年五月十七日
總字第七六一號

爲令行事查購運軍用品請領護照一案前准軍政部來咨應將貨物種類數量及價值詳細填入說明書現查各路辦理向未一律合將軍政部原咨抄發仰即遵照辦理爲要此令附抄軍政部咨爲咨行事案准 國民政府文官處第六零六九號函開案准財政部關字第一五七六一號函請嗣後核發購運軍用物品護照應將貨物種類數量及價值詳細填入說明書如貨物種類過多並應另附清單各檢四份及填發之護照號數函知以便轉關查驗希查照轉行軍政部飭屬遵照辦理見復等由准此除函復并分函海軍部知照外相應抄同原函函達查照轉飭遵照辦理等由計抄送財政部原函一件到部准此查國民政府軍用運輸護照規則第四條軍事機關及公共團體請領護照應備具運輸說明書以便查考又第七條凡運輸本規則第二條所列物料無本府護照或所運之種類數量與護照所列不符者應即由經過關卡路局扣留報請核辦又每照限用之數量或價格在前項規則之施行細則第六條并經詳載迭經咨請查照在案茲查財政部原函內開據總稅務司呈報各海關於驗放前項物品時如值

所運貨物種類繁多常以令文及護照內所列貨物種類數量等項未能詳細記載且價值一項多付關如核對查驗每多困難而所運之貨是否即係令准免稅之件亦不易斷定如令報運人將其發貨單等關係證據呈關查閱則報運人復多認爲無呈驗必要不願照辦且有不自知其所運物品詳情者等語似此情形海關於查驗上既多不便尤易發生影射夾帶之事自應設法補救以免流弊嗣後各軍事機關請領購運軍用物品護照時應將物品名稱數量及其實在價值逐項詳晰填入說明書內如貨物種類過多並應另附詳細清單數份呈由軍政部轉呈 國民政府核發護照後一面由貴處檢同上項說明書清單各四份及填發之護照號數函知本部核明轉發海關以憑查驗等由到部除函復並分行外相應咨請 貴部查照爲荷此咨 鐵道部二十年七月三十一日

(十七) 鐵道部路警管理局函知暫以私章替代印信文

二十一年五月十八日
警字第一零六號

逕啓者奉 鐵道部總字第一五四三號指令開呈悉據報該局籌備情形暨預定成立日期應准備案至請頒發印信官章一節仰候轉呈 行政院鑄發到部再行令發領用在未頒發以前准由該局長暫以私章代替鈐用統仰遵照辦理此令等因奉此查本局印信官章現尙未奉頒發自應遵照暫以私章代替鈐用除分函外相應函請 貴路局查照至切公誼

(十八) 實業部中央工業試驗所函知代製防毒面具已送交十九路軍駐京辦事處文

二十一年五月十八日
驗字第三九六號

逕啓者接准五月六日貴局總字二五七號函以貴局職員捐助十九路軍防毒面具一百具前經函達該軍查照仍請製用油漆口袋之士兵面具一百具請查照辦理等由查該項油漆口袋不及鐵盒之能耐久前經申述函達在案敝所刻已製就鐵盒裝藏之防毒面具一百具送交十九路軍駐京辦事處每具成本適折合大洋五元計一百具共該五百元較諸油漆口袋者共多費成本五十元除前收到貴局匯來之大洋四百五十元外尚差五十元貴局如能照數補匯自屬感激倘有未便可不勉強准函前因相應函復查照

(十九)

本局函復本路交大實習生甄考委員會彭樹德甄考手續由會辦理文二十一年五月十八日
工字第二八五號

逕啓者准

貴會第十五號函以借調管理局之交大實習生彭樹德之一切甄考手續仍應由會辦理

囑查照辦理等由自應照辦除轉飭該生遵照外相應函復仰請查照為荷

(二十) 本局函示林工程司建倫彭樹德甄考手續仍由交大實習生甄考委員會辦理文

二十一年五月十九日
工字第二八八號

准本路交大實習生甄考委員會第十五號函以借調管理局之交大實習生彭樹德甄考手續應由本會辦理請查照賜予辦理等由到局除函復照辦外各行抄錄原函附發仰轉飭該生遵照

(二十一) 本局呈報借調本路管理局交大實習生陳邦柱文

二十一年五月二十日
總字第二八九號

呈爲呈報事竊查本周第一分段橋梁涵洞等工程業已開標選定承包各商夫第興王原有監工人員

不敷分配經商准本路管理局調靈潼段工程處交大實習生陳邦柱前來實地練習並承辦監工事務
藉資助理理合具文呈報仰祈 鑒核准予備案

(二十一) 鐵道部訓令預防霍亂傷寒傳染文

二十一年五月二十二日
總字第八零七號

為令遵事查霍亂傷寒等病每於夏秋之際流行頗廣現上海已發現真性霍亂蔓延堪虞據各路統計
所示每年員工患此病者為數甚多若不預為防範非但對於各路員工之本身直接受害即對於路局
工作之效能亦無形減低各路局應轉飭主管處課購備預防霍亂傷寒疫苗廣為全路員工及家屬注
射藉重生命而杜傳染為此令仰該局即便遵照辦理並將經過情形及注射人數詳細呈報以憑攷核
此令

(二十三) 鐵道部總務司函請嗣後解繳部款在銀行匯單上註明事由文

二十一年五月二十五日

逕啟者近因路局解繳部墊各款往往先匯欵到部於銀行匯條上并未註明何種款項隨文匯寄者自
可稽核間有時隔多日未見來文叙明致成懸賬用特函請貴局嗣後解繳部款或零或整均請在銀行
匯單上簡單註明事由俾記賬者便於登記以資脚接即希查照辦理為荷

(二十四) 本局函示李隊長儼核銷王暖用費文

二十一年五月二十五日
會字第二九八號

測字第十五號函呈悉王工務員暖東在調用期內由局每月發給額定旅費六十元不再支其他車費
此次所報三次車費六元應予扣除至其他所報各項開支共計洋一百七十元九角三分尚屬覈實應

准核銷又該員額定旅費另由會計課造單發給無庸預支所附收條一紙即行發還

法 規

西京籌備委員會組織條例 二十二年五月三日公布

第一條 西京籌備委員會直隸於國民政府

第二條 本會設委員長一人委員十五人至二十五人由國民政府聘任之

第三條 本會會議由委員長召集之開會時以委員長爲主席

第四條 本會決議案之執行以委員長名義行之

第五條 本會會址設於西京並於國民政府所在地設置辦事處

第六條 本會設秘書處置秘書主任一人秘書二人技正一人技師二人至四人必要時得酌用僱員

第七條 本會於必要時得聘任專家爲專門委員或顧問

第八條 本會各種建設方案之實行得與關係機關合作辦理

第九條 本會於必要時得向各機關調用技術人員

第十條 本會各項辦事規則另定之

第十一條 本條例自公布日施行

鐵道部職工教育委員會組織大綱 民國二十一年五月四日公布

第一條 本部爲增進鐵路職工智識技能及工作效率起見設立職工教育委員會

第二條 本會設總務教育調查編輯四股

第三條 各股職掌如左

甲 總務股

一 關於文書事項

二 關於開會事項

三 關於會計事項

四 關於庶務事項

五 不屬於其他各股事項

乙 教育股

一 關於學校之設計籌備指導考核事項

二 關於師資事項

三 關於教授事項

四 關於訓育事項

五 關於圖書館影戲話劇講演等事項

六其他屬於教育股事項

丙 調查股

一關於調查事項

二關於統計事項

三其他屬於調查股事項

丁 編輯股

一關於教材事項

二關於出版及宣傳品事項

三其他屬於編輯股事項

第四條 本會設委員長一人委員六人秘書一人主任四人幹事十一人助理幹事十人錄事三人

第五條 委員長委員由部長派充主任由委員兼任秘書幹事及助理幹事由委員長遴選員呈請部

長委任錄事由委員長委充但秘書得由委員兼任之

第六條 委員長處理本會常務執行一切決議案

秘書承委員長之命核擬文稿分配文件掌理會議紀錄並辦理各種指定之事項

各股主任承委員長之命分掌各股事務

幹事與助理幹事承委員長之命受本股主任之指揮分理各股事務

錄事承上官之命辦理繕校事務

第七條 本會遇有特種事務得隨時指定人員或組織特種委員會辦理之

第八條 本會常會每星期一次討論進行方針決定一切會務開會時以委員長爲主席遇必要時得由委員長召集臨時會

第九條 本會經常費及辦理職工教育各項特別費用由本會編定預算呈請部長核撥

第十條 本會除重要事件及重要決議案應呈請部長核定以部令執行外其尋常事件均由委員長以本會名義行之

第十一條 本會辦事細則及各項規章另訂之

第十二條 本大綱自公佈日施行如有未盡事宜得由委員長提出修正呈請部長核定之

修正鐵道部直轄路警管理局組織大綱 民國二十一年五月十三日公布

第一條 鐵道部直轄路警管理局直屬於鐵道部受鐵道部之指揮監督掌理全國國有鐵路警察行政事宜

第二條 國有各鐵路警務機關直接受路警管理局之節制調遣訓練監督並受各該路主管長官之指揮監督

第三條 路警管理局設左列各處

- 一·總務處
- 二·訓練處
- 三·督察處

前項各處因事務上之必要得分科辦事其職掌規則另定之

第四條 路警管理局設局長一人承部長之命管理國有各路警察行政事宜並指揮監督各路警

察及護路隊設副局長二人輔佐局長勸導鐵路警察行政事務均由鐵道部部长派充之

第五條 路警管理局設秘書主任一人秘書二人承局長副局長之命處理秘書事務設處長三人

承局長副局長之命主持各該處事務科長六人承上官之命分掌各科事務均由鐵道部

長派充之設科員二十四人督察員二十六人事務員十二人至十八人承上官之命分任

各處科事務由局長遴員呈請鐵道部部长核准派之


設雇員八人至十二人承上官之命分任繕寫及其他事務由局長僱用呈報鐵道部備案

第六條 本大綱如有未盡事宜得隨時增改之

第七條 本大綱自公布日施行

關海鐵路濱西工程月刊

法
規



專 載

工務第一分段工作旬報 五月分

第一號 上旬

員工勤務狀況

曾帶工程師昭桓於上月二十六日因目疾請假赴平診治現在尚在假期中

交大學生石壽頤於本月八日前赴測量隊實習

測地夫郭祥雲自四月六日起繼續帶領臨時小工隨同王工務員駛東探鑽河底地質因王工務員尚未覓安工頭至今仍未放回工段服務

本旬工事紀錄

本旬路基修做上坡及整理道台工作業已次第告竣東泉店車站做錯之土方亦已動工整理不日可以完竣

橋工第一標包工源記公司業於本月五日開始工作並領去洋灰一千桶

橋工第二標包工吳靜生於本月六日開始工作領去洋灰八百桶但公里三六七、八九七之沙子河橋墩下基脚頗軟須打木椿已飭其從速購辦備用因此沙子河上工作須俟木椿購到方能繼續進行現已在公里三六七、七零零及公里三六八、七五零兩處橋先行動工

橋下第三標包工童子紀本擬於本月七日先在公里三七五·四五六白沙河開始工作但因本月四日南山大雨河水驟漲不能開工只得先挖引河將河水引在河內方能開始工作亦領去洋灰五百桶

第一分段電話線已於上月三十日裝設至華巖廟公事房並在公事房內安設話匣一具所有裝置一切材料均由謝玉堂掌工領去計電桿二六七根電線八號鉛絲三八捆一六號鉛絲一捆焊錫二零條磁碗二四零個鐵鈎二四零個又洋二百五十元尙未收到該掌工用料報銷清單

氣候報告

本旬四日全日下雨停工二二五六等日早晴晚雨七十兩日天陰

第二號 中旬

員工勤務狀況

曾帶工程司昭桓於本月十七日假滿銷假測地夫郭祥雲於本月十七日由探河底工次回段

本旬工事紀錄

第一標包工業於本月十五日在釣橋河開始打地腳洋灰但其他各橋洞之基腳尙未開始工作已正式函促其注意特約第二條矣

第二標包工吳靜生所包各橋洞如公里三六四·一四五公里三六七·二七二公里三六七·七

零零公里三六八·七五零公里三六九·三零零五處均已將洋灰地脚打竣現正繼續建築橋身之洋灰混凝土又公里三六七·八九七所建木椿業於本月十八日運至潼關

第三標包工除轉運各種材料外並在白沙河公里三七五·四五六挖掘橋基但因水源甚大工作稍緩用兩架抽水機差可抽盡忽於本旬十八日掘至深二公尺五寸處遇強有力之伏泉水機頓失効力現擬加增抽水機數目並將基脚加打木椿而將深度減少

包工協成公司土方修補將次告竣日內即可接收清方

氣候報告

本旬除十五日上午雨十六日大風十七日上午雨外餘均晴朗

第三號 下旬

員工勤務狀況

交大練習生石壽頤仍在測量隊服務

本旬工事紀錄

●土方包工協成公司所做之路堤修坡等工作已大畧告竣

第一標橋工包工陳源遠已將鈞橋四孔五公尺之橋造成一半此外公里三六三·六六一及公里三六三·九零零兩橋之基脚混凝土業已造就又公里三六二·八九四之基脚底面見水約有兩

公寸深擬打E號混凝土三公寸以底面土質平常也

第二標橋工包工吳靜生已將公里三六四·一四五至公里三六八·七五零及公里三六九·三零零三橋完全造好又公里三六四·六三零至公里三六五·九八九公里三六六·四九八公里三六六·二七二公里三六七·七零零及公里三六九·八九三各橋橋基混凝土打就又公里三六七·八九七東橋基木樁已打下二十根每根木樁打下之深度自四公尺許以至五公尺許均由監工紀錄

第三標橋工包工董子紀將公里三七五·二六零及公里三七九·七八零兩橋之橋基混凝土打就公里三七五·二六零之橋基底面雖見水而基腳土質甚佳水亦甚易抽乾是以未用E種混凝土公里三七九·七八零之護牆有水土性頗佳亦未用E種混凝土公里三七五·四五六處二孔十公尺上承鋼橋之東西兩橋墩基腳土質不甚佳而伏泉均甚旺宜打用木樁減淺基腳已詳前電現因等候木樁及壓水機打樁架等用具暫停工作公里三七九·八六九二十公尺下承鋼橋之西台基脚探至基脚底面處尙有沙橋伏泉亦旺亦宜打用木樁

氣候報告

本月自二十一日至二十四日大風二十六日二十七日兩日陰雨餘晴朗

工務第一分段工程司林建倫

潼西定線測量隊工作旬報

第七旬 五月一日至十日

本旬至五月十日全隊測到閔家村即公里四三七處最前定線隊則已達戲河附近即公里四三七處本旬因四五七等日陰雨渭南以西木樵又爲鄉民拔去工作畧爲停頓已於五月二日電陳本旬曾將渭南以東圖卷結束完竣另行整理呈寄

本旬地方不靖及派兵保護情形已於第十二號函呈報告

零口新豐方面地方狹小全隊遷往該處無法盡住茲擬分班遷往往盡數日如天氣晴好下旬全隊可遷至臨潼

局派交大學生石壽頤於五月來隊工作王工務員賤東亦於是日遷來渭南查渭南以西缺乏礮砂因囑王工務員加意調查另行呈報

第八旬 五月十一日至二十日

本旬測隊全體勘測工作完成至戲河左近公里四四七處最前定線隊近在臨潼附近勘測擬將車站地點移近華清池

本旬隊員陸續由渭南遷零口新豐至五月十八日全隊遷到臨潼但爲測量工作便利起見尙有一部分測夫住居零口新豐

第九旬 五月二十一日至三十一日

本旬全隊測達臨河左近即公里四六一處

最前定線隊測到窰村附近即公里四七零處

五月二十七日因雨野外工作停止一日

代理正工程司定線測量隊長李儼

潼西定線測量隊工作報告第四份

(一)圖卷說明

茲寄呈赤水至渭南第四份圖卷除全線平面地形圖一幅縱截面圖一幅橫截面圖三零八幅外并附下列各河

赤水河地形圖一幅酒河地形圖橫截面圖各一幅又附倉谷嘴汽車道改綫圖一幅橫截面圖四十七幅其應說明者有下列各事

(甲)倉谷嘴附近汽車路新綫中心移於路綫南二十五公尺與鐵道路綫平行似較便利汽車路又一綫坡度較峻如紅點綫所示可省土方惟於溝底各置一洋灰水管以便洩水而填土所需之土或當另行取土

(乙)酒河堤岸最近由陝西建設廳築有新堤可防水患今將該堤橫截面圖測就繪於該河平面地形圖下方以備參考

(丙)路綫在公里四二五·三三五處通過一水渠此水渠上游在汽車路處建有四公尺拱式石橋一座號梁水橋如附圖(二)在大路處有0.60x0.80方涵洞一座如附圖(三)現在路綫通過此處且添設一公尺明涵洞一座

(丁)原設公里四二八·三六五處之三公尺道路涵洞移於公里四二八·一六五因該處較為重要

(戊)因土方關係下開二個明涵洞并改爲穹涵洞如

原定

改爲

三公尺明涵洞

公里四二四·零零零

三公尺穹式涵洞

三孔一公尺明涵洞

公里四二四·二零零

五公尺拱橋

一公尺明涵洞

公里四二六·零零零

一公尺穹式涵洞

(二)橋梁涵洞分配情形

華陰至渭南橋梁涵洞分配情形并照原定計畫除於

公里三八一·一三零五零處

增一三公尺道路涵洞

及上文呈請於

公里四二五·三三五處

增一二公尺明涵洞

並將三處明涵洞改爲穹式涵洞及拱橋外未加增減其沿途汽車路所設涵洞拱橋除第一二份呈報外茲繼續繪圖附呈如附圖(一)(二)(四)

下營渭南間橋梁涵洞計有

下承鋼橋梁 十五公尺十四孔 共二二零公尺

拱橋 十二公尺六孔 六公尺一孔 五公尺十九孔 共一七三公尺

穹式涵洞 三公尺十三孔 二公尺十三孔 一公尺八孔 共八三公尺

明涵洞 三公尺二孔 二公尺十一孔 一公尺四孔 共三三公尺

道路涵洞 三公尺二十三孔 共六九公尺

水管 八公尺一個 六公尺一個 共一·四零公尺 總共五六八·四零公尺

全線由公里二八一至公里四二零·五零零共長四九六公里五零零公尺即橋梁涵洞橋樑約為全線

之¹/₈₇

(三)商業調查

潼關西安間運輸困難運費高昂例如由潼關至西安汽油布匹由人力車運送需五日每輛載重百二十斤費十五元即每噸需六十元運費煤斤及棉花輸運更感困難例如同官縣產地煤價每百斤價值一元至西安則為每百斤三元運費高於原物價二倍他物稱是一方則陝西全省每年產棉四十萬擔產羊毛二十萬斤無法輸出如有鐵道與以輸運前途自不可限量就中華州渭南較為重要茲將該兩縣人口物產物價情形據調查所得臚列如下

(一) 華縣

人口 一四六一九七人

物產 棉七八五六七九八斤 每百斤卅三元

麥一四五五九一四四斤 每斗二元一角

米九四八三五零斤 每斗二元六角

竹七九五一九八斤 每百斤五元

日用品價格

麵 每元十斤

煤 每百斤一元七角五分

柴 每百斤五角

麻油每百斤二十五元

洋油每桶六元

(二) 渭南

人口 二二二二六八一人

物產 棉四八一七一零斤 每百斤卅三元

麥一三八四四二零斤 每斗二元一角

豆類二一四零七八四零斤 每百斤五元五角

日用品價格

麵 每元十斤

煤 每百斤二元

柴 每百斤七角

麻油每百斤四十二元

洋油每桶六元二角

代理正工程司測量隊長李儼

購地辦公處工作旬報

第一號 四月下旬

四月廿一日 預備一切

隴海鐵路漢西工程月刊

專 載

四月廿二日 田潼關遷至五里村居住

四月廿三日 打邊樞自公里三八一·零零零至三八二·五零零共一五零零公尺下午因雨在寓

計算圖面積及繪圖廓

四月廿四日 丈地自公里三八一·零零零至三八一·七零零共七零零公尺計七十六戶

四月廿五日 丈地自公里三八一·七零零至三八二·五零零共八零零公尺計八十一戶

四月廿六日 打邊樞自公里三八三·五零零至三八五·五零零共二零零公尺（公里三八二

·五零零至三八三·五零零止一千公尺內中樞大多失去擬候經緯儀頒下後補打

再丈地故先自三八三·五零零向西工作）

四月廿七日 丈地自公里三八三·五零零至三八四·一零零共六零零公尺計一百十二戶（本

日丈下營車站故祇丈六零零公尺）

四月廿八日 打邊樞自公里三八五·五零零至三八七·四零零共一九零零公尺丈地自公里三

八四·一零零至三八五·二零零共一一零零公尺計一百二十戶

四月廿九日 丈地自公里三八五·二零零至三八五·八零零共六零零公尺計一百十四戶

四月三十日 打邊樞自公里三八七·四零零至三八九·四零零共二零零公尺丈地自公里三

八五·八零零至三八六·四零零共六零零公尺計一百零六戶

附註 本旬共打邊樞七千四百公尺丈地共四千四百公尺計六百十九戶

第一號 五月上旬

五月一日 丈地自公里三八六·四零零至三八七·一零零共七零零公尺計九十二戶

五月二日 丈地自公里三八七·一零零至三八七·六零零共五零零公尺計八十五戶打邊樞自

公里三八二·五零零至三八三·五零零共一零零公尺

五月三日 上午在寓裝圖下午二時出發丈地自公里三八二·五零零至三八三·零零零共五零

零公尺計四十四戶

五月四日 在寓裝圖

五月五日 丈地自公里三八三·零零零至三八三·五零零共五零零公尺計三十九戶至十一時

下雨回寓

五月六日 上午在寓裝圖下午丈地自公里三八七·六零零至三八八·一零零共九零零公尺計

五十一戶

五月七日 在寓裝圖

五月八日 丈地自公里三八八·一零零至三八八·九零零共八零零公尺計九十二戶

五月九日 打邊樞自公里三八九·二零零至三八九·九零零共二七零零公尺丈地自公里三八

八·九零零至三八九·九零零共一零零零公尺計一百零一戶

五月十日 丈地自公生二八九·九零零至三九一·零零零共一一零零公尺計一百零九戶（本

日由華陰五里村遷至華縣西柳枝鎮居住）

附註 本旬共打邊樾二千七百公尺丈地共五千六百公尺計六百十四戶

第三號五月中旬

打邊樾自公里三九一·九零零至四零三·三零零共一一四零零公尺丈地自公里二

九一·零零零至四零零·七零零共九七零零公尺計一千零六十九戶

五月十七日 購地辦公處由西柳枝鎮遷華縣西關居住

第四號五月下旬

打邊樾自公里四零三·三零零至四一一·零零零共八千七百公尺丈地自公里四零

零·七零零至四零八·九零零共八千二百公尺計七百七十七戶

五月廿二日 第二段丈量完畢至二十七日將第二段之草圖完全繪畢


五月廿八日 由潼關警務段轉來華縣至赤水藍晒圖二份自公里四零五·五零零至四一八·零

零零


五月廿九日 開始第三段丈量事宜

購地委員李 博


西安橋圖 (公里 423 + 038)

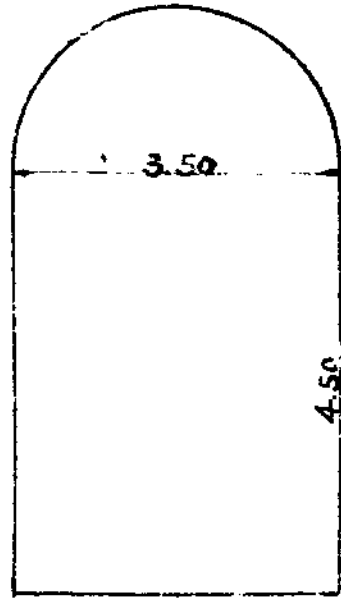


梁水橋 汽車路单孔拱式石橋圖
(公里 425 + 335)



大路石涵洞圖 (公里 425 + 335)



淮河汽車路石橋圖
(公里 427 + 975)

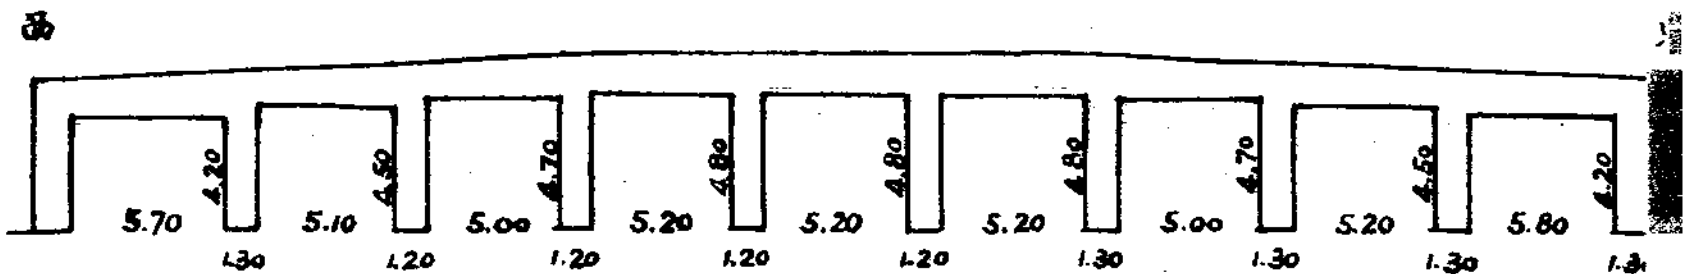

◎外界投稿須知◎

- 一·投稿須與本刊宗旨內容相符
- 二·投稿者須書明姓名職業及詳細住址
- 三·投稿文言語體兼收應繕寫清晰如係譯文應將原文附寄否則請將書名及出版坊號示知
- 四·投稿者請寄鄭州隴海鐵路漳西段工程局總務課
- 五·投稿經選登者得由本刊增刪之
- 六·投稿一經選登酌給報酬
- 七·投稿無論登載與否原稿概不寄還

第二卷第五期定報價				出版	
<p>編輯兼隴海鐵路漳西段工程局總務課 發行者 西段工程局 承印處 鄭州 宜文齋南紙莊</p>				<p>五月三十一日</p>	
<p>每冊零售洋二角 半年六冊洋一元一角 全年十二冊洋二元整</p>				<p>郵費本埠每冊二分</p>	
<p>目錄前頁底面前頁及底面外頁</p>				<p>地位</p>	
廣告		價		頁	
全頁		一〇元		一個月	
半頁		五元		三個月	
全頁		二六元		六個月	
半頁		一三元		全年	
全頁		四〇元		全年份	
半頁		二〇元		全年份	
全頁		七二元		全年份	
半頁		三六元		全年份	
全頁		一八元		全年份	

隴海鐵路簡明開車時刻表

民國二十一年二月十一日重訂

	潼關	靈寶	陝州	洛陽西	洛陽東	鄭州北	鄭州南	開封	商邱	銅山	徐州	海州	新浦	大浦	
上行車				十六分·到五	五二三二 三三三三 開·開·	不 停	十一 九	十五 二 六	二十 九 開·	九八〇八 分·分· 開·開·	特一 快次				
					二一十 〇三五 到·開·	一九七 分·分· 開·開·	八〇七 分·分· 開·開·	〇七 分·分· 開·開·	快三 車次						
										三二二 五七七 到·開·	二九〇八〇七 分·分·分· 開·開·開·				
										四四四 八八八 到·開·	四二二 四三三 開·開·	四四 三三 分·分· 開·開·	二五 分· 開·	八〇十〇 分·分· 開·開·	十三 次
			二十五 到·	一八八 分·分· 開·開·	八 分· 開·	十七 次									
	五十三 到·	五十七 分· 開·	七八 分· 開·	〇七 分· 開·	十九 次										
下行車	大浦			徐州	銅山	商邱	開封	鄭州南	鄭州北	洛陽東	洛陽西	陝州	靈寶	潼關	
				〇二〇二 五十分· 到·開·	二〇二 十分· 開·	十七 六 開·	十二 五 開·	不 停	〇 分· 開·	五六 分·分· 開·開·	九六 分·分· 開·開·	五〇 分· 開·	特二 快次		
							二二二 〇〇四 到·開·	二〇 八五 開·	十八 八	三十四 六四 開·	二十 〇四 開·	特四 快次			
	一十五 五八二 到·開·			五八〇八 分·分· 開·開·	八 分· 開·	十二 次									
			七四二 分·分· 到·開·	四二四 分·分· 到·開·	五二 一三 開·	二十四 六八 開·	十二 三五 開·	二十 四五 開·	五〇九 分·分· 開·開·	十 分· 開·	十四 次				
									四十三 五五七 到·開·	十五 七五 開·	〇九 分· 開·	十八 次			
												二二 六一 到·	十二 六〇 開·	二十 〇八 到·	十 〇五 開·

十一次

二十次
