

都市計畫島根地方委員會

第八回都市計畫島根地方委員會議事錄

始



253
928

第八回都市計畫島根地方委員會議事錄


昭和十四年三月二十二日

島根縣廳内自治會館ニ於テ午前十一時參集

事　　日　　程

委員、幹事異動報告一件

昭和十四年三月六日内務省島畫第一號内務大臣附議松江都市計畫事業年度割變更
スル件

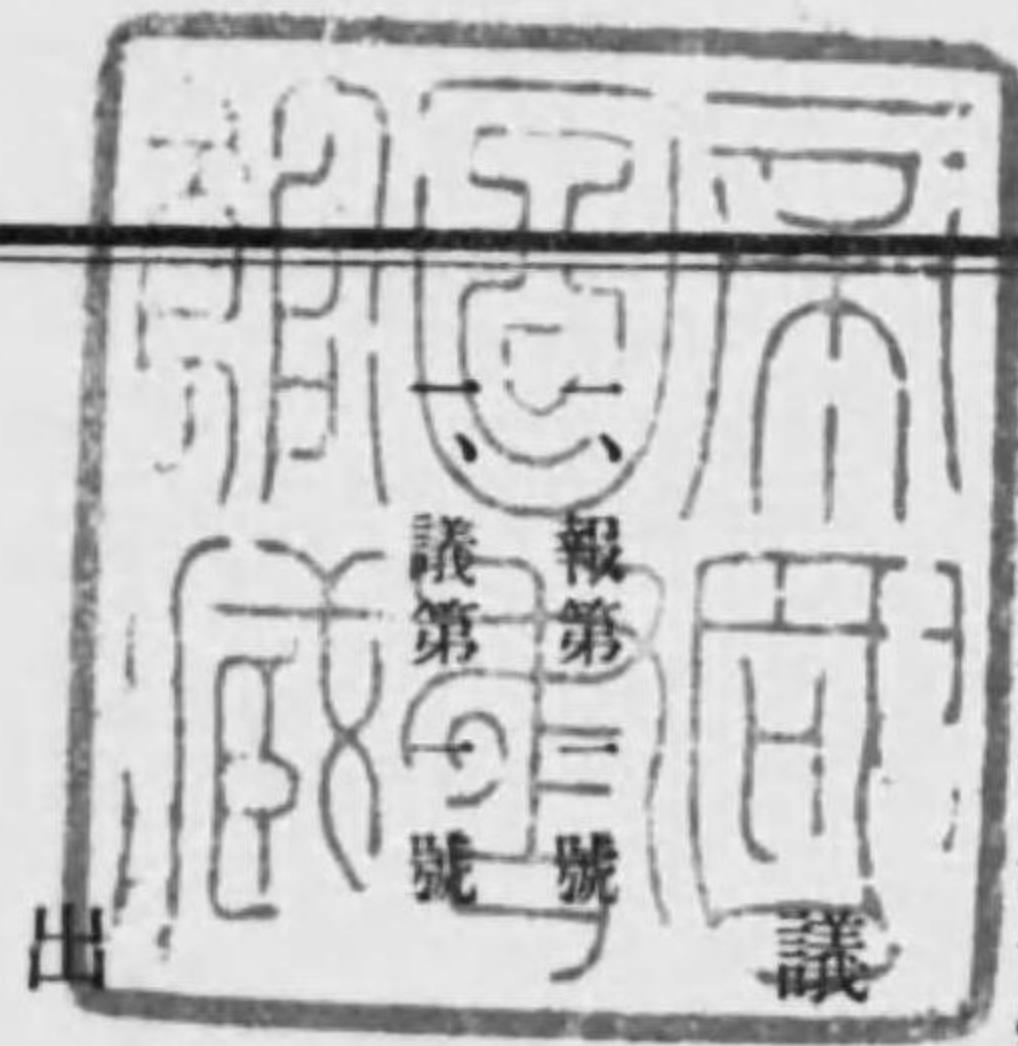

出

議

報第三號
議第十一號

委員會長　島根縣知事代理　島根縣書記官　並川義隆君
委員　内務技師　高西敬義君
委員　一番高西敬義君



二

番	廣島稅務監督局
番	松江市會議員
番	島根縣會議員
番	(松江商工會議所會頭)
番	松江市會議員
番	島根縣書記官
番	同
番	松江市長
番	鐵道局長福井國男
番	君代理鐵道局技師
番	島根縣會議員
番	松江市會議員
番	西谷龜之助君
番	和田珍輔君
番	藤永滿君
番	中村滿君
番	並石俊一君
番	河川義隆君
番	福井毅君
番	櫻井俊君
番	財中源君
番	秋鹿一君
番	武部弘成君
番	間淳一君
番	島松次郎君
番	三郎君
番	源一君

外番

幹事	松江市長
幹事	鐵道局長福井國男
幹事	君代理鐵道局技師
幹事	島根縣會議員
幹事	松江市會議員
幹事	西谷龜之助君
幹事	和田珍輔君
幹事	藤永滿君
幹事	中村滿君
幹事	並石俊一君
幹事	河川義隆君
幹事	福井毅君
幹事	櫻井俊君
幹事	財中源君
幹事	秋鹿一君
幹事	武部弘成君
幹事	間淳一君
幹事	島松次郎君
幹事	三郎君
幹事	源一君

番

缺席者氏名

同幹事委員	松江市土木課長代理
同幹事	島根縣書記官
同幹事	島根縣警部
技術書記	藤野英
技術書記	寺本忠
技術書記	吉田忠
技術書記	久保田實君
技術書記	吉田樹君
技術書記	藤野陽君
技術書記	吉田樹君

午前十一時二十分開議

- 會長（並川義隆君）夫レデハ是ヨリ第八回都市計畫島根地方委員會ヲ開會致シマス
- 本日ハ年度末御多忙中ニモ拘ラズ、特ニ本會ノ爲ニ御縁合セ出席下サイマシテ有難ク存ジマス
- 今回ハ屢ニ内務大臣ヨリ本會ニ附議セラレマシタ松江都市計畫事業執行年度割變更之件ヲ御審議煩ハヌ
- ニ御參集ヲオ願ヒ致シタ次第アリマス
- 詳細ノ點ハ幹事ヨリ説明致サセマス、ドウカ慎重御審議ノ上適當ナル御決議アラムコトヲ御願致シマス
- 次ニ御報告スル事項ガアリマスカラ書記ヲシテ朗讀致サセマス
- （書記朗讀）

委員、幹事異動報告ノ件

昭和十三年三月二十二日第七回會議以降左ノ通異動アリタリ

昭和十四年三月二十二日

都市計畫島根地方委員會長 島根縣知事 三樹三

報 第一號

委員、幹事異動報告ノ件

昭和十三年三月二十二日第七回會議以降左ノ通異動アリタリ

昭和十四年三月二十二日

都市計畫島根地方委員會長 島根縣知事 三樹樹三

記

就任年月日

退任年月日

區別

官公職名

氏名

昭和十三年三月二十八日

委員會長
常務委員

高津町長

中島匡彌

昭和十三年四月十二日

同

大社町長

木村金三郎

昭和十三年五月九日

委員

島根縣會議員

和田珍賴

昭和十三年五月九日	昭和十三年六月十日	昭和十三年七月二十八日	昭和十三年八月二十日	昭和十三年十月六日
同	同	同	同	同
大社町會議員	木村金三郎	森田準一郎	堀越清六	福井國男
幹事	島根縣警部	鐵道局長	寺本忠雄	財間淳

幹事

松江市助役
福田源次郎

○會長（並川義隆君）夫レデハ松江都市計畫事業年度割變更ノ件ヲ議題ニ供シマス

先づ議案ヲ朗讀セシメテ議案ノ内容ヲ説明致フ

議第一號

昭和十四年三月六日内務省島畫第一號内務大臣附議松江都市計畫事業年度割變更二
關スル件

昭和十四年三月二十二日

都市計畫島根地方委員會長

都市計畫島根地方委員會

松江都市計畫街路事業及其ノ執行年度割中左ノ通變更セムトス
右都市計畫法第三條ノ規定ニ依リ其ノ會ノ審議ニ付ス

昭和十四年三月六日

内務大臣 侯爵 木戸孝一

第一 本事業ノ執行年度割左ノ通定ム

自昭和十二年	約一割九分三厘
昭和十四年	約七割二分一厘
昭和十五年	約八分六厘

理由書

○幹事（中村満輔君）只今御上程ニナリマシタ第一號議案ヲ御説明申上ゲマス、本議案ハ昭和十二年度ヨリ着手中ノ松江市長執行ノ都市計畫街路事業二等三類六號ニ屬シマス天神町ヨリ白潟埋立地ニ至ル幅員一一米、延長二九七米ノ路線ノ年度割變更デアリマシテ、當初ハ昭和十二年度ニ於キマシテ、全工事ヲ完成セシムル

ノ計畫ニナツテ居リマシタノデアリマスガ、偶々今次事變ノ勃發ノ爲本事業急施設ノ一ツノ目的デアリマシタ神國博覽會ガ延期トナリマシタノデ、之ヲ十三年度迄一箇年延長スルコトニ昨年度變更決議致シマシタガ、其後ニ於キマシテ時局ニ鑑ミ博覽會ノ開催モ全然中止ノ止ムナキニ至リマシタ關係上、用地買收並建物移轉ノ交渉上ニ著シキ反響ヲ見マシテ豫期ノ様ナ進捗ヲ見ズ今日ニ立チ到ツタノデアリマス

只今ノトコロデハ既ニ關係土地所有者總數二十名ノ内十二名ノ買收ヲ了シ、又移轉ヲ要スル建物並物件ノ關係者ノ總數三十名ノ内二十一名ハ既ニ協定済デアリマシテ殘ルトコロハ用地ノ關係デ八名、建物ノ關係デ九名ノ未交渉者ガ殘存スルダケデアリマス

又他面本市ノ交通改善、宍道湖ノ利用開發等產業促進ノ意義カラ致シマシテモ、現狀ノ儘放置スペキモノデハナイト存ジマスノデ、其殘存部分ニ對シテハ更ニニヶ年ヲ延長致シマシテ之ヲ昭和十四、十五ノ兩年度ヲ以テ完了致シタイト思フノデアリマス

本事業費總額七萬二千四百圓ノ内譯ヲ施行年度別ニ申上ゲマスト、昭和十二年度ハ約六千百九十五圓、昭和十三年度七千七百七十一圓デアリマシテ殘部ハ同十四年度約五萬二千二百二十八圓餘、%ニ致シマスト七二・一%ニナリマス、同十五年度約六千二百四圓、%ニ致シマスト八・六%ノ見込ヲ以テ施行シタイト存ズルノデアリマス

コレデ大體ノ御説明ヲ申上ゲタノデアリマスガ、猶詳細ニ亘リマシテノ御質問ニ對シマシテハ他ノ幹事ヨリ

御説明申上ゲテ御諒承ヲ願ヒタイト存ジマス

一一

○會長（並川義隆君）御質問ガゴザイマシタナラバ……

○十三番（西谷龜之助君）只今承リマシタノデゴザイマスガ、殘餘地ノ交渉ハ今日ドレ位進行シテ居リマスカ、灘町ノ方ガ未ダ圓満ニ解決シテ居ラスヤウニ承ツテ居リマスガ、ドノ位ゴザイマセウカ

○幹事（久保田實君）大體只今ノ御質問ノアリマシタ灘町方面ノコトヲ先ニ申上ゲマスガ、此ノ圖面ニアリマス通り市道灘町線ト宍道湖ノ間ノ計畫路線中残リマシタ分ハ一番橋ニ近イ所ニ石倉喜次郎ト云フ方ガアリマスガ、其ノ方ノ製材工場ト此ノ路線ノ中央ニ材料置場ト事務所ガアリマス、此ノ工場ノ移轉ヲシナケレバナリマセンガ、其ノ分ガ色々折衝シテ居リマスガ、價格ノ點ニ於キマシテ大變ノ差ガアリマスノデ、此ノ點ハ目下ノ處停頓シテ居ルヤウナ狀態デゴザイマス

今一ツハ天神町ニ近イ角ノ所ノ後藤勝造氏所有ノモノデアリマスガ、之レガ残ツテ居リマス、之レハ色々ト此ノ人ノ裏面關係ガゴザイマスノデ、夫レガ未ダ解決ガ出來ナイト云フヤウナ狀態デアリマスガ、之レガ買收價格ノ間ニ大分ノ差ガアリマスノデ、此ノ二軒ダケデゴザイマス

後ハ終リマシタノデ、之レモ折角交渉中デゴザイマスノデ、何トカ解決シ得ルモノト存ジマス

○三番（秋鹿隆一君）松江市ノ都市計畫ノ此ノ路線ガ金額ニ致シマシテハ大變ナモノデハナイノデアリマスケレドモ、斯様ニ變更シナケレバ、事業ノ遂行ノ仕難イ狀態ニアリマスノハ、時節柄色々ノ支障ガアルト想像

致シマスガ、併シ乍ラ斯様ナ事業ヲ進行シナイ様ナコトガアツテハ、將來松江市ノ都市計畫事業ニ大キナ不安ヲ來スノデハナイカト思ヒマス

ドウカ關係方面ニ於カレマシテハ努力ヲ願ヒマス、斯様ニ年度ヲ繰延ベマシテ事業ヲ進捗スルト致シマスレバ、將來色々ノ物價トカ工賃等ノ昂騰ヲ來シハセムカト思ヒマス

左様ナ場合ニ金額ヲ多ク要スルコト、思ヒマスガ、其ノ點ノ御見通シハ如何ナモノデゴザイマセウカ、承ツテ見タイト思ヒマス

○幹事（久保田實君）只今オ話ノアリマシタ様ニ御尤ノコトデゴザイマス、事業執行致シマス者ト致シマシテハ出來ルダケノ方法ヲ探ツテ居リマスガ、大體ニ價格ノ點ニ於テ當初ノ見込ト非常ニ差額ガゴザイマス、要求サレテ居ルモノトノ間ニ非常ニ開キガアリマスガ、此ノ點ニ付テハモウ一步最後ノ協定ヲ致シタイト云フ覺悟ヲ持ツテ居マス、尙物價ノ關係モ考慮シテ居リマスガ、之レニ付キマシテハ多少ノ豫備費ヲ持ツテ居リマスカラ其ノ範圍内ニ於キマシテ出來ルダケ解決シテ見タイト思ツテ居リマス

○五番（田中源一君）一寸承リマスガ、天神町ノ分ハドンナ經過ニナツテ居リマスカ、アソコハ未ダ買收ニナツテ居ランデハナイカト思ヒマスガ……

○幹事（久保田實君）（圓面ヲ見詰メ乍ラ）恰度此ノ圓面ニアリマス様ニ色ヲ附ケマシタ方ハ御承諾済デアリマスガ、他ノ方ニ付キマシテハ折角最近ニ於テモ交渉シテ居ル譯デゴザイマス、之レニ付キマシテモ全體ノ方

一三

ガドウト云フコトモ無イカト恩ヒマスガ、主トシテ大部分ノ方ノ御意見が色々折衝シテ見マシタ結果ガ價格ノ點デ之レモ大分差ガゴザイマス、此ノ價格ノ點ニ付テ最近モ打明ケ話ヲ致シマシタガ、要スルニ此ノ價格デハドウ考ヘテモ承諾ノ仕難イ様ナ狀態デアリマス、残リマシタノガ五軒ゴザイマス

○五番（田中源一君）夫レデ計畫年次ノ間ニ完了ノ見込ガゴザイマスカ、此ノ計畫デ十五年度迄延シテ夫レカラ先又出來ナケネバ又延ス心算デアリマスカ或ハ又事業ヲ打チ切ル様ナ見込デゴザイマスカ

○九番（石倉俊寛君）相當重大問題デアリマスノデ、委員デハアリマスガ、便宜私カラオ答ヘ申シタイト思ヒマス、尙先程三番君其他ノ御質問ガゴザイマシテ、夫レトキオ答ヘガアリマシタノデ或ハ重複スル意味ガアルカモ知レマセング一應オ答ヘテ致シマス

先ヅ以テ五番ノ質問ニ對シマシテオ答ヘ致シマス、此ノ年度割ニ依ツテ實行スル確信ガアルカト云フオ尋ネデゴザイマスガ、吾々地元ト致シマシテハ極力此ノ程度ニ於テ實行致シタイト云フ所信ヲ以テ邁進致シタイト存ジテ居リマス、何分ニモ時局デゴザイマス、經濟更正ニ移ツテ居ル今日デアリマスシ、時局モ何時終熄スルトモ豫測出來ナイノデアリマシテ、其ノ意氣ヲ以テ進行スルト云フ考ヘデアリマス

此ノ事業ガ斯様ニ遲々トシテ進マナインハ遺憾デアルン將來松江市ノ都市計畫遂行上斯ウ云フコトガアツラハ遺憾デアル、斯様ナ不安ヲ生ズルヤウナコトガアツテハ、將來ドウカト云フ御質問ガゴザイマシタガ、洵ニ御尤ノ御質問デゴザイマスノデ私共當事者トシテ洵ニ遺憾ニ存ジテ居ルノデアリマスガ、十二年度ノ事業

計畫ト致シマシテハ以來數クトモ當市ノ五十年記念ノ神國博覽會デモアルカラ時局デアツテモ十三年ニハ博覽會ヲ遂行シヤウト云フノデ極メテ努力シテ參リマシタ、時局ハ愈々重大ニナリマシタノデ經濟方面ニモ影響ヲ來シ統制ニヨリ鐵鋼等ノ購入モ困難トナリ全ク事業ハ進マナクナツタノデアリマシテ、先づ此ノ時局ノ爲ニ斯ウ云フコトニナツタト信ズルノデアリマシテ將來斯ルコトノナイ様ニ努力スル覺悟ヲ持ツナ居リマス此ノ點ニ付キマシテ將來ノ不安ト云フコトニ付キマシテハ、吾々當局トシテ事業ノ計畫モシ、事業ノ遂行モ致シタイト云フ覺悟ヲ持ツテ居リマスカラ、ドウカ其ノ點御諒承ヲ願ヒマス

洵ニ地元ノ市ノ爲ニ斯ウ云フコトデハ遺憾ニ存ジマスガ、總ベテノ點カラ申シマシテ己ムヲ得ヌ事情ニ立チ到リマシタ

天神町ノ大火災ノ際ニ、アノ買收費ニ對スル標準ト今回ノトニ開キガアリマスノデ、近接シテ居ル同一地區ノ關係カラ色々ノ要求ナリ御不滿モアツテ居リマスガ、前々回ノ本委員會デ申シマシタ様ニ市ノ精神ハ受益者負擔規程ガ規定サレテ居リマシテ此ノ規程ニ依ツテ事業モ計畫スル様ニナツテ居リマスノデ、旁々左様ナ點カラ地主ノ方デモ何カ適當ノ方法ヲ以テト云フ考ヘモアル様デゴザイマスガ、又十三年度モ終リマスノデ、此ノ價格ヲ決定致シマスモノニ付テハ極力其ノ方針ヲ以テ進ム考ヘデアリマシテ、更ニ計畫年度ニ依ツテ本計畫ヲ遂行スルト云フ心算デゴザイマス、何卒此ノ點ニ付キマシテ御諒承願ヒマス

○五番（田中源一君）市長サンノ御説明デ諒承致シマシタガ大體ニ物價ハ非常ニ騰ル趨勢デアリマスノデ、成

ル可ク此ノ計畫ハ取急ガレマシテ双方デ妥協サレマシテ、遂行サレタ方ガ宜シイデハナイカト思ヒマス、尙本年來年ニハ物價ノ下ル様ナ傾向ハ無イノデゴザイマスガ、此ノ計畫ト地主ノ交渉ガ遷延シナイヤウニ御遂行ナサツタ方ガ有利デアルヤウニ存ジマスガ、其ノ點ノ御見解ハ如何デゴザイマスカ

○九番（石倉俊寛君）全ク同感デアリマス

○會長（並川義隆君）他ニ御質問ハゴザイマセンカ

○三番（秋鹿隆一君）先程色々ノ御質問モアツタヤウデアリマスガ、要スルニ御提案通り年度ヲ繰延ベラレルコトハ己ムヲ得ンノデアリマセウカラ、私ハ原案ニ賛成致シマスガ、大體先程五番君モ賛成ガゴザイマシタガ、更ニ物價騰貴ニ向ツテ事業ヲ進メテ行クコトニナリ、從ツテ其爲ニ事業遂行上困難ノ伴フモノデアルト感ジマスガ、年度割ハ斯ウデアツテモ、充分促進致シタイト云フ希望意見ヲ述べテ原案ニ賛成致シマス

○會長（並川義隆君）別ニ御意見ヤ御質問ハゴザイマセンカ、本案ハ可決シテ御異議ハアリマセヌカ

（「異議ナシ」ト呼ブ者アリ）

御異議ガ無イヤウデゴザイマスカラ原案通り可決確定致シマス

是レヲ以テ會議ヲ閉ジマス

午前十一時五十五分散會

終

